



EJECUCIÓN FÍSICA DEL PRESUPUESTO GENERAL DEL ESTADO

PERIODO: ENERO - JUNIO 2025

SUBSECRETARÍA DE SEGUIMIENTO

AGOSTO 2025



Secretaría Nacional
de Planificación



Contenidos

Abreviaturas	8
Glosario.....	9
1. Introducción	10
2. Marco Legal.....	11
3. Objetivo	14
4. Plan Nacional de Desarrollo 2024-2025.....	14
5. Metodología.....	16
5.1. Seguimiento a Planes Institucionales.....	16
5.2. Seguimiento Proyectos de Inversión.....	18
6. Presupuesto General del Estado	21
6.1. Estructura de componentes presupuestarios	21
6.2. Estructura por ejes del PND 2024-2025.....	23
6.3. Ejecución presupuestaria Gasto Permanente – Planes Institucionales	26
6.4. Ejecución presupuestaria Gasto No Permanente – Plan Anual de Inversiones.....	29
7. Ejecución física del Presupuesto General del Estado por Objetivos del Plan Nacional de Desarrollo	33
7.1. OBJETIVO 1: Mejorar las condiciones de vida de la población de forma integral, promoviendo el acceso equitativo a salud, vivienda y bienestar social.....	40
7.1.1. Gestión Presupuestaria	40
7.1.2. Avance Físico de la Planificación Institucional.....	43
7.1.3. Avance Físico Proyectos de Inversión	48
7.2. OBJETIVO 2: Impulsar las capacidades de la ciudadanía con educación equitativa e inclusiva de calidad y promoviendo espacios de intercambio cultural.....	54
7.2.1. Gestión Presupuestaria	54
7.2.2. Avance Físico de la Planificación Institucional.....	57
7.2.3. Avance Físico Proyectos de Inversión	62
7.3. OBJETIVO 3: Garantizar la seguridad integral, la paz ciudadana y transformar el sistema de justicia respetando los derechos humanos.....	67
7.3.1. Gestión Presupuestaria	67
7.3.2. Avance Físico de la Planificación Institucional.....	70
7.3.3. Avance Físico Proyectos de Inversión	73
7.4. OBJETIVO 4: Estimular el sistema económico y de finanzas públicas para dinamizar la inversión y las relaciones comerciales.	79
7.4.1. Gestión Presupuestaria	79
7.4.2. Avance Físico de la Planificación Institucional.....	83
7.4.3. Avance Físico Proyectos de Inversión	85



3 Informe de Avance Físico del Presupuesto General del Estado

7.5. OBJETIVO 5: Fomentar de manera sustentable la producción mejorando los niveles de productividad.	89
7.5.1. Gestión Presupuestaria	89
7.5.2. Avance Físico de la Planificación Institucional.....	92
7.5.3. Avance Físico Proyectos de Inversión	95
7.6. OBJETIVO 6: Incentivar la generación de empleo digno.....	100
7.6.1. Gestión Presupuestaria	100
7.6.2. Avance Físico de la Planificación Institucional.....	102
7.6.3. Avance Físico Proyectos de Inversión	103
7.7. OBJETIVO 7: Precautelar el uso responsable de los recursos naturales con un entorno ambientalmente sostenible.	108
7.7.1. Gestión Presupuestaria	108
7.7.2. Avance Físico de la Planificación Institucional.....	111
7.7.3. Avance Físico Proyectos de Inversión	113
7.8. OBJETIVO 8: Impulsar la conectividad como fuente de desarrollo y crecimiento económico y sostenible.....	116
7.8.1. Gestión Presupuestaria	116
7.8.2. Avance Físico de la Planificación Institucional.....	119
7.8.3. Avance Físico Proyectos de Inversión	123
7.9. OBJETIVO 9: Propender la construcción de un Estado eficiente, transparente y orientado al bienestar social.....	131
7.9.1. Gestión Presupuestaria	131
7.9.2. Avance Físico de la Planificación Institucional.....	138
7.9.3. Avance Físico Proyectos de Inversión	142
7.10. OBJETIVO 10: Promover la resiliencia de ciudades y comunidades para enfrentar los riesgos de origen natural y antrópico.....	149
7.10.1. Gestión Presupuestaria.....	149
7.10.2. Avance Físico de la Planificación Institucional	151
7.10.3. Avance Físico Proyectos de Inversión.....	152
8. Conclusiones	155
8.1. Gasto Permanente.....	155
8.2. Gasto No Permanente	156
9. Anexos.....	157



Índice de tablas

Tabla 1. SemafORIZACIÓN de metas ascendentes del Plan Institucional (PI).....	17
Tabla 2. SemafORIZACIÓN de metas descendentes del Plan Institucional (PI).....	17
Tabla 3. SemafORIZACIÓN de metas sin tendencia o de mantenimiento del Plan Institucional (PI)	17
Tabla 4. SemafORIZACIÓN metas físicas.....	19
Tabla 5. Componentes presupuestarios del PGE	22
Tabla 6. Dictámenes Emitidos	22
Tabla 7. Gasto permanente por ejes y objetivos del PND	26
Tabla 8. Detalle de presupuesto de entidades con planes institucionales registrados y en proceso de alineación al PND 2024-2025	27
Tabla 9. Detalle de presupuesto de entidades sin planes institucionales registrados.....	28
Tabla 10. Detalle de presupuesto de universidades sin planes institucionales registrados	28
Tabla 11. Detalle de presupuesto sin planes institucionales, de unidades administrativas de otras entidades.....	29
Tabla 12. Alineación de entidades a Objetivos del PND 2024-2025.....	33
Tabla 13. Promedio de cumplimiento de metas del Plan Anual de Inversiones - PND 2024-2025 ..	34
Tabla 14. Ejecución presupuestaria de las entidades alineadas al Objetivo 1	41
Tabla 15. Cumplimiento presupuestario por gabinete sectorial en 2025 – Objetivo 1	43
Tabla 16. Ejecución Indicadores Institucionales – Objetivo 1	43
Tabla 17. Cumplimiento físico por gabinete – Objetivo 1	49
Tabla 18. Avance Físico de Proyectos de Inversión al Segundo Trimestre Ministerio de Salud Pública – Objetivo 1	49
Tabla 19. Avance Físico de Proyectos de Inversión al Segundo Trimestre Ministerio de Inclusión Económica y Social – Objetivo 1.....	52
Tabla 20. Ejecución presupuestaria de las entidades alineadas al Objetivo 2.....	55
Tabla 21. Cumplimiento presupuestario por gabinete sectorial en 2025 – Objetivo 2	57
Tabla 22. Ejecución Indicadores Institucionales – Objetivo 2.....	57
Tabla 23. Cumplimiento físico por gabinete – Objetivo 2	63
Tabla 24. Avance Físico de Proyectos de Inversión al Segundo Trimestre Ministerio de Educación – Objetivo 2	64
Tabla 25. Avance Físico de Proyectos de Inversión al Segundo Trimestre Secretaría Nacional de Educación Superior Ciencia Tecnología e Innovación – Objetivo 2.....	65
Tabla 26. Ejecución presupuestaria de las entidades alineadas al Objetivo 3.....	68
Tabla 27. Cumplimiento presupuestario por gabinete sectorial en 2025 – Objetivo 3	70
Tabla 28. Ejecución Indicadores Institucionales – Objetivo 3.....	70
Tabla 29. Cumplimiento físico por gabinete – Objetivo 3	74
Tabla 30. Avance Físico de Proyectos de Inversión al Segundo Trimestre Ministerio de Defensa Nacional – Objetivo 3.....	75
Tabla 31. Avance Físico de Proyectos de Inversión al Segundo Trimestre Servicio Nacional de Atención Integral a Personas Adultas Privadas de la Libertad y a Adolescentes Infractores – Objetivo 3	76
Tabla 32. Ejecución presupuestaria de las entidades alineadas al Objetivo 4.....	81
Tabla 33. Cumplimiento presupuestario por gabinete sectorial en 2025 – Objetivo 4	82
Tabla 34. Ejecución Indicadores Institucionales – Objetivo 4.....	83
Tabla 35. Cumplimiento físico por gabinete – Objetivo 4	86
Tabla 36. Avance Físico de Proyectos de Inversión al Segundo Trimestre Ministerio de Economía y Finanzas – Objetivo 4	87
Tabla 37. Avance Físico de Proyectos de Inversión al Segundo Trimestre SRI – Objetivo 4	88
Tabla 38. Ejecución presupuestaria de las entidades alineadas al Objetivo 5.....	90
Tabla 39. Cumplimiento presupuestario por gabinete sectorial en 2025 – Objetivo 5	91



Tabla 40. Ejecución Indicadores Institucionales – Objetivo 5	92
Tabla 41. Cumplimiento físico por gabinete – Objetivo 5	96
Tabla 42. Avance Físico de Proyectos de Inversión al Segundo Trimestre Ministerio de Agricultura y Ganadería – Objetivo 5.....	96
Tabla 43. Avance Físico de Proyectos de Inversión al Segundo Trimestre Ministerio de Producción, Comercio Exterior, Inversiones y Pesca – Objetivo 5.....	98
Tabla 44. Ejecución presupuestaria de las entidades alineadas al Objetivo 6.....	101
Tabla 45. Cumplimiento presupuestario por gabinete sectorial en 2025 – Objetivo 6	102
Tabla 46. Ejecución Indicadores Institucionales – Objetivo 6	103
Tabla 47. Cumplimiento físico por gabinete – Objetivo 6	104
Tabla 48. Avance Físico de Proyectos de Inversión al Segundo Trimestre Escuela Politécnica del Litoral – Objetivo 6.....	105
Tabla 49. Avance Físico de Proyectos de Inversión al Segundo Trimestre Ministerio del Trabajo – Objetivo 6	105
Tabla 50. Ejecución presupuestaria de las entidades alineadas al Objetivo 7.....	109
Tabla 51. Cumplimiento presupuestario por gabinete sectorial en 2025 – Objetivo 7	110
Tabla 52. Ejecución Indicadores Institucionales – Objetivo 7	111
Tabla 53. Cumplimiento físico por gabinete – Objetivo 7	113
Tabla 54. Avance Físico de Proyectos de Inversión al Segundo Trimestre Ministerio de Energía y Minas – Objetivo 7	114
Tabla 55. Ejecución presupuestaria de las entidades alineadas al Objetivo 8.....	117
Tabla 56. Cumplimiento presupuestario por gabinete sectorial en 2025 – Objetivo 8	119
Tabla 57. Ejecución Indicadores Institucionales – Objetivo 8.....	119
Tabla 58. Cumplimiento físico por gabinete – Objetivo 8	123
Tabla 59. Avance Físico de Proyectos de Inversión al Segundo Trimestre Ministerio de Transporte y Obras Públicas– Objetivo 8.....	124
Tabla 60. Ejecución presupuestaria de las entidades alineadas al Objetivo 9.....	133
Tabla 61. Cumplimiento presupuestario por gabinete sectorial en 2025 – Objetivo 9	137
Tabla 62. Ejecución Indicadores Institucionales – Objetivo 9	138
Tabla 63. Cumplimiento físico por gabinete – Objetivo 9	143
Tabla 64. Avance Físico de Proyectos de Inversión al Segundo Trimestre Ministerio del Trabajo– Objetivo 9	144
Tabla 65. Avance Físico de Proyectos de Inversión al Segundo Trimestre Secretaría Técnica de la Circunscripción Territorial Especial Amazónica – Objetivo 9.....	144
Tabla 66. Avance Físico de Proyectos de Inversión al Segundo Trimestre Ministerio de Salud Pública – Objetivo 9	146
Tabla 67. Avance Físico de Proyectos de Inversión al Segundo Trimestre Instituto Nacional de Estadística y Censos – Objetivo 9.....	146
Tabla 68. Ejecución presupuestaria de las entidades alineadas al Objetivo 10.....	150
Tabla 69. Cumplimiento presupuestario por gabinete sectorial en 2025 – Objetivo 10.....	151
Tabla 70. Ejecución Indicadores Institucionales – Objetivo 10	152
Tabla 71. Cumplimiento físico por gabinete – Objetivo 10	153
Tabla 72. Avance Físico de Proyectos de Inversión al Segundo Trimestre Secretaría Nacional de Gestión de Riesgos – Objetivo 10.....	153

Índice de ilustraciones

Ilustración 1. Ejes del Plan de Desarrollo “ <i>Para el Nuevo Ecuador</i> ” 2024-2025	14
Ilustración 2. Objetivos del Plan de Desarrollo “ <i>Para el Nuevo Ecuador</i> ” 2024-2025	15
Ilustración 3. Composición del monto devengado del PGE, 2025	21
Ilustración 4. Composición del monto devengado del PGE por ejes del PND 2024-2025	23



Ilustración 5. Ejecución presupuestaria por ejes del PND – Gasto Permanente.....	24
Ilustración 6. Ejecución presupuestaria por ejes del PND – Gasto no Permanente.....	25
Ilustración 7. Ejecución: Devengado más anticipos en relación del codificado con fuente	25
Ilustración 8. Ejecución presupuestaria – Gasto Permanente	26
Ilustración 9. Ejecución presupuestaria por Objetivos PND - Gasto Permanente	27
Ilustración 10. Ejecución Presupuestaria - Gasto No Permanente	29
Ilustración 11. Variación mensual asignación fuente Gasto No Permanente.....	30
Ilustración 12. Ejecución: Devengado más anticipos en relación al codificado con fuente - Gasto No Permanente	30
Ilustración 13. Ejecución presupuestaria por Objetivos PND - Gasto No Permanente	31
Ilustración 14. Variación mensual asignación fuente Gasto No Permanente.....	31
Ilustración 15. Ejecución presupuestaria por Objetivos PND - Gasto No Permanente, I y II trimestre 2025	32
Ilustración 16. Porcentaje de cumplimiento por indicadores analizados	34
Ilustración 17. Resumen de cumplimiento general – Gasto No Permanente.....	37
Ilustración 18. Porcentaje de cumplimiento de proyectos PAI por Objetivos	38
Ilustración 19. Gasto Permanente y No Permanente en 2025 – Objetivo 1	40
Ilustración 20. Ejecución: Devengado más anticipos en relación al codificado con fuente – Objetivo 1	41
Ilustración 21. Gasto Permanente por Gabinete Sectorial en 2025 – Objetivo 1	41
Ilustración 22. Gasto No Permanente por Gabinete Sectorial en 2025 (segundo trimestre) – Objetivo 1	42
Ilustración 23. Gasto No Permanente, avance físico promedio y avance presupuestario-Objetivo 1	48
Ilustración 24. Gasto Permanente y No Permanente en 2025 – Objetivo 2	54
Ilustración 25. Devengado más anticipos en relación al codificado con fuente – Objetivo 2.....	55
Ilustración 26. Gasto Permanente por Gabinete Sectorial en 2025 – Objetivo 2	55
Ilustración 27. Gasto No Permanente por Gabinete Sectorial en 2025 (segundo trimestre) – Objetivo 2	57
Ilustración 28. Gasto No Permanente, avance físico promedio y avance presupuestario- Objetivo 2	63
Ilustración 29. Gasto Permanente y No Permanente en 2025 – Objetivo 3.....	67
Ilustración 30. Ejecución: Devengado más anticipos en relación al codificado con fuente – Objetivo 3	68
Ilustración 31. Gasto Permanente por Gabinete Sectorial en 2025 – Objetivo 3	68
Ilustración 32. Gasto No Permanente por Gabinete Sectorial en 2025 (segundo trimestre) – Objetivo 3	69
Ilustración 33. Gasto No Permanente, avance físico promedio y avance presupuestario- Objetivo 3	74
Ilustración 34. Gasto Permanente y No Permanente en 2025 – Objetivo 4.....	80
Ilustración 35. Ejecución: Devengado más anticipos en relación al codificado con fuente – Objetivo 4	80
Ilustración 36. Gasto Permanente por Gabinete Sectorial en 2025 – Objetivo 4	81
Ilustración 37. Gasto No Permanente por Gabinete Sectorial en 2025 (segundo trimestre) – Objetivo 4	82
Ilustración 38. Gasto No Permanente, avance físico promedio y avance presupuestario- Objetivo 4	86
Ilustración 39. Gasto Permanente y No Permanente en 2025 – Objetivo 5.....	89
Ilustración 40. Ejecución: Devengado más anticipos en relación al codificado con fuente – Objetivo 5	90
Ilustración 41. Gasto Permanente por Gabinete Sectorial en 2025 – Objetivo 5	90



Ilustración 42. Gasto No Permanente por Gabinete Sectorial en 2025 (segundo trimestre) – Objetivo 5	91
Ilustración 43. Gasto No Permanente, avance físico promedio y avance presupuestario-Objetivo 5	95
Ilustración 44. Gasto Permanente y No Permanente en 2025 – Objetivo 6	100
Ilustración 45. Ejecución: Devengado más anticipos en relación al codificado con fuente – Objetivo 6	101
Ilustración 46. Gasto Permanente por Gabinete Sectorial en 2025 – Objetivo 6	101
Ilustración 47. Gasto No Permanente por Gabinete Sectorial en 2025 (segundo trimestre) – Objetivo 6	102
Ilustración 48. Gasto No Permanente, avance físico promedio y avance presupuestario- Objetivo 6	104
Ilustración 49. Gasto Permanente y No Permanente en 2025 – Objetivo 7	108
Ilustración 50. Ejecución: Devengado más anticipos en relación al codificado con fuente – Objetivo 7	109
Ilustración 51. Gasto Permanente por Gabinete Sectorial en 2025 – Objetivo 7	109
Ilustración 52. Gasto No Permanente por Gabinete Sectorial en 2025 (segundo trimestre) – Objetivo 7	110
Ilustración 53. Gasto No Permanente, avance físico promedio y avance presupuestario - Objetivo 7	113
Ilustración 54. Gasto Permanente y No Permanente en 2025 – Objetivo 8	116
Ilustración 55. Ejecución: Devengado más anticipos en relación al codificado con fuente – Objetivo 8	117
Ilustración 56. Gasto Permanente por Gabinete Sectorial en 2025 – Objetivo 8	117
Ilustración 57. Gasto No Permanente por Gabinete Sectorial en 2025 (segundo trimestre) – Objetivo 8	118
Ilustración 58. Gasto No Permanente, avance físico promedio y avance presupuestario - Objetivo 8	123
Ilustración 59. Gasto Permanente y No Permanente en 2025 – Objetivo 9	131
Ilustración 60. Ejecución: Devengado más anticipos en relación al codificado con fuente – Objetivo 9	132
Ilustración 61. Gasto Permanente por Gabinete Sectorial en 2025 – Objetivo 9	132
Ilustración 62. Gasto No Permanente por Gabinete Sectorial en 2025 (segundo trimestre) – Objetivo 9	137
Ilustración 63. Gasto No Permanente, avance físico promedio y avance presupuestario- Objetivo 9	143
Ilustración 64. Gasto Permanente y No Permanente en 2025 – Objetivo 10	149
Ilustración 65. Ejecución: Devengado más anticipos en relación al codificado con fuente – Objetivo 10	150
Ilustración 66. Gasto Permanente por Gabinete Sectorial en 2025 – Objetivo 10	150
Ilustración 67. Gasto No Permanente por Gabinete Sectorial en 2025 (segundo trimestre) – Objetivo 10	151
Ilustración 68. Gasto No Permanente, avance físico promedio y avance presupuestario - Objetivo 10	153



Abreviaturas

CDH	Crédito de Desarrollo Humano
CDI	Centros de Desarrollo Infantil
COPLAFIP	Código Orgánico de Planificación y Finanzas Públicas
COSEDE	Corporación del Seguro de Depósitos, Fondo de Liquidez y Fondo de Seguros Privados
EOD's	Entidades Operativas Desconcentradas
e-SIGEF	Sistema Integrado de Gestión Financiera
ETN	Estrategia Territorial
GAD	Gobierno Autónomo Descentralizado
GNP	Gasto No Permanente (Inversión)
GP	Gasto Permanente (Corriente)
GPR	Gobierno por Resultados
OEI	Objetivos Estratégicos Institucionales
MEF	Ministerio de Economía y Finanzas
PAI	Plan Anual de Inversiones
PGE	Presupuesto General del Estado
PND	Plan Nacional de Desarrollo
PI	Planes Institucionales
PDOT	Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial
RGCOPLAFIP	Reglamento General del Código Orgánico de Planificación y Finanzas Públicas
SIPeIP	Sistema Integral de Planificación e Inversión Pública
SNP	Secretaría Nacional de Planificación
SNDPP	Sistema Nacional Descentralizado de Planificación Participativa



Glosario

Presupuesto General del Estado: Es el instrumento para la determinación y gestión de los ingresos y egresos del Estado, e incluye todos los ingresos y egresos del sector público, con excepción de los pertenecientes a la seguridad social, la banca pública, las empresas públicas y los gobiernos autónomos descentralizados.¹

Gasto Permanente: Son los egresos de recursos públicos que el Estado a través de sus entidades, instituciones y organismos, efectúan con carácter que requieren repetición permanente y permiten la provisión continua de bienes y servicios públicos a la sociedad. Los egresos permanentes no generan directamente acumulación de capital o activos públicos.²

Gasto No Permanente: Son los egresos de recursos públicos que el Estado a través de sus entidades, instituciones y organismos, efectúan con carácter de temporal, por situación específica, excepcional o extraordinaria que no requiere repetición permanente. Los egresos no permanentes pueden generar directamente acumulación de capital bruto o activos públicos o disminución de pasivos. Por lo que los egresos no permanentes incluyen los gastos de mantenimiento realizados exclusivamente para reponer el desgaste de capital.³

Planes Institucionales: Los planes institucionales son instrumentos de planificación y gestión, a través de los cuales, cada entidad del sector público, en el ámbito de sus competencias, identifica y establece las prioridades institucionales de mediano y corto plazo, que orienten la toma de decisiones y el curso de acción encaminado a la generación y provisión de productos (bienes y/o servicios) a la ciudadanía o usuarios externos, debidamente financiados (recursos permanentes y/o no permanentes), a fin de contribuir al cumplimiento de las prioridades establecidas en los Planes Sectoriales y/o Plan Nacional de Desarrollo.⁴

Plan Anual de Inversiones: Es el instrumento mediante el cual se concretan las inversiones del Plan de Desarrollo, de acuerdo con las formas de financiación contenidas en el Plan Financiero. En este Plan se realiza la anualización para una vigencia fiscal de las inversiones del mediano y corto plazo; es la base sobre la cual las distintas entidades de la administración pública, elabora los planes de acción, el mismo facilita el seguimiento y la evaluación de los programas y proyectos de inversión que se van a ejecutar, y permite observar el nivel de cumplimiento de las metas fijadas en el Plan de Desarrollo en relación con la satisfacción de las necesidades básicas de la población, clasificados por sectores, secretarías, unidades ejecutoras. Este plan guarda concordancia con el Plan Plurianual de Inversiones.⁵

¹Glosario de Términos Presupuestarios – MEF (2020). <https://www.finanzas.gob.ec/wp-content/uploads/downloads/2020/01/Glosario-seguimiento.pdf>.

²Glosario de Términos Presupuestarios – MEF (2020). <https://www.finanzas.gob.ec/wp-content/uploads/downloads/2020/01/Glosario-seguimiento.pdf>.

³Glosario de Términos Presupuestarios – MEF (2020), <https://www.finanzas.gob.ec/wp-content/uploads/downloads/2020/01/Glosario-seguimiento.pdf>.

⁴ Norma Técnica del Sistema Nacional de Planificación Participativa- SNP.

⁵ Norma Técnica del Sistema Nacional de Planificación Participativa- SNP.



1. Introducción

Las entidades que reciben recursos del Presupuesto General del Estado (PGE), en el ámbito de sus competencias, identifican y establecen la programación de su planificación a corto y mediano plazo, misma que orienta la toma de decisiones y la provisión de productos (bienes y/o servicios) a la ciudadanía, con recursos permanentes y no permanentes, a fin de contribuir a los objetivos del Plan Nacional de Desarrollo (PND).

Mediante los Oficios Nro. SNP-SNP-2025-0410-OF, SNP-SNP-2025-0411-OF y SNP-SNP-2025-0412-OF de 03 de julio de 2025, la Secretaría Nacional de Planificación (SNP) informó a las entidades que forman parte del PGE sobre la apertura del Módulo de Seguimiento a la Planificación Institucional del Sistema Integrado de Planificación e Inversión Pública (SIPeIP), a fin de registrar la programación anual de metas físicas y presupuestarias de los estudios, programas y proyectos que conforman el Plan Anual de Inversiones (PAI) 2025, así como realizar el seguimiento correspondiente al segundo trimestre de 2025.

Adicionalmente, se solicitó a las entidades registrar los resultados del seguimiento a sus planes institucionales de nivel estratégico en las herramientas tecnológicas administradas por la SNP: Gobierno Por Resultados (GPR) y el SIPeIP, correspondiente al segundo trimestre 2025.

Esta gestión se enmarca en el cumplimiento de la normativa vigente y tiene como objetivo asegurar la calidad, consistencia y oportunidad de la información reportada por las entidades, en el marco del seguimiento a la ejecución de la inversión pública y la planificación institucional.

En este contexto, el seguimiento mide el cumplimiento de las metas programadas, a través del análisis de los resultados alcanzados, permitiendo identificar desviaciones y generar alertas oportunas para la toma de acciones correctivas que coadyuvan al cumplimiento y mejora de la gestión institucional.

Por lo expuesto, el presente informe sustenta su análisis en el reporte de los resultados físicos de la programación de metas del nivel estratégico de los planes institucionales; así como, de los estudios, programas y proyectos de inversión, que conforman el PAI, financiados con gasto permanente y no permanente, correspondiente al periodo fiscal de enero a junio de 2025.



2. Marco Legal

Constitución de la República del Ecuador- 2008

Artículo 280.- *“El Plan Nacional de Desarrollo es el instrumento al que se sujetarán las políticas, programas y proyectos públicos; la programación y ejecución del presupuesto del Estado; y la inversión y la asignación de los recursos públicos; y coordinar las competencias exclusivas entre el Estado central y los gobiernos autónomos descentralizados. Su observancia será de carácter obligatorio para el sector público e indicativo para los demás sectores.”*

Artículo 297.- *“Todo programa financiado con recursos públicos tendrá objetivos, metas y un plazo predeterminado para ser evaluado, en el marco de lo establecido en el Plan Nacional de Desarrollo.”*

Las instituciones y entidades que reciban o transfieran bienes o recursos públicos se someterán a las normas que las regulan y a los principios y procedimientos de transparencia, rendición de cuentas y control público.”

Código Orgánico de Planificación y Finanzas Públicas

Artículo 34.- *“Plan Nacional de Desarrollo. - El Plan Nacional de Desarrollo es la máxima directriz política y administrativa para el diseño y aplicación de la política pública y todos los instrumentos, dentro del ámbito definido en este código. Su observancia es obligatoria para el sector público e indicativa para los demás sectores”.*

Artículo 54.- *“Planes institucionales. - Las instituciones sujetas al ámbito de este código, excluyendo los Gobiernos Autónomos Descentralizados, reportarán al ente rector de la planificación nacional sus instrumentos de planificación institucionales, para verificar que las propuestas de acciones, programas y proyectos correspondan a las competencias institucionales y los objetivos del Plan Nacional de Desarrollo.”*

El ente rector de la planificación nacional definirá el instrumento de reporte. Mediante normativa técnica se establecerán las metodologías, procedimientos, plazos e instrumentos necesarios, que serán de obligatorio cumplimiento.”

Artículo 60.- *“Priorización de programas y proyectos de inversión. - Serán prioritarios los programas y proyectos de inversión que el ente rector de la planificación nacional incluya en el plan anual de inversiones del Presupuesto General del Estado, con sujeción al Plan Nacional de Desarrollo. El Plan Anual de Inversiones garantizará el cumplimiento de las reglas fiscales determinadas en este Código, y deberá respetar los techos institucionales y de gasto definidos por el ente rector de las finanzas públicas, de conformidad con este Código y los requisitos y procedimientos que se establezcan en el reglamento al mismo (...)*

2. Para el caso de universidades y escuelas politécnicas, por parte de su máxima autoridad; (...).”

Artículo 77.- *“Presupuesto General del Estado. - El Presupuesto General del Estado es el instrumento para la determinación y gestión de los ingresos y egresos de todas las entidades que constituyen las diferentes funciones del Estado. No se consideran parte del Presupuesto General del Estado, los ingresos y egresos pertenecientes a la Seguridad Social, la banca pública, las empresas públicas y los gobiernos autónomos descentralizados.”*

Artículo 79.- *“Clasificación de egresos. - Los egresos fiscales se clasifican en egresos permanentes*



y no permanentes, y éstos podrán clasificarse en otras categorías con fines de análisis, organización presupuestaria y estadística.”

Artículo 114. - *“Programas de preservación de capital del Presupuesto General del Estado. - Se entenderá como programa de preservación de capital el que preserve o aumente la riqueza, el patrimonio o la capacidad financiera del Estado.”*

Artículo 119.- *“Contenido y finalidad. - Fase del ciclo presupuestario que comprende la medición de los resultados físicos y financieros obtenidos y los efectos producidos, el análisis de las variaciones observadas, con la determinación de sus causas y la recomendación de medidas correctivas.*

La evaluación física y financiera de la ejecución de los presupuestos de las entidades contempladas en el presente código, será responsabilidad del titular de cada entidad u organismo y se realizará en forma periódica. Los informes de evaluación serán remitidos al ente rector de las finanzas públicas en coordinación con el ente rector de la planificación nacional y difundidos a la ciudadanía.

El ministro a cargo de finanzas públicas efectuará la evaluación financiera global trimestral del Presupuesto General del Estado y la pondrá en conocimiento del Presidente o Presidenta de la República y de la Asamblea Nacional en el plazo de 45 días de terminado cada trimestre.”

Reglamento al Código Orgánico de Planificación y Finanzas Públicas

Artículo 40.- *“Sistema integrado de Planificación e Inversión Pública. - Es la herramienta tecnológica puesta a disposición por parte del ente rector de la planificación, que permitirá realizar transacciones en medios digitales. Las solicitudes realizadas con las claves otorgadas para el uso de dicho sistema y los pronunciamientos emitidos a través del mismo son válidas y tendrán el mismo efecto legal que si se hubieran realizado mediante petición escrita mediante firma ológrafa. Cada una de las entidades deberá mantener debidamente archivados todos los documentos de soporte y serán responsables administrativa, civil y penalmente por las solicitudes realizadas con base en formación imprecisa o falsa suministrada a través del sistema.”*

Artículo 59.- *“Del seguimiento a la planificación institucional. - La planificación institucional incluirá indicadores de resultado, cuyo seguimiento estará a cargo de la Secretaría Nacional de Planificación y Desarrollo, en coordinación con los entes competentes. Las entidades del sector público deberán remitir de manera oportuna la información sobre el cumplimiento de su planificación.”*

Decreto Ejecutivo Nro. 555 de 19 de noviembre de 2011

Artículo 1.- *“Se dispone la implementación del Proyecto Gobierno por Resultados-GPR en todas las instituciones de la administración pública central, institucional y dependiente de la Función Ejecutiva, a cargo de la Secretaría Nacional de la Administración Pública”.*

Decreto Ejecutivo No. 91 de 26 de diciembre de 2023

La Presidencia de la República del Ecuador, mediante Decreto No. 91, Decreta: La organización y funcionamiento del Gabinete Estratégico, gabinetes sectoriales y otros espacios de coordinación y seguimiento.

Resolución Nro. 003-2024-CNP de 16 de febrero de 2024

Artículo 1.- *“Dar por conocido y aprobar el PLAN NACIONAL DE DESARROLLO Y SU ESTRATEGIA TERRITORIAL NACIONAL, denominado Plan Nacional de Desarrollo para el Nuevo Ecuador y su*



Estrategia Territorial Nacional 2024 - 2025”.

Resolución Nro. 006-2024-CNP de 29 de abril de 2024

Artículo 1.- *“Dar por conocido y aprobar el eje de Gestión de Riesgos del PLAN NACIONAL DE DESARROLLO 2024-2025 Y SU ESTRATEGIA TERRITORIAL NACIONAL”.*

Norma Técnica del Sistema Nacional de Planificación Participativa

Artículo 46.- *“Seguimiento a los planes institucionales. - El seguimiento a los planes institucionales de las entidades del sector público previstas en la Constitución de la República, excepto los Gobiernos Autónomos Descentralizados, se hará de acuerdo a las guías metodológicas, directrices y lineamientos que emita el ente rector de la planificación nacional”.*

Artículo 47.- *“Alcance del seguimiento a los planes institucionales. - El seguimiento a la Planificación Institucional se enfocará en la planificación del nivel estratégico de las entidades del sector público previstas en la presente norma”.*

Artículo 102.- *“Seguimiento a la Inversión. - El seguimiento a los estudios, programas y proyectos de inversión que forman parte del Plan Anual de Inversiones se lo realizará de manera trimestral por parte del ente rector de la planificación nacional”.*

Artículo 104.- *“Metodología. - El ente rector de la planificación establecerá los respectivos lineamientos metodológicos para el seguimiento a los estudios, programas y proyectos de inversión pública”.*

Acuerdo Nro. SNP-SNP-2023-0028-A de 28 de marzo de 2023

A través del cual se emite la *“Metodología de seguimiento a planes institucionales”.*

Acuerdo Nro. SNP-SNP-2025-0014-A de 31 de marzo de 2025

A través del cual se emite la *“Metodología de Seguimiento a Estudios, Programas y Proyectos de Inversión”.*

3. Objetivo

Analizar los resultados de la planificación institucional del nivel estratégico; así como, de estudios, programas y proyectos de inversión de las entidades del PGE, y, su relación con la ejecución presupuestaria, alineados a los Objetivos del PND 2024-2025, a fin de levantar alertas oportunas que permitan la toma de decisiones en mejora de la gestión institucional.

4. Plan Nacional de Desarrollo 2024-2025

El Plan Nacional de Desarrollo, es la máxima directriz para el diseño y ejecución de la política pública, a la que se sujetan las acciones, programas y proyectos públicos, el endeudamiento público, la cooperación internacional, la programación, formulación, aprobación y ejecución del PGE, incluidos los presupuestos de la banca pública, empresas públicas a nivel nacional y seguridad social.

Con base en el pronunciamiento de la Procuraduría General del Estado⁶ en el marco de la presentación del PND y su Estrategia Territorial Nacional (ETN), establece: *“en caso de convocatoria anticipada para elecciones de autoridades de elección popular, el Presidente de la República, “deberá presentar un nuevo Plan Nacional de Desarrollo y su Estrategia Territorial Nacional al Consejo Nacional de Planificación, para su aprobación, el mismo que tendrá vigencia por el periodo para el que ha sido electo, esto es, el tiempo restante para completar el periodo presidencial actual (mayo 2025) (...)”.*

Al respecto, el PND “Para el Nuevo Ecuador” 2024-2025, al segundo trimestre 2025, se encuentra estructurado por 5 ejes y 10 objetivos, detallados a continuación:

Ilustración 1. Ejes del Plan de Desarrollo “Para el Nuevo Ecuador” 2024-2025



Fuente: PND 2024 – 2025.
Elaboración: Subsecretaría de Seguimiento – SNP.

⁶ Procuraduría General del Estado Oficio No. 04534, de 16 de noviembre de 2023.

Ilustración 2. Objetivos del Plan de Desarrollo “Para el Nuevo Ecuador” 2024-2025



Fuente: PND 2024 – 2025.

Elaboración: Subsecretaría de Seguimiento – SNP.



5. Metodología

5.1. Seguimiento a Planes Institucionales

El seguimiento a los Planes Institucionales se basa en el Acuerdo Nro. SNP-SNP-2023-0028-A del 28 de marzo de 2023, que establece la “*Metodología de Seguimiento a Planes Institucionales*” como obligatoria para todas las entidades del sector público, en concordancia con el artículo 54 del Código Orgánico de Planificación y Finanzas Públicas.

Esta metodología permite un análisis estandarizado a partir de los reportes generados por las plataformas GPR y SIPeIP, administradas por la Secretaría Nacional de Planificación (SNP). Los resultados sirven de base para la identificación de alertas y elaboración de informes de seguimiento.

El proceso de seguimiento aplica a las entidades que programaron metas hasta el segundo trimestre 2025 y que cumplieron con la normativa y “*Directrices para la Planificación Institucional 2025 SIPeIP y GPR*”⁷, emitidas por la Subsecretaría de Planificación Nacional de la SNP.

La consolidación de información se basó en los resultados de las metas programadas del nivel estratégico, con corte al 30 de junio de 2025, considerando la alineación de los Objetivos Estratégicos Institucionales (OEI) con los elementos del PND 2024-2025, específicamente eje, objetivo, política y meta (Ver Anexo 1).

Análisis de Metas e Indicadores

El análisis de los indicadores del segundo trimestre de 2025, se lleva a cabo considerando el resultado final del periodo de seguimiento (junio), tanto para los indicadores discretos como para los continuos (con cualquier periodicidad), con el fin de presentar su estado de avance y nivel de cumplimiento.

Para el proceso de análisis de los resultados de las metas programadas por las entidades, se toma en cuenta lo siguiente:

Comportamiento de las metas:

- Ascendente: a medida que aumenta la variable independiente (tiempo) también aumenta la variable dependiente (valor del indicador).
- Descendente: a medida que aumenta la variable independiente (tiempo) disminuye la variable dependiente (valor del indicador).
- Sin tendencia: aquel que no se puede identificar si es ascendente o descendente, dado que cambia o se mantiene, en cada uno de los periodos analizados.

Comportamiento de los indicadores:

- Discreto: muestra el valor del indicador de cada periodo independientemente del periodo anterior o posterior.
- Continuo: muestra el valor del indicador de manera acumulada desde el inicio de su medición de acuerdo a su periodicidad. Cabe indicar que, al existir indicadores continuos fraccionales, configurados en la herramienta de GPR, se ha establecido el siguiente esquema para su análisis:
 - Indicadores con numeradores ascendentes o descendentes y denominador constante, se

⁷ Directrices para Planificación Institucional 2024 SIPeIP y GPR, Oficio Nro. SNP-SNP-SGP-2024-0108-O de 5 de marzo de 2024.

considera el último dato reportado.

- Indicadores con numeradores distintos o sin una tendencia clara y denominador constante, se considera la suma de numeradores y el denominador constante.
- Indicadores con numeradores y denominadores distintos, se considera la suma de todos los numeradores dividido para la suma de todos los denominadores.

Para calcular el porcentaje de cumplimiento de una meta, se utiliza la siguiente fórmula:

$$\text{Porcentaje de cumplimiento de meta} = \left(\frac{\text{Resultado}}{\text{Meta}} \right) * 100$$

Este cálculo permite analizar el porcentaje de avance en el cumplimiento de las metas y observar su desempeño, de acuerdo con los umbrales de valoración definidos según el comportamiento de la meta. Los parámetros para las categorías de cumplimiento y los umbrales de semaforización, corresponden a los establecidos en la metodología de seguimiento al PND.

Meta ascendente

Tabla 1. Semaforización de metas ascendentes del Plan Institucional (PI)

Categoría de cumplimiento	Umbral	Descripción
Avance esperado	● $\geq 95\%$	Si el resultado del nivel de cumplimiento es mayor o igual que 95%.
Avance cercano al esperado	● $\geq 85\%$ y $< 95\%$	Si el resultado del nivel de cumplimiento es mayor o igual que 85% y menor que 95%.
Avance menor al esperado	● $\geq 0\%$ y $< 85\%$	Si el resultado del nivel de cumplimiento es menor que 85%.
Sin Información	● -	En caso que la entidad responsable del indicador no haya reportado el resultado, o no sea factible calcular el nivel de cumplimiento de las metas programadas.

Fuente y Elaboración: Metodología de Seguimiento a Planes Institucionales, SNP.

Meta descendente

Tabla 2. Semaforización de metas descendentes del Plan Institucional (PI)

Categoría de cumplimiento	Umbral	Descripción
Avance esperado	● $\leq 105\%$	Si el resultado del nivel de cumplimiento es menor o igual que 105%
Avance cercano al esperado	● $> 105\%$ y $\leq 115\%$	Si el resultado del nivel de cumplimiento está entre 105% y menor o igual 115%.
Avance menor al esperado	● $> 115\%$	Si el resultado del nivel de cumplimiento es mayor que 115%.
Sin Información	● -	En caso que la entidad responsable del indicador no haya reportado el resultado, o no sea factible calcular el nivel de cumplimiento de las metas programadas.

Fuente y Elaboración: Metodología de Seguimiento a Planes Institucionales, SNP.

Meta sin tendencia o de mantenimiento

Tabla 3. Semaforización de metas sin tendencia o de mantenimiento del Plan Institucional (PI)

Categoría de cumplimiento	Umbral	Descripción
Avance esperado	● $\geq 95\%$ y $\leq 105\%$	Si su resultado de cumplimiento está entre 95% y 105% con respecto a la meta programada.

Categoría de cumplimiento	Umbral	Descripción
Avance cercano al esperado	● $\geq 85\% \text{ y } < 95\%$ $>105\% \text{ y } \leq 115\%$	Si su resultado de cumplimiento está entre el rango del 85% y el 95% o el rango de 105% y 115%.
Avance menor al esperado	● $< 85\% \text{ y } \geq 0\%$ $>115\%$	Si el resultado de cumplimiento es menor al 85% o mayor al 115%.
Sin Información	● -	En caso de que la entidad responsable del indicador no haya reportado el resultado, u otras situaciones que no permiten calcular el nivel de cumplimiento de las metas programadas.

Fuente y Elaboración: Metodología de Seguimiento a Planes Institucionales, SNP.

Para la descripción de los principales logros, en el presente informe se incluyen aquellos reportados por las entidades en la “Ficha de Seguimiento del Plan Institucional,” correspondientes únicamente a los resultados alcanzados de las metas que tienen programación mensual, trimestral y semestral, dentro del periodo de seguimiento.

Vinculación Planificación - Presupuesto

La planificación institucional se vincula con el presupuesto conforme a la alineación realizada por las entidades que forman parte del PGE, de los programas presupuestarios a sus OEI y a los Objetivos del PND 2024-2025, proceso efectuado durante la fase de planificación.

En los casos en que una entidad no haya cumplido con la alineación, no es posible vincular su gestión presupuestaria por objetivo del PND. En este sentido, estas entidades se agrupan en la categoría “En proceso de alineación”, y se encuentran clasificadas en la sección 8.3 del informe, según el estado de validación de los PI.

La consolidación de la gestión presupuestaria del Gasto Permanente, se efectúa mediante los Grupos de Gasto 5⁸, 8⁹ y 9¹⁰ (sin proyecto), sin incluir proyectos de inversión, ni entidades del Tesoro Nacional¹¹, información que se obtiene a partir de los datos del Sistema Integrado de Gestión Financiera (e-SIGEF) proporcionado por el MEF, con corte al 30 de junio de 2025.

Limitaciones de la Metodología

Algunas entidades registran resultados no acordes con la configuración del indicador, ya sea por el comportamiento de la meta o del indicador (ascendente, descendente, sin tendencia; discreto o continuo), lo cual genera inconsistencias en la aplicación de la fórmula de cumplimiento y en los umbrales de valoración definidos para el análisis de resultados, por lo que son incluidos en la categoría de “Sin Información”.

5.2. Seguimiento Proyectos de Inversión

Las entidades ejecutoras son responsables del seguimiento a la programación física y presupuestaria de los estudios, programas y proyectos que integran el PAI, con base en el Acuerdo Nro. SNP-SNP-2025-0014-A de 31 de marzo de 2025, a través del cual se emite la “Metodología de Seguimiento a Estudios, Programas y Proyectos de Inversión”. Las entidades ejecutoras reportan trimestralmente el avance de las metas físicas por componente del marco lógico a través del módulo de seguimiento del SIPeIP.

⁸ Grupos de Gasto 51, 53, 56, 57 y 58 excluyendo Tesoro Nacional.

⁹ Grupo 84 y 87, gasto de capital no atado a proyectos.

¹⁰ Grupos de Gasto 96, 97 y 99 atado a gasto corriente excluyendo Tesoro Nacional.

¹¹ Tesoro Nacional (entidades virtuales manejadas por el MEF).

Dado el vínculo entre planificación y presupuesto, es necesario identificar el presupuesto devengado de cada proyecto de inversión en relación con lo programado¹². Para tal efecto, se dispone de la base de datos del e-SIGEF, que consolida todas las fuentes de financiamiento y la deuda vinculada al Programa de Preservación de Capital 2025, responsabilidad del MEF, excluyendo el capital no asociado a proyectos.

Con la información reportada en el Módulo de Seguimiento del SIPeIP, se consolida una base de datos que incorpora tanto los campos generados por las entidades, como la ejecución presupuestaria del e-SIGEF. Esta base registra la alineación de los proyectos con los objetivos del PND 2024–2025, lo que permite comparar el avance de metas físicas y el porcentaje de ejecución presupuestaria respecto a dichos objetivos.

El Anexo 2 detalla la alineación de los estudios, programas y proyectos de inversión con las metas del PND. Cabe señalar que, la veracidad y calidad de la información presentada en este informe es responsabilidad exclusiva de las entidades ejecutoras, conforme lo señalado en la base normativa.

Consideraciones de cumplimiento o semaforización

Para analizar el avance físico de los estudios, programas y/o proyectos de inversión, se establecen categorías de cumplimiento o semaforización de metas, basadas en umbrales de valoración, lo que permite a las instituciones contrastar el desempeño observado con relación a lo programado y tomar acciones preventivas o correctivas para mejorar la ejecución de los mismos.

Categorías de cumplimiento de metas físicas

La semaforización del avance físico de los estudios, programas y proyectos de inversión se determina a partir de la relación entre los resultados físicos alcanzados y la programación prevista para el período analizado. Las categorías de cumplimiento de metas físicas son las siguientes:

Tabla 4. Semaforización metas físicas

Categoría	Umbrales	Categorías de cumplimiento
●	≥ 100%	Avance esperado de metas ejecutadas respecto a las metas programadas
●	≥90% y < 100%	Avance cercano al esperado de metas ejecutadas respecto a las metas programadas
●	< 90%	Avance menor al esperado de metas ejecutadas respecto a las metas programadas
●	Sin programación	Proyecto sin programación de metas

Fuente y Elaboración: Acuerdo Nro. SNP-SNP-2022-0008-A, de 16 de febrero de 2022 – SNP.

En cuanto a la ejecución presupuestaria de los estudios, programas, y proyectos de inversión, se presenta únicamente los porcentajes de ejecución, sin aplicar semaforización. Además, se analiza los montos ejecutados, incluidos anticipos, y, el codificado con fuente de financiamiento, para reflejar la gestión de las entidades ejecutoras.

Consideraciones generales para el análisis

La información sobre la alineación de los estudios, programas y proyectos de inversión con los objetivos del PND 2024–2025 fue remitida por la Subsecretaría de Planificación Nacional a la

¹² El presupuesto programado corresponde a la información remitida de manera oficial por las entidades que ejecutan estudios, programas y proyectos de inversión que conforman el PAI que se financian con recursos de Gasto No Permanente.



Subsecretaría de Seguimiento, mediante los memorandos Nro. SNP-SGP-SPN-2024-0241-M de 17 de diciembre de 2024 y Nro. SNP-SGP-SPN-2025-0002-M de 08 de enero de 2025, así como a través de correos electrónicos institucionales enviados por la Dirección de Planificación de la Inversión (DPI) los días 8 de enero, 22 de abril hacia la Dirección de Seguimiento de la Inversión (DSI). Adicionalmente, la Dirección de Planificación y Política Pública (DPPP) envió, mediante correos institucionales los días 17 y 18 de julio de 2025, información de alineación a la Dirección de Seguimiento de la Inversión (DSI).

Esta información proviene de lo registrado por las entidades en el módulo de inversión del SIPeIP al tramitar la actualización de prioridad o aprobación, conforme a la causal 1 del artículo 106 del RGCOPLAFIP, y a las *“Directrices para la alineación de estudios, programas y proyectos de inversión pública al PND 2024–2025”*, emitidas por la SNP mediante Circular Nro. SNP-SNP-SGP-2024-0001C, de 05 de marzo de 2024.

Adicionalmente, este informe incluye un análisis detallado de los estudios, programas y proyecto de inversión por entidad, según su alineación a cada objetivo del PND, aplicando la regla 80/20, que resalta los proyectos que concentran más del 80 % del presupuesto codificado.

6. Presupuesto General del Estado

6.1. Estructura de componentes presupuestarios

El Presupuesto General del Estado para el segundo trimestre del 2025, corresponde a USD 36.063,02 millones¹³ por concepto de asignado inicial; en este sentido, al 30 de junio de 2025, se registra un monto codificado de USD 36.063,02 millones y un devengado de USD 17.196,20 millones.

Para el presente informe, se consideran únicamente los siguientes componentes presupuestarios que no contemplan el Tesoro Nacional, puesto que, los planes institucionales se vinculan con el PGE a través de la alineación que los programas presupuestarios tienen a los objetivos institucionales, financiados con recursos de gasto corriente, gasto de capital y aplicación del financiamiento, no atado a proyectos; mientras que el PAI se corresponde con el gasto de inversión.

Ilustración 3. Composición del monto devengado del PGE, 2025
(millones de dólares)



Nota: El devengado del Tesoro Nacional, excluye el monto del “Programa de preservación de capital periodo 2025”, en sus grupos de gasto 96 y 99 (Amortización de Deuda Pública y Otros pasivos), en razón de que este valor se ve reflejado en el devengado del Gasto no permanente, como se observa en la tabla 6 del presente informe.

Fuente: MEF– Ejecución Presupuestaria consolidada. corte 30 de junio de 2025.

Elaboración: Dirección de Seguimiento a la Planificación y Política Pública – SNP.

En este sentido, el monto codificado es de USD 23.371,89 millones y devengado de USD 10.425,91 millones, correspondiente a 161 entidades que forman parte del PGE, de las cuales, 82 entidades están incluidas en el PAI al segundo trimestre 2025.

¹³ PGE considerando el Sectorial del Tesoro Nacional. Cabe señalar que, el ejercicio fiscal 2025, al ser un año de posesión presidencial, inicia con el presupuesto prorrogado del ejercicio fiscal 2024, conforme lo establecido en la normativa legal: Constitución de la República del Ecuador en el artículo 295 y Código Orgánico de Planificación y Finanzas Públicas (COPLAFIP) en el artículo 107 sobre presupuestos prorrogados

Tabla 5. Componentes presupuestarios del PGE

Componente	Detalle	Codificado (MM USD)	Devengado (MM USD)	
Gasto Permanente	Gasto corriente ¹⁴	13.972,74	6.813,73	
	Gasto de capital ¹⁵	1.036,71	17,02	
	Aplicación del financiamiento ¹⁶	142,94	128,38	
Subtotal Gasto Permanente		15.152,39	6.959,13	
Gasto No Permanente	Gasto de inversión – PAI	2.165,99	503,92	
	Programa de preservación de capital	Grupos 73 ¹⁷	17,04	3,70
		Grupos 96 y 99 ¹⁸	6.036,47	2.959,16
Subtotal Gasto No Permanente		8.219,50	3.466,79	
Total		23.371,89	10.425,91	

Fuente: e-SIGEF – MEF – Ejecución Presupuestaria consolidada. corte 30 de junio de 2025.

Elaboración: Dirección de Seguimiento a la Planificación y Política Pública – SNP.

En referencia a la tabla de dictámenes, durante el periodo analizado, se identificaron 216 proyectos con dictamen técnico favorable, que representan un monto total de USD 23.950,61 millones.

El Gabinete Institucional concentra el mayor monto dictaminado, con USD 8.839,25 millones, aunque no se emitieron nuevos dictámenes en el trimestre. El Gabinete de Infraestructura, Energía y Medio Ambiente lidera en número de dictámenes con 67 proyectos aprobados, seguido por el Gabinete Social con 65 proyectos y un monto dictaminado de USD 7.552,68 millones. Por su parte, el Gabinete de Desarrollo Productivo y el de Seguridad registran montos relevantes dictaminados (USD 1.317,42 millones y USD 3.007,58 millones, respectivamente), sin nuevos dictámenes. Finalmente, la categoría “Sin Gabinete” agrupa la mayoría de proyectos sin dictamen técnico (205 proyectos), por un monto asociado de USD 121,61 millones.

Tabla 6. Dictámenes Emitidos

Gabinete	Nro. de Proyectos con Dictamen	Nro. de Proyectos sin Dictamen	Monto Dictamen (MM USD)
Institucional	11	0	8.839,25
Social	65	1	7.552,68
Seguridad	27	0	3.007,58
Infraestructura, Energía y Medio Ambiente	67	5	2.665,15
Desarrollo Productivo	34	0	1.317,42
Sin Gabinete	10	205	121,61
Total	214	211	23.503,68

Nota: 214 proyectos cuentan con dictamen favorable de la SNP.

Fuente: SIPeIP, SNP, e-SIGEF, MEF- Ejecución Presupuestaria, corte al 30 de junio de 2025.

Elaboración: Dirección de Seguimiento a la Inversión – SNP.

¹⁴ Grupos de Gasto 51, 53, 56, 57 y 58 excluyendo Tesoro Nacional.

¹⁵ Grupo 84 y 87 gasto de capital no atado a proyectos.

¹⁶ Grupos de Gasto 96, 97 y 99 atado a gasto corriente excluyendo Tesoro Nacional.

¹⁷ Grupos 73 (Bienes y servicios), correspondiente al “Programa de preservación de capital - Periodo 2025”, cuya entidad responsable es el MEF, conforme Oficio de dictamen de prioridad Nro. SNP-SNP-SGP-2025-0005-O de 14 de enero 2025.


¹⁸ Grupos 96 y 99 (Amortización de Deuda Pública; Otros Pasivos, Costos de obligaciones firmes del Estado; Costos y gastos asociados a procedimientos arbitrales o judiciales), del “Programa de preservación de capital - Periodo 2025”, cuya entidad responsable es el MEF.

6.2. Estructura por ejes del PND 2024-2025

La ejecución del **Gasto Permanente** y **Gasto No Permanente** correspondiente al Presupuesto General del Estado, permite visualizar el gasto efectuado por las entidades en el marco de los Ejes y Objetivos del PND¹⁹.

En la siguiente ilustración, se detalla el presupuesto de **Gasto Permanente** de los PI, articulados por Eje del PND 2024-2025. En este sentido, se observa que el Eje Social tuvo un monto codificado de USD 12.152,68 millones, seguido por el Eje Institucional con un valor de USD 2.077,67, millones; y, el Eje de Infraestructura, Energía y Medio Ambiente con USD 278,31 millones.

Ilustración 4. Composición del monto devengado del PGE por ejes del PND 2024-2025

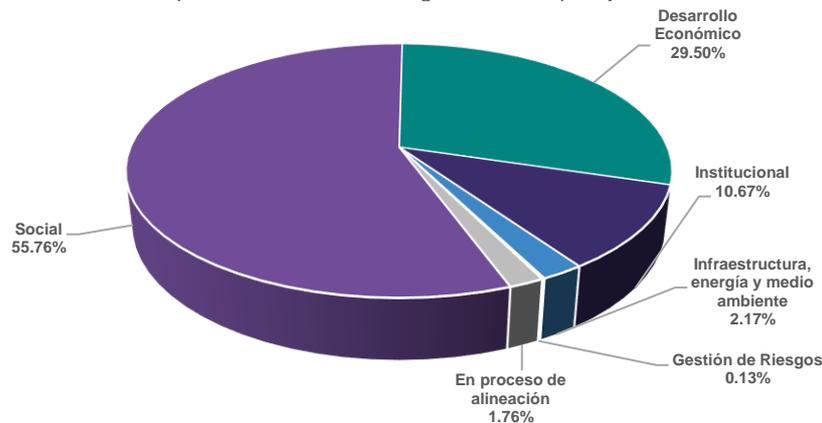


Fuente: MEF– Ejecución Presupuestaria consolidada, corte 30 de junio de 2025.

Elaboración: Dirección de Seguimiento a la Planificación y Política Pública – SNP.

En cuanto a la ejecución presupuestaria, se identifica que, el Eje de Infraestructura, Energía y Medioambiente con el 48,96% presenta el mayor porcentaje en relación a su monto codificado, seguido por el Eje Social con 46,33%; mientras que, el menor en ejecución corresponde al Eje Desarrollo Económico con el 32,77%.

¹⁹ El Eje de Desarrollo Económico contempla el “Programa de preservación de capital periodo 2025”. La categoría “En proceso de alineación”, corresponde al presupuesto de las entidades que no han finalizado el registro de la planificación institucional y por ende no cuentan con la alineación a los Objetivos del PND 2024-2025, este grupo de entidades se detallan en la sección 8.3. En esta misma categoría se incluyen las unidades administrativas financieras de otras entidades que por su estructura orgánica no están sujetas a presentar sus planes institucionales siendo estas: (Dirección Nacional de Salud de la Policía Nacional, Dirección Nacional de la Policía Judicial y Hospital de Especialidades Fuerzas Armadas No. 1). Además, se incluyen las entidades que están en fase de supresión, fusión o son de nueva creación, que no tienen alineación a los objetivos del PND 2024-2025.

Ilustración 5. Ejecución presupuestaria por ejes del PND – Gasto Permanente (millones de dólares)²⁰

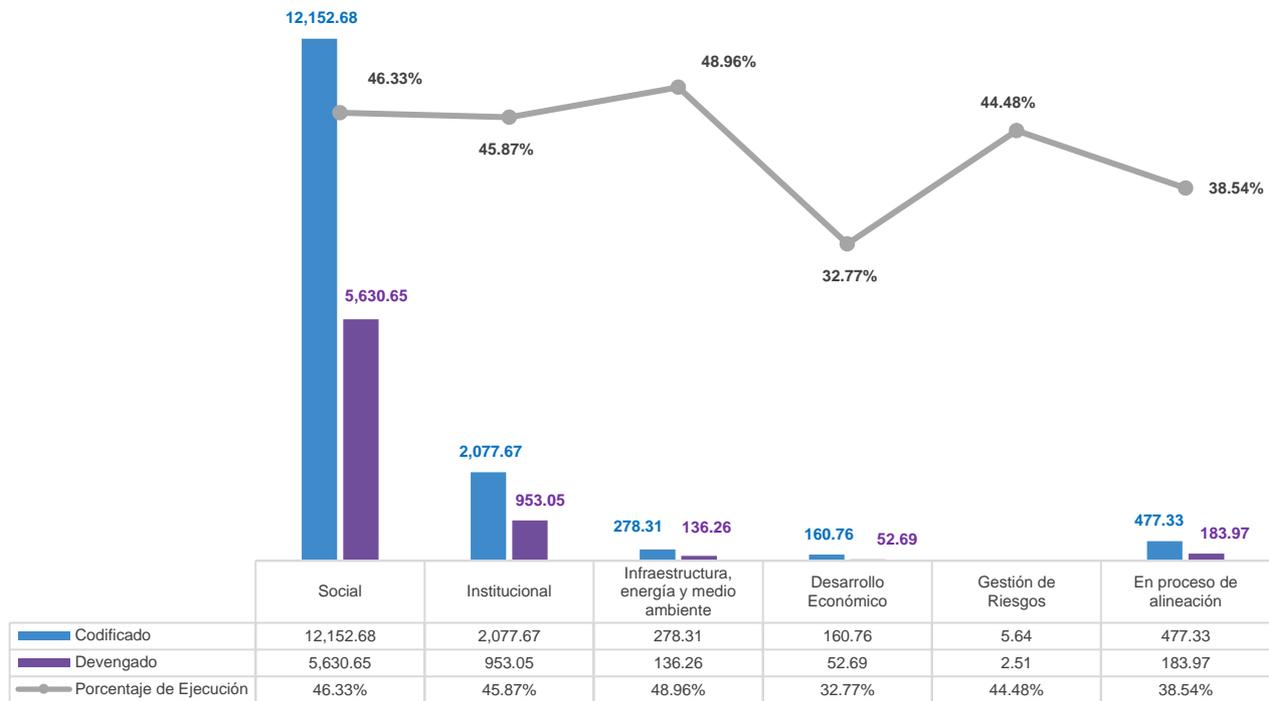

Fuente: SIPeIP - Seguimiento a planes institucionales, SNP, corte al 30 de junio de 2025. e-SIGEF, MEF– Ejecución Presupuestaria, corte al 30 de junio de 2025.


Elaboración: Dirección de Seguimiento a la Planificación y Política Pública – SNP.

En lo que se refiere al Gasto **No Permanente**, la ilustración 6 muestra la alineación de los estudios, programas y proyectos de inversión por ejes del PND 2024–2025. El mayor monto codificado corresponde al Eje de Desarrollo Económico USD 6.215,27 millones, seguido del Eje Social USD 939,30 millones, Infraestructura, Energía y Medio Ambiente USD 637,67 millones, Institucional USD 409,26 millones, y Gestión de Riesgos USD 18,01 millones.

Es preciso indicar que, el monto del Eje de Desarrollo Económico incluye el “Programa de preservación de capital periodo 2025”, ejecutado por el MEF, con un presupuesto codificado de USD 6.053,51 millones y devengado de USD 2.962,86 millones al 30 de junio de 2025.

²⁰ La categoría “En proceso de alineación”, corresponde al presupuesto de las entidades que no han finalizado el registro de la planificación institucional y por ende no cuentan con la alineación a los Objetivos del PND 2024-2025, este grupo de entidades se detallan en la sección 8.3. En esta misma categoría se incluyen las unidades administrativas financieras de otras entidades que por su estructura orgánica no están sujetas a presentar sus planes institucionales siendo estas: (Dirección Nacional de Salud de la Policía Nacional, Dirección Nacional de la Policía Judicial y Hospital de Especialidades Fuerzas Armadas No. 1). Además, se incluyen las entidades que están en fase de supresión, fusión o son de nueva creación, que no tienen alineación a los objetivos del PND 2024-2025.

Ilustración 6. Ejecución presupuestaria por ejes del PND – Gasto no Permanente (millones de dólares)

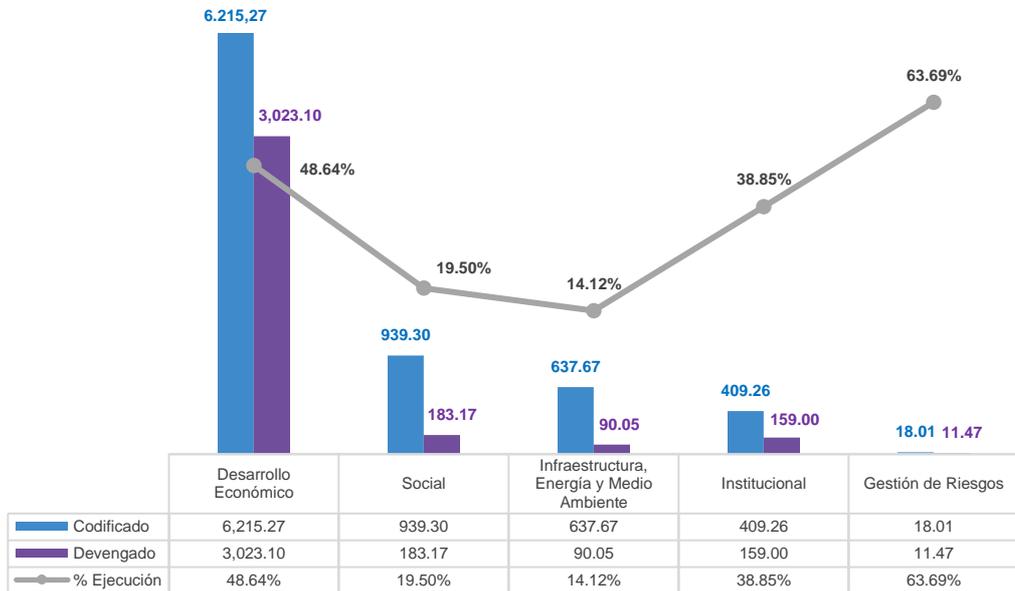


Nota: Se incluye grupo de gasto, 73, 96 (Amortización de la Deuda Pública) y 99, del “Programa de preservación de capital periodo 2025”, cuya entidad responsable es el MEF. El presupuesto codificado del programa, al 30 de junio de 2025, es de USD 6.053,51 millones y devengado de USD 2.962,86 millones.

Fuente: e-SIGEF, MEF- Ejecución Presupuestaria, corte al 30 de junio de 2025.

Elaboración: Dirección de Seguimiento a la Inversión – SNP.

Adicionalmente, con el fin de identificar la gestión realizada en la ejecución del **Gasto No Permanente**, se presenta a continuación la ejecución por ejes del PND, considerando los anticipos y el monto codificado con fuente de financiamiento entregados para el periodo.

Ilustración 7. Ejecución: Devengado más anticipos en relación del codificado con fuente (millones de dólares)

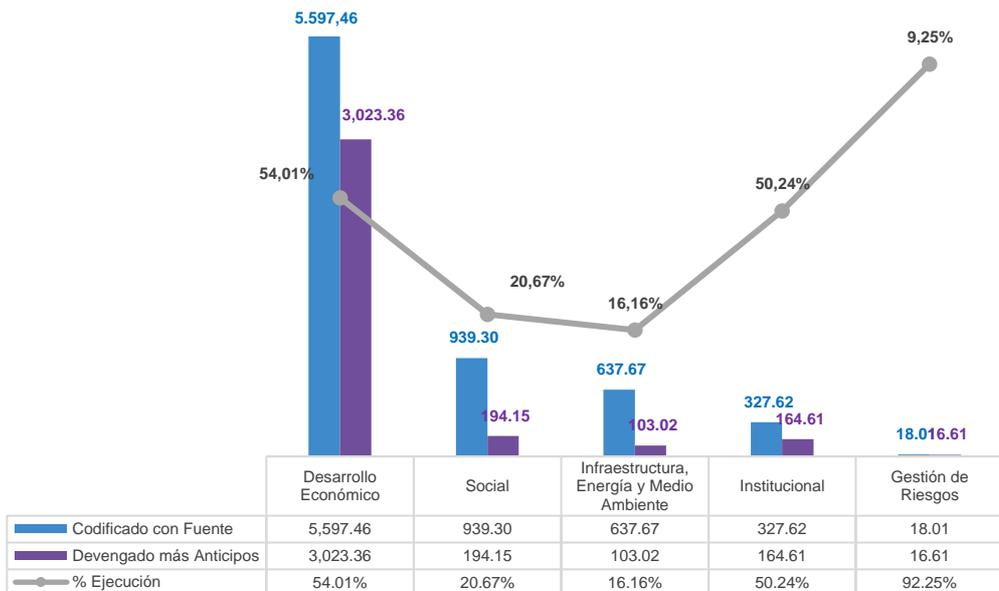

Nota: Se incluye grupo de gasto, 73, 96 (Amortización de la Deuda Pública) y 99, del “Programa de preservación de capital periodo 2025”, cuya entidad responsable es el MEF. El presupuesto codificado del programa, al 30 de junio de 2025, es de USD 6.053,51 millones y devengado de USD 2.962,86 millones.

Fuente: e-SIGEF, MEF- Ejecución Presupuestaria, corte al 30 de junio de 2025.

Elaboración: Dirección de Seguimiento a la Inversión – SNP.

De acuerdo a la ilustración, el mayor monto codificado corresponde al Eje de Desarrollo Económico USD 5.597,46 millones, seguido del Eje Social USD 939,30 millones, Infraestructura, Energía y Medio Ambiente USD 637,67 millones, Institucional USD 327,62 millones, y Gestión de Riesgos USD 18,01 millones. El Eje de Gestión de Riesgos registra la mayor ejecución 92,25%, mientras que el Eje de Infraestructura, Energía y Medio Ambiente presenta el nivel más bajo 16,16%.

6.3. Ejecución presupuestaria Gasto Permanente – Planes Institucionales

En el proceso de seguimiento a planes institucionales, se contempla el presupuesto de gasto permanente de 161 entidades que forman parte del PGE. En este sentido, al 30 de junio de 2025, se cuenta con un codificado de USD 15.152,39 millones y un devengado de USD 6.959,13 millones, lo que representa una ejecución presupuestaria del 45,93%.



Fuente: Base de datos e-SIGEF– MEF - Ejecución Presupuestaria, corte 30 de junio de 2025.
Elaboración: Dirección de Seguimiento a la Planificación y Política Pública – SNP.

En este sentido, para el análisis presupuestario articulado al PND, se contempla la alineación de 370 programas presupuestarios de 135 entidades que cumplieron con el registro de su planificación institucional y alineación a los Objetivos del PND 2024-2025, con un presupuesto codificado de USD 14.675,06 millones y un devengado de USD 6.775,16 millones, con corte al segundo trimestre 2025, conforme se detalla en la siguiente tabla:

Tabla 7. Gasto permanente por ejes y objetivos del PND


Eje	Objetivo PND	Nro. Entidades	Nro. Programas Presupuestarios	Codificado (MM USD)	Devengado (MM USD)	Ejecución (%)
1. Social	1	16	28	4.447,40	2.215,65	49,82%
	2	38	95	4.449,99	1.714,55	38,53%
	3	16	24	3.255,28	1.700,45	52,24%
2. Desarrollo Económico	4	9	13	48,07	19,56	40,68%
	5	8	12	65,28	12,66	19,40%
	6	4	5	47,41	20,47	43,17%
3. Infraestructura, energía y medio ambiente	7	9	18	22,61	8,83	39,04%
	8	8	11	255,70	127,43	49,84%
4. Institucional	9	135	161	2.077,67	953,05	45,87%
5. Gestión de Riesgos	10	1	3	5,64	2,51	44,48%
Total			370	14.675,06	6.775,16	46,17%

Nota: Una entidad puede tener más de un programa presupuestario que se alinean a diferentes objetivos del PND.
Fuente: SNP, SIPeIP, corte 30 de junio de 2025. e-SIGEF – MEF - Ejecución Presupuestaria, corte 30 de junio de 2025.
Elaboración: Dirección de Seguimiento a la Planificación y Política Pública – SNP.

En la ilustración 9, se muestra el presupuesto codificado (USD 14.675,06 millones) y devengado (USD 6.775,16 millones) desagregado por objetivos del PND 2024-2025, en el cual se observa que el Objetivo 2 tiene el mayor monto codificado por un valor de USD 4.449,99 millones, seguido por el Objetivo 1 con un valor de USD 4.447,40 millones, el Objetivo 3 con USD 3.255,28 millones y el Objetivo 9 con USD 2.077,67 millones, entre los principales.

En cuanto a la ejecución presupuestaria, se observa que, el Objetivo 3 presenta el mayor porcentaje con el 52,24%, seguido del Objetivo 8 con el 49,84%, y Objetivo 1 con el 49,82%; mientras que el Objetivo 5 es el que presenta menor ejecución con el 19,40%.

Ilustración 9. Ejecución presupuestaria por Objetivos PND - Gasto Permanente (millones de dólares y porcentaje)

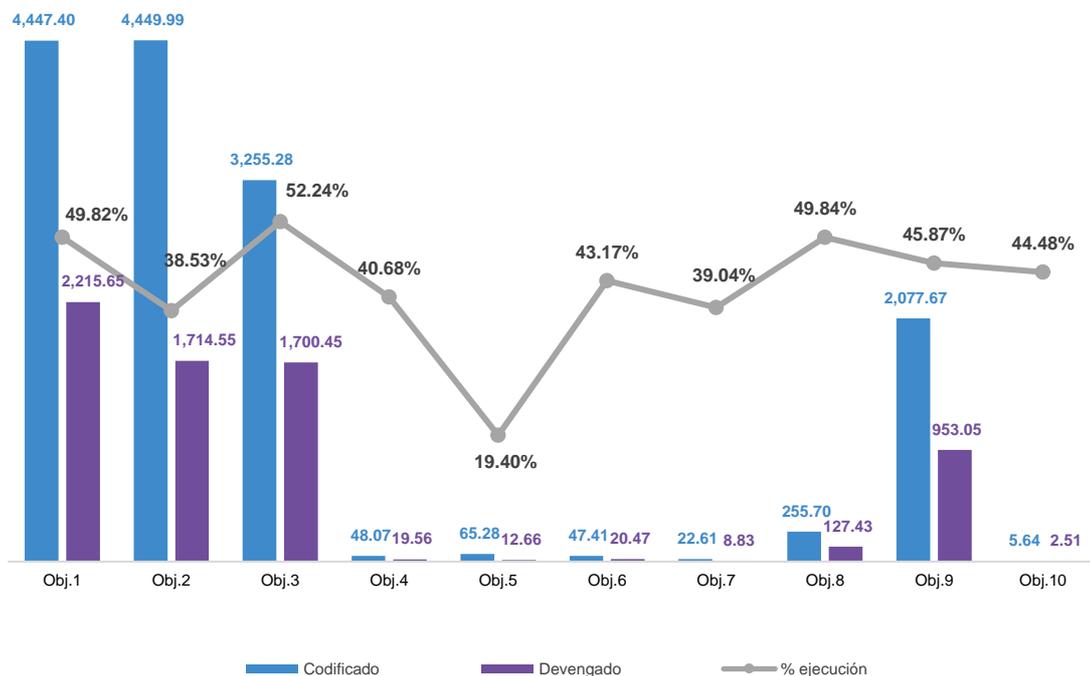

Fuente: SNP, SIPeIP, corte 30 de junio de 2025. e-SIGEF –MEF- Ejecución Presupuestaria, corte 30 de junio de 2025.
Elaboración: Dirección de Seguimiento a la Planificación y Política Pública – SNP.

Se debe manifestar que, de las 161 entidades, 26 entidades están en proceso de alineación a los objetivos del PND 2024-2025, las cuales presentan un presupuesto codificado de USD 477,33 millones y un devengado de USD 183,96 millones. Este grupo de entidades, se detallan a continuación considerando el estado de validación de sus planes institucionales:

Tabla 8. Detalle de presupuesto de entidades con planes institucionales registrados y en proceso de alineación al PND 2024-2025

Entidad	Codificado (MM USD)	Devengado (MM USD)	Ejecución (%)
Asamblea Nacional	53,19	24,36	45,80%
Casa de la Cultura Ecuatoriana Benjamín Carrión	11,51	5,28	45,91%
Conferencia Plurinacional e Intercultural de Soberanía Alimentaria	0,75	0,35	46,87%
Instituto Nacional de Patrimonio Cultural	5,02	2,42	48,21%
Instituto Publico de Investigación de Acuicultura y Pesca	1,52	0,70	46,14%
Ministerio del Interior	40,32	9,71	24,09%

Entidad	Codificado (MM USD)	Devengado (MM USD)	Ejecución (%)
Secretaría de Gestión y Desarrollo de Pueblos y Nacionalidades	2,53	1,13	44,83%
Secretaría de Inversiones Público-Privadas	2,62	0,61	23,39%
Universidad Estatal del Sur de Manabí	24,27	9,86	40,60%
Universidad Intercultural de las Nacionalidades y Pueblos Indígenas Amawtay Wasi	1,06	0,40	37,42%
Total	142,80	54,83	38,40%

Fuente: Base de datos e-SIGEF, Ejecución Presupuestaria Consolidada – MEF corte al 30 de junio de 2025. Estado de validación de planes institucionales segundo trimestre 2025 – SNP, corte 30 de junio de 2025.

Elaboración: Dirección de Seguimiento a la Planificación y Política Pública – SNP.

Tabla 9. Detalle de presupuesto de entidades sin planes institucionales registrados (en estado de validación, observado, no enviado)

Entidad	Codificado (MM USD)	Devengado (MM USD)	Ejecución (%)
Agencia de Regulación y Control de Electricidad*	9,64	2,61	27,08%
Agencia de Regulación y Control de Hidrocarburos*	10,28	4,64	45,09%
Agencia de Regulación y Control Minero*	5,80	2,25	38,75%
Instituto de Fomento a la Creatividad y la Innovación**	10,16	4,83	47,51%
Instituto de Promoción del Ecuador PROECUADOR*	3,07	0,52	16,85%
Instituto Oceanográfico y Antártico de la Armada	10,37	3,25	31,30%
Ministerio de la Mujer y Derechos Humanos	12,29	7,90	64,25%
Superintendencia de Protección de Datos Personales*	1,54	0,58	37,76%
Unidad de Gestión y Regularización	2,90	0,81	28,00%
Instituto de Cine y Creación Audiovisual**	0,00	0,00	0,00
Total	66,04	27,37	41,44%

Nota: *En proceso de creación: Agencia de Regulación y Control de Electricidad, Agencia de Regulación y Control Hidrocarburífero y Agencia de Regulación y Control Minero, conforme al Decreto Ejecutivo Nro. 256, de 8 de mayo de 2024, producto de la escisión de la Agencia de Regulación y Control de Energía y Recursos Naturales No Renovables. Así también, debido a la expedición de la Ley Orgánica de Protección de Datos Personales se creó la Superintendencia de Protección de Datos.

Mediante Decreto Ejecutivo Nro. 288 del 31 de mayo de 2024 se crea el Instituto de Promoción del Ecuador PROECUADOR.

** En proceso de fusión - Instituto de Fomento de las Artes, Innovación y Creatividad y, el Instituto de Cine y Creación Audiovisual, mediante Decreto Ejecutivo Nro. 1039 de 08 de mayo de 2020, se dispuso su fusión en una sola entidad denominada “*Instituto de Fomento a la Creatividad y la Innovación*”. Con Decreto Ejecutivo 812, de 5 de julio de 2023, se deroga la fusión del Decreto Ejecutivo 1039 de 08 de mayo de 2020. Mediante Decreto Ejecutivo, Nro.951 de 22 de noviembre de 2023, se hace una reforma al Decreto Ejecutivo 812, de 5 de julio de 2023, y se amplía el plazo por seis meses adicionales en la Disposición Transitoria Primera del Decreto Ejecutivo Nro. 812 para acciones legales y administrativas que debe ejecutar el Instituto de Fomento a la Creatividad y la Innovación.

Fuente: Base de datos e-SIGEF, Ejecución Presupuestaria Consolidada – MEF corte al 30 de junio de 2025. Estado de validación de planes institucionales segundo trimestre 2025 – SNP, corte 30 de junio de 2025.

Elaboración: Dirección de Seguimiento a la Planificación y Política Pública – SNP.

Tabla 10. Detalle de presupuesto de universidades sin planes institucionales registrados (en estado de validación, observado, no enviado)

Entidad	Codificado (MM USD)	Devengado (MM USD)	Ejecución (%)
Universidad Agraria del Ecuador	22,23	6,38	28,69%
Universidad Central del Ecuador	151,47	56,87	37,55%
Universidad Técnica Luis Vargas Torres de Esmeraldas	20,51	9,43	45,97%
Total	194,22	72,68	37,42%

Fuente: Base de datos e-SIGEF, Ejecución Presupuestaria Consolidada – MEF corte al 30 de junio de 2025. Estado de validación de planes institucionales segundo trimestre 2025 – SNP, corte 30 de junio de 2025.

Elaboración: Dirección de Seguimiento a la Planificación y Política Pública – SNP.

Tabla 11. Detalle de presupuesto sin planes institucionales, de unidades administrativas de otras entidades

Entidad	Codificado (MM USD)	Devengado (MM USD)	Ejecución (%)
Dirección Nacional de la Policía Judicial	4,97	2,82	56,74%
Dirección Nacional de Salud de La Policía Nacional	24,35	10,21	41,94%
Hospital de Especialidades Fuerzas Armadas No. 1	44,96	16,06	35,71%
Total	74,27	29,08	39,16%

Fuente: Base de datos e-SIGEF, Ejecución Presupuestaria Consolidada – MEF corte al 30 de junio de 2025. Estado de validación de planes institucionales segundo trimestre 2025 – SNP, corte 30 de junio de 2025. Corresponden 3 unidades administrativas que por su estructura orgánica no están sujetas a presentar sus planes institucionales.


Elaboración: Dirección de Seguimiento a la Planificación y Política Pública – SNP.

6.4. Ejecución presupuestaria Gasto No Permanente – Plan Anual de Inversiones

Con corte al 30 de junio de 2025, el PAI incluye 425 estudios, programas y proyectos de inversión con monto codificado. Adicionalmente, se identifica el proyecto “*Construcción Puente Cornelio Dávalos en Balbanera–Cumandá*”, a cargo del Ministerio de Transporte y Obras Públicas (MTO), que no cuenta con monto codificado y, por tanto, no está sujeto a seguimiento. Los 425 proyectos en ejecución agrupan el presupuesto de 82 entidades que forman parte del PAI y del PGE.

En total, se registra un codificado de USD 8.219,50 millones y un devengado de USD 3.466,79 millones, lo que representa una ejecución del 42,18%.

Ilustración 10. Ejecución Presupuestaria - Gasto No Permanente (millones de dólares)




Fuente: e-SIGEF, MEF- Ejecución Presupuestaria, corte al 30 de junio de 2025.

Elaboración: Dirección de Seguimiento a la Inversión – SNP.

Es importante señalar que, el “*Programa de preservación de capital periodo 2025*”, alineado al Objetivo 4 y clasificado en los grupos de gasto 73, 96 y 99, registró un codificado de USD 6.053,51 millones y un devengado de USD 2.962,86 millones, alcanzando una ejecución del 48,94%.

Haciendo una comparación entre el primer y segundo trimestre, se puede indicar que, al 31 de marzo de 2025, excluyendo el “*Programa de preservación de capital periodo 2025*”, el monto codificado de USD 1.934,26 millones, se asignaron fuentes de financiamiento por USD 1.792,51 millones, es decir el 92,67% del total del monto codificado contó con fuente de financiamiento al primer trimestre de 2025. Para el 30 de junio de 2025, excluyendo el “*Programa de preservación de capital periodo 2025*”, el monto total codificado se incrementó a USD 2.165,99 millones y el Ente Rector de las Finanzas Públicas asignó fuente de financiamiento por USD 2.084,35 millones; es decir el 96,23% del total del monto codificado contó con fuente de financiamiento al segundo trimestre de 2025. En este sentido, se identifica que tuvo un aumento entre trimestres de la asignación de fuente de financiamiento de 3,56 puntos porcentuales.

Ilustración 11. Variación mensual asignación fuente Gasto No Permanente (millones de dólares y porcentaje de financiamiento)

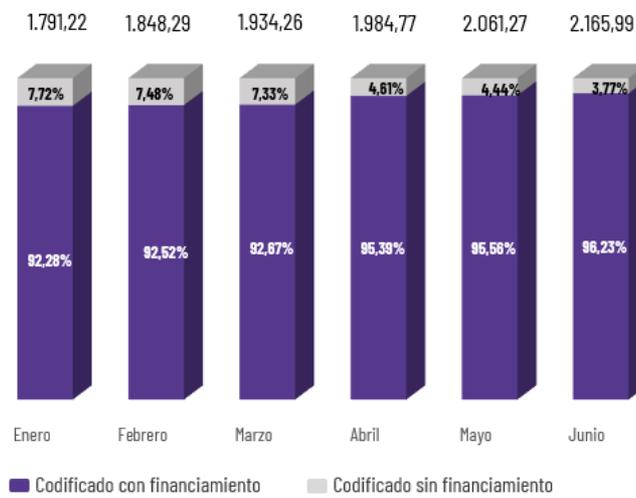

Nota: Para una mejor visualización, se excluye la información del “Programa de preservación de capital periodo 2025”, que se encuentra alineado al Objetivo 4.

Fuente: SIPeIP, SNP, e-SIGEF, MEF- Ejecución Presupuestaria, corte al 30 de junio de 2025.

Elaboración: Dirección de Seguimiento a la Inversión – SNP.

Adicionalmente, con la finalidad de identificar la gestión que se ha realizado en la ejecución del **Gasto No Permanente**, a continuación, se presenta la ejecución considerando el monto de anticipos y el monto codificado con fuente entregados en el periodo, por Ejes del PND, observándose un monto devengado con anticipos de USD 3.501,75 millones.

Ilustración 12. Ejecución: Devengado más anticipos en relación al codificado con fuente - Gasto No Permanente (millones de dólares)




Fuente: SIPeIP, SNP, e-SIGEF, MEF- Ejecución Presupuestaria, corte al 30 de junio de 2025.

Elaboración: Dirección de Seguimiento a la Inversión – SNP.

A continuación, se detalla el presupuesto del **Gasto No Permanente** por objetivos del PND:

El presupuesto del **Gasto No Permanente** por objetivos del PND, excluyendo el “Programa de Preservación de Capital – periodo 2025”, evidencia que el Objetivo 9 concentra tanto el mayor presupuesto codificado (USD 409,26 millones) como el mayor monto devengado (USD 159,00 millones). En contraste, el Objetivo 10 registra el menor presupuesto codificado (USD 18,01 millones) y el menor monto devengado (USD 11,47 millones).

Ilustración 13. Ejecución presupuestaria por Objetivos PND - Gasto No Permanente (millones de dólares)

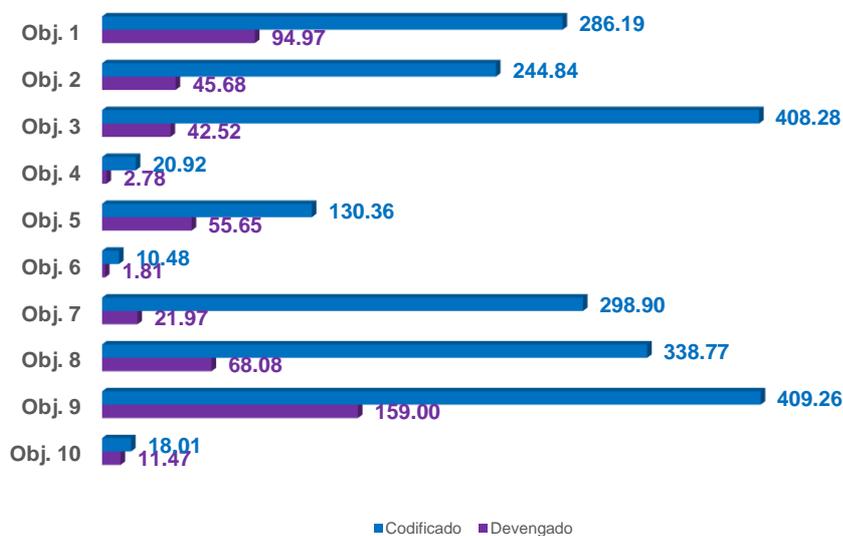


Nota: Para una mejor visualización, se excluye la información del “Programa de preservación de capital periodo 2025”, que se encuentra alineado al Objetivo 4.

Fuente: e-SIGEF, MEF- Ejecución Presupuestaria, corte al 30 de junio de 2025.

Elaboración: Dirección de Seguimiento a la Inversión – SNP.

Por su parte, al realizar el análisis considerando el monto de anticipos y el monto codificado con fuente que fueron entregados en el periodo, en la ilustración 14, se observa que el objetivo con mayor codificado es el Objetivo 3 (USD 408,28 millones) y un devengado de USD 45,29 millones. Mientras que el Objetivo con menor presupuesto codificado es el Objetivo 6 (USD 10,48 millones) y un devengado de USD 1,81 millones.

Ilustración 14. Variación mensual asignación fuente Gasto No Permanente (millones de dólares y porcentaje de financiamiento)

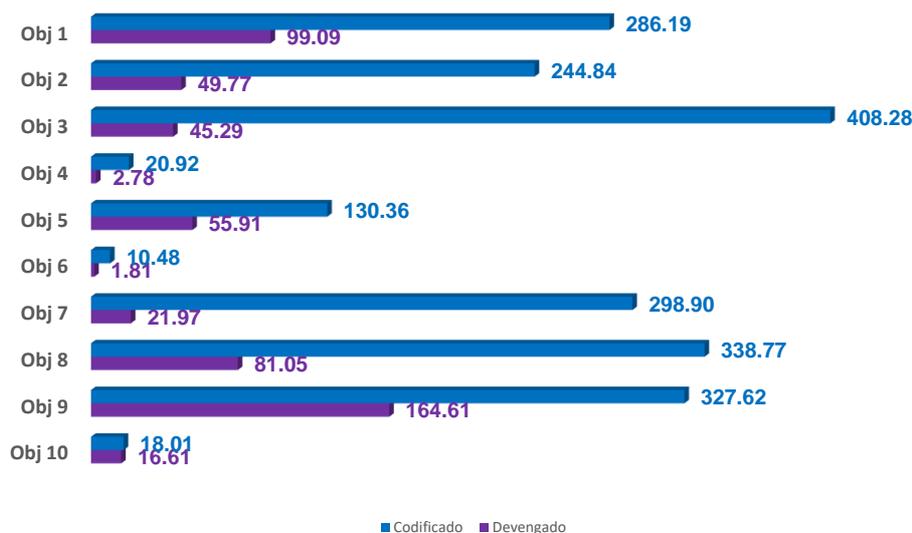

Nota: Para una mejor visualización, se excluye la información del “Programa de preservación de capital periodo 2025”, que se encuentra alineado al Objetivo 4.

Fuente: e-SIGEF, MEF- Ejecución Presupuestaria, corte al 30 de junio de 2025.

Elaboración: Dirección de Seguimiento a la Inversión – SNP.

En lo que respecta al **Gasto No Permanente**, se presenta la ejecución presupuestaria del primer y segundo trimestre por objetivo del PND 2024 – 2025. Los mayores montos ejecutados en relación al codificado por objetivo, se identifican en los proyectos alineados al Objetivo 9 con un monto devengado de USD 159,00 millones para el segundo trimestre y de USD 54,27 millones para el I trimestre y al Objetivo 1 con un monto devengado de USD 94,97 millones para el segundo trimestre y USD 30,58 millones para el primer trimestre. Por su parte, los objetivos con menor ejecución presupuestaria corresponden al Objetivo 4 (USD 2,78 millones) y el Objetivo 6 (USD 1,81 millones) para el segundo trimestre de 2025.

Ilustración 15. Ejecución presupuestaria por Objetivos PND - Gasto No Permanente, I y II trimestre 2025 (millones de dólares)



Nota: Para una mejor visualización, se excluye la información del “Programa de preservación de capital periodo 2025”, que se encuentra alineado al Objetivo 4.

Fuente: e-SIGEF, MEF- Ejecución Presupuestaria, corte al 30 de junio de 2025.

Elaboración: Dirección de Seguimiento a la Inversión – SNP.

7. Ejecución física del Presupuesto General del Estado por Objetivos del Plan Nacional de Desarrollo

Seguimiento a Planes Institucionales - Gasto Permanente

Para el análisis del seguimiento físico del nivel estratégico de los planes institucionales, con corte al 30 de junio de 2025, de las 161 entidades articuladas al **Gasto Permanente** del Presupuesto General del Estado, se consolida la información reportada por 113 entidades que presentan programación de metas mensuales, trimestrales y semestrales, conforme a la configuración de sus indicadores; y, además, han cumplido con el proceso de “Registro”, alineación a los Objetivos del PND 2024-2025 y sistematización de la programación anual de su Plan Institucional 2025.

A continuación, se observa la alineación de los objetivos institucionales con los Ejes y Objetivos del Plan Nacional de Desarrollo 2024-2025, en la que se refleja las entidades alineadas, objetivos institucionales (324) e indicadores vinculados (744):


Tabla 12. Alineación de entidades a Objetivos del PND 2024-2025

Eje	Eje Objetivos PND 2021-2025	Entidades (No.)	Objetivos Institucionales (No.)	Indicadores (No.)
Social	1. Mejorar las condiciones de vida de la población de forma integral, promoviendo el acceso equitativo a salud, vivienda y bienestar social.	19	48	119
	2. Impulsar las capacidades de la ciudadanía con educación equitativa e inclusiva de calidad y promoviendo espacios de intercambio cultural.	32	71	153
	3. garantizar la seguridad integral, la paz ciudadana y transformar el sistema de justicia respetando los derechos humanos.	14	40	70
Desarrollo Económico	4. Estimular el sistema económico y de finanzas públicas para dinamizar la inversión y las relaciones comerciales.	8	18	40
	5. Fomentar de manera sustentable la producción mejorando los niveles de productividad.	11	22	73
	6. Incentivar la generación de empleo digno.	4	7	26
Infraestructura, energía y medio ambiente	7. Precautelar el uso responsable de los recursos naturales con un entorno ambientalmente sostenible	10	29	75
	8. Impulsar la conectividad como fuente de desarrollo y crecimiento económico.	12	34	59
Institucional	9. Propender la construcción de un estado eficiente, transparente orientado al bienestar social.	24	52	108
Gestión de Riesgos	10. Promover la resiliencia de ciudades y comunidades para enfrentar los riesgos de origen natural y antrópico.	1	3	21
Total			324	744

Fuente: SNP, SIPeIP, corte 30 de junio de 2025. GPR, corte 30 de junio de 2025.
Elaboración: Dirección de Seguimiento a la Planificación y Política Pública – SNP.

Con base en el total de indicadores y su configuración, que se consideran para el proceso de seguimiento, se obtiene que el 79,44% cuentan con avance esperado, el 5,38% un avance cercano al esperado y el 15,19% un avance menor a lo esperado; conforme a las categorías y umbrales descritos en la metodología aplicada para este informe.

Ilustración 16. Porcentaje de cumplimiento por indicadores analizados



Fuente: SNP, SIPeIP corte 30 de junio de 2025. GPR corte 30 de junio de 2025.
Elaboración: Dirección de Seguimiento a la Planificación y Política Pública – SNP.

Seguimiento a Proyectos de Inversión - Gasto No Permanente

Para el análisis del seguimiento a la ejecución física del **Gasto No Permanente** del Presupuesto General del Estado, con corte al 30 de junio de 2025, se consideran 82 entidades que conforman el Plan Anual de Inversiones, cuyas iniciativas se encuentran alineadas a los Ejes y Objetivos del PND 2024–2025.

A continuación, se presenta una tabla que muestra el número de entidades y proyectos vinculados a cada eje y objetivo del PND, junto con su respectiva programación física y el nivel de cumplimiento, según las categorías de semaforización aplicadas para el seguimiento de proyectos de inversión.

Tabla 13. Promedio de cumplimiento de metas del Plan Anual de Inversiones - PND 2024-2025

Eje	Objetivos PND 2024-2025	Nro. Entidades	Nro. Proyectos	% Promedio cumplimiento físico 2025	Cumplimiento de metas físicas			
					Avance esperado (≥ 95% y < 100%)	Avance cercano al esperado (≥ 85% y < 95%)	Avance menor al esperado (<85%)	Sin Programación
1. Social	1. Mejorar las condiciones de vida de la población de forma integral, promoviendo el acceso equitativo a salud, vivienda y bienestar social.	8	32	81,81%	40,63%	3,13%	28,13%	28,13%
	2. Impulsar las capacidades de la ciudadanía con educación equitativa e inclusiva de	34	200	81,32%	37,00%	1,00%	14,50%	47,50%



Eje	Objetivos PND 2024-2025	Nro. Entidades	Nro. Proyectos	% Promedio cumplimiento físico 2025	Cumplimiento de metas físicas			
					Avance esperado (≥ 95% y < 100%)	Avance cercano al esperado (≥ 85% y < 95%)	Avance menor al esperado (<85%)	Sin Programación
	calidad y promoviendo espacios de intercambio cultural.							
	3. Garantizar la seguridad integral, la paz ciudadana y transformar el sistema de justicia respetando los derechos humanos.	9	29	61,66%	31,03%	3,45%	31,03%	34,48%
	5. Fomentar de manera sustentable la producción mejorando los niveles de productividad.	1	1	100,00%	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%
2. Desarrollo Económico	3. Garantizar la seguridad integral, la paz ciudadana y transformar el sistema de justicia respetando los derechos humanos.	1	2	83,65%	50,00%	0,00%	50,00%	0,00%
	4. Estimular el sistema económico y de finanzas públicas para dinamizar la inversión y las relaciones comerciales.	6	11	80,80%	54,55%	0,00%	18,18%	27,27%
	5. Fomentar de manera sustentable la producción mejorando los niveles de productividad.	5	29	84,36%	31,03%	13,79%	24,14%	31,03%
	6. Incentivar la generación de empleo digno.	2	2	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%
3. Infraestructura, Energía y Medio Ambiente	1. Mejorar las condiciones de vida de la población de forma integral, promoviendo el acceso equitativo a salud, vivienda y bienestar social.	1	2	50,00%	50,00%	0,00%	50,00%	0,00%



Eje	Objetivos PND 2024-2025	Nro. Entidades	Nro. Proyectos	% Promedio cumplimiento físico 2025	Cumplimiento de metas físicas			
					Avance esperado (≥ 95% y < 100%)	Avance cercano al esperado (≥ 85% y < 95%)	Avance menor al esperado (<85%)	Sin Programación
	6. Incentivar la generación de empleo digno.	1	2	0,00%	0,00%	0,00%	50,00%	50,00%
	7. Precautelar el uso responsable de los recursos naturales con un entorno ambientalmente sostenible	7	34	81,87%	35,29%	2,94%	20,59%	41,18%
	8. Impulsar la conectividad como fuente de desarrollo y crecimiento económico.	4	30	59,03%	23,33%	0,00%	23,33%	53,33%
4. Institucional	1. Mejorar las condiciones de vida de la población de forma integral, promoviendo el acceso equitativo a salud, vivienda y bienestar social.	3	5	83,81%	60,00%	0,00%	20,00%	20,00%
	2. Impulsar las capacidades de la ciudadanía con educación equitativa e inclusiva de calidad y promoviendo espacios de intercambio cultural.	2	2	67,30%	50,00%	0,00%	50,00%	0,00%
	4. Estimular el sistema económico y de finanzas públicas para dinamizar la inversión y las relaciones comerciales.	1	1	98,27%	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%
	9. Propender la construcción de un Estado eficiente, transparente orientado al bienestar social.	23	39	62,69%	25,64%	5,13%	28,21%	41,03%
5. Gestión de Riesgos	10. Promover la resiliencia de ciudades y comunidades para enfrentar los riesgos de	1	3	44,84%	33,33%	0,00%	66,67%	0,00%


Eje	Objetivos PND 2024-2025	Nro. Entidades	Nro. Proyectos	% Promedio cumplimiento físico 2025	Cumplimiento de metas físicas			
					Avance esperado (≥ 95% y < 100%)	Avance cercano al esperado (≥ 85% y < 95%)	Avance menor al esperado (<85%)	Sin Programación
	origen natural y antrópico.							
	3. Garantizar la seguridad integral, la paz ciudadana y transformar el sistema de justicia respetando los derechos humanos.	1	1	10,20%	0,00%	0,00%	100,00%	0,00%
Total general		82	425	75,95%	35,06%	2,59%	20,94%	41,41%

Fuente: SIPeIP, SNP, e-SIGEF, MEF- Ejecución Presupuestaria, corte al 30 de junio de 2025.

Elaboración: Dirección de Seguimiento a la Inversión – SNP.

A nivel general, el 35,06% de los proyectos del Plan Anual de Inversiones 2025 presentan un avance esperado, mientras que el 20,94% reportan un avance menor al esperado al cierre del segundo trimestre de 2025.

Ilustración 17. Resumen de cumplimiento general – Gasto No Permanente

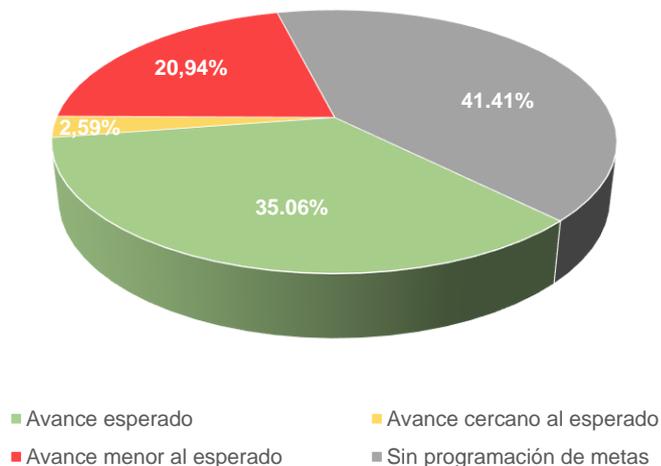


Fuente: SIPeIP, SNP, e-SIGEF, MEF- Ejecución Presupuestaria, corte al 30 de junio de 2025.

Elaboración: Dirección de Seguimiento a la Inversión – SNP.

En cuanto al cumplimiento físico alineado a los Objetivos del Plan Nacional de Desarrollo 2024–2025, se observa que el Objetivo 4 registra el mayor porcentaje de proyectos con un *avance esperado* con 55%. En contraste, el Objetivo 10 presenta el mayor porcentaje de proyectos con *avance menor al esperado* con 75%.

Ilustración 18. Porcentaje de cumplimiento de proyectos PAI por Objetivos

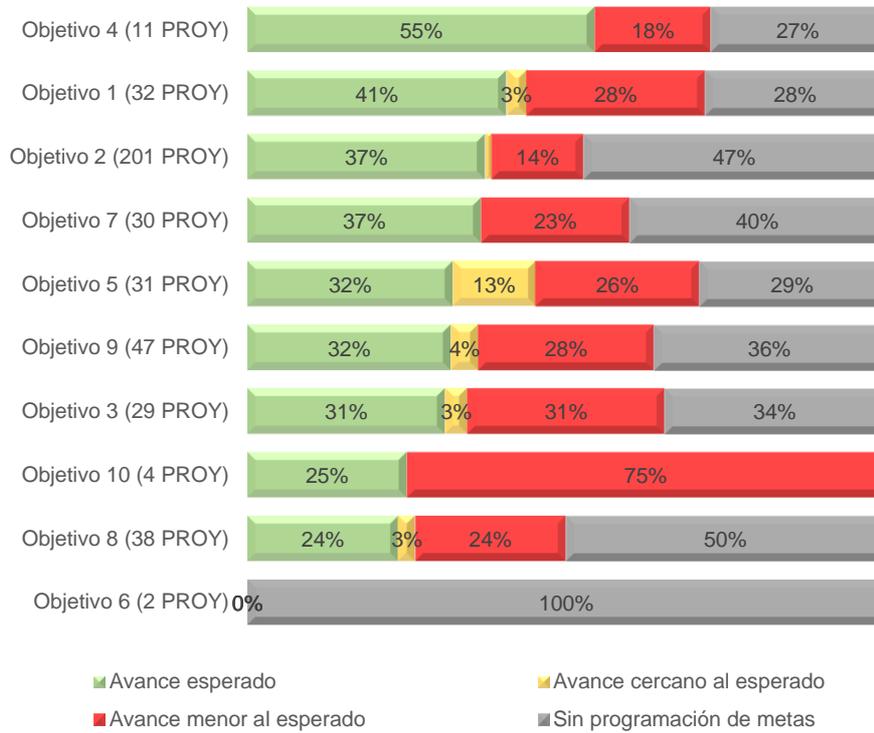

Fuente: SIPeIP, SNP, e-SIGEF, MEF- Ejecución Presupuestaria, corte al 30 de junio de 2025.
Elaboración: Dirección de Seguimiento a la Inversión – SNP.



Eje Social



7.1. OBJETIVO 1: Mejorar las condiciones de vida de la población de forma integral, promoviendo el acceso equitativo a salud, vivienda y bienestar social.

Este Objetivo busca mejorar las condiciones de vida de la población de forma integral, promoviendo el acceso equitativo a salud, vivienda y bienestar social. En tal sentido, este contribuye en la construcción de una sociedad justa que combate las causas estructurales de la pobreza, exclusión y violencia. Para lograrlo, las políticas y estrategias establecidas apuntan al fortalecimiento de los programas y servicios sociales que ofrece el Estado con especial énfasis en la población más vulnerable.

Con base en la gestión desarrollada por el Estado a través de la implementación de sus planes institucionales, estudios, programas y proyectos durante el segundo trimestre del 2025, a continuación, se detallan los resultados alineados a este Objetivo:

7.1.1. Gestión Presupuestaria

Para el cumplimiento de las metas de Objetivo 1, se devengó un total de USD 2.310,63 millones en el segundo trimestre del 2025, de los cuales, el 95,89% corresponde a **Gasto Permanente** con un monto devengado de USD 2.215,65 millones; y, la diferencia corresponde al **Gasto No Permanente** vinculado a estudios, programas y proyectos de inversión, de diferentes entidades, con un monto devengado de USD 94,97 millones.

Ilustración 19. Gasto Permanente y No Permanente en 2025 – Objetivo 1 (millones de dólares)




Fuente: SIPeIP, SNP. e-SIGEF, MEF - Ejecución Presupuestaria. Corte 30 de junio de 2025.

Elaboración: Dirección de Seguimiento a la Planificación y Política Pública y Dirección de Seguimiento a la Inversión – SNP.

Por su parte, la ejecución presupuestaria del **Gasto No Permanente** destinado al Objetivo 1, considerando el monto devengado más anticipos entregados en el periodo de USD 99,09 millones, frente al monto codificado con fuente de financiamiento de USD 286,19 millones, alcanza un nivel de ejecución del 34,62%.



Ilustración 20. Ejecución: Devengado más anticipos en relación al codificado con fuente – Objetivo 1 (millones de dólares)




Fuente: SIPeIP -SNP, e-SIGEF - MEF- Ejecución Presupuestaria. Corte 30 de junio de 2025.
Elaboración: Dirección de Seguimiento a la Inversión – SNP.

A continuación, se detallan los montos correspondientes al **Gasto Permanente** y **Gasto No Permanente** que fueron ejecutados, alineados al Objetivo 1, en función de los gabinetes sectoriales establecidos para la gestión institucional.

En **Gasto Permanente**, el Gabinete Sectorial de lo Social es el que más recursos ejecutó en este Objetivo, con un monto devengado de USD 2.214,59 millones, conforme la siguiente ilustración:

Ilustración 21. Gasto Permanente por Gabinete Sectorial en 2025 – Objetivo 1 (millones de dólares)



Fuente: Base de datos e-SIGEF, Ejecución Presupuestaria Consolidada – MEF corte al 30 de junio de 2025. Base de alineación al PND segundo trimestre 2025 – SNP, corte 30 de junio de 2025.
Elaboración: Dirección de Seguimiento a la Planificación y Política Pública – SNP.

En relación al **Gasto Permanente** alineado al Objetivo 1 se identifica que se encuentran alineadas 16 entidades, con un presupuesto codificado de USD 4.447,40 millones y un monto devengado de USD 2.215,65 millones, lo que representa una ejecución presupuestaria del 49,82%. A continuación, se detalla la ejecución presupuestaria correspondiente al segundo trimestre por institución:

Tabla 14. Ejecución presupuestaria de las entidades alineadas al Objetivo 1

Gabinete Sectorial	Entidad	Codificado (MM USD)	Codificado (MM USD)	Ejecución (%)
Gabinete Sectorial de lo Social	Agencia de Aseguramiento de la Calidad de Servicios de Salud y Medicina Prepagada	3,77	1,74	46,27%
	Agencia Nacional de Regulación Control y Vigilancia Sanitaria	10,26	4,82	47,03%
	Instituto Nacional de Donación y Trasplantes de Órganos Tejidos y Células	0,07	0,03	47,31%
	Instituto Nacional de Investigación En Salud Pública Dr. Leopoldo Izquieta Pérez	0,81	0,14	16,87%
	Ministerio de Desarrollo Urbano y Vivienda	1,16	0,53	45,73%
	Ministerio de Inclusión Económica y Social	1.831,86	1.022,04	55,79%
	Ministerio de Salud Pública	2.589,66	1.181,68	45,63%
	Ministerio del Deporte	7,18	3,59	50,02%
	Secretaría Técnica del Comité de Prevención de Asentamientos Humanos Irregulares	0,03	0,02	48,97%

Gabinete Sectorial	Entidad	Codificado (MM USD)	Codificado (MM USD)	Ejecución (%)
	Unidad del Registro Social	0,02	0,01	26,89%
Sin Gabinete	Consejo Nacional de Salud	0,08	0,04	45,77%
	Consejo Nacional para la Igualdad de Discapacidades	0,79	0,36	45,81%
	Consejo Nacional para la Igualdad de Pueblos y Nacionalidades	0,24	0,11	46,13%
	Consejo Nacional para la Igualdad Intergeneracional	1,00	0,46	46,16%
	Superintendencia de Ordenamiento Territorial Uso y Gestión del Suelo	0,04	0,02	4,66%
	Universidad de Guayaquil	0,45	0,07	16,43%
Total		4.447,40	2.215,65	49,82%

Fuente: SNP, SIPeIP corte 30 de junio de 2025. e-SIGEF –MEF- Ejecución Presupuestaria, se excluye el sectorial Tesoro Nacional, que son entidades virtuales manejadas por MEF, corte 30 de junio de 2025.

Elaboración: Dirección de Seguimiento a la Planificación y Política Pública – SNP.

El objetivo 1 relacionado con mejorar las condiciones de vida de manera integral, incluye a las instituciones como el Ministerio de Inclusión Económica y Social y el Ministerio de Salud Pública que concentran el 99,2% del codificado del objetivo, cuyos niveles de ejecución presupuestaria son 55,79% y 45.63% respectivamente.

Por su parte, en lo que respecta al **Gasto No Permanente**, las entidades que conforman el Gabinete Sectorial de lo Social ejecutaron USD 94,97 millones alineados al Objetivo 1.

Ilustración 22. Gasto No Permanente por Gabinete Sectorial en 2025 (segundo trimestre) – Objetivo 1 (millones de dólares)



Fuente: SIPeIP, SNP. e-SIGEF, MEF- Ejecución Presupuestaria. Corte 30 de junio de 2025.

Elaboración: Dirección de Seguimiento a la Inversión – SNP.

En el Objetivo 1, las entidades del Gabinete Sectorial de lo Social presentan una ejecución presupuestaria considerando los anticipos de 34,62%, correspondiente a 32 proyectos de inversión.



Tabla 15. Cumplimiento presupuestario por gabinete sectorial en 2025 – Objetivo 1

Gabinete Sectorial	Número de Entidades	Número de Proyectos	% Ejecución presupuestaria	
			Devengado / Codificado	Devengado más anticipos / Codificado con fuente
Social	8	32	33,19%	34,62%
Total	8	32		

Fuente: SIPeIP - SNP. e-SIGEF – MEF– Ejecución Presupuestaria. Corte 30 de junio de 2025.

Elaboración: Dirección de Seguimiento a la Inversión – SNP.

Para obtener información detallada sobre las entidades, se recomienda revisar el Anexo 2, que contiene la matriz resumen con datos sobre el avance presupuestario y físico.

7.1.2. Avance Físico de la Planificación Institucional

Las 19 entidades que cumplieron con el proceso de registro y sistematización de su planificación institucional y cuentan con indicadores alineados al objetivo 1, sujetos a seguimiento (mensuales, trimestrales y semestrales), registran 48 objetivos institucionales y 119 indicadores estratégicos. De tal manera, se identifica que, el 77,31% presentan un avance esperado, el 11,76% presenta un avance cercano al esperado, el 10,92% presenta un avance menor al esperado, conforme el detalle que se establece a continuación:

Tabla 16. Ejecución Indicadores Institucionales – Objetivo 1

Entidad	Número Indicadores	Avance esperado		Avance cercano al esperado		Avance menor a lo esperado	
		Indicadores	%	Indicadores	%	Indicadores	%
Agencia de Aseguramiento de la Calidad de los Servicios de Salud y Medicina Prepagada	12	11	91,67%	1	8,33%	0	0,00%
Agencia Nacional de Regulación, Control y Vigilancia Sanitaria	8	6	75,00%	1	12,50%	1	12,50%
Consejo Nacional para la Igualdad Intergeneracional	3	2	66,67%	1	33,33%	0	0,00%
Consejo Nacional para la Igualdad de Discapacidades	1	1	100,00%	0	0,00%	0	0,00%
Consejo Nacional De Salud	5	5	100,00%	0	0,00%	0	0,00%
Consejo Nacional para la Igualdad De Pueblos y Nacionalidades	5	5	100,00%	0	0,00%	0	0,00%
Instituto Nacional de Economía Popular y Solidaria	6	3	50,00%	2	33,33%	1	16,67%
Instituto Nacional de Donación y Trasplante de Órganos, Tejidos y Células	8	8	100,00%	0	0,00%	0	0,00%
Instituto Nacional de Investigación en Salud Pública Dr. Leopoldo Izquieta Pérez	10	8	80,00%	2	20,00%	0	0,00%
MD - Ministerio del Deporte	2	1	50,00%	0	0,00%	1	50,00%
Ministerio de Desarrollo Urbano y Vivienda	9	5	55,56%	0	0,00%	4	44,44%
Ministerio de Inclusión Económica y Social	18	15	83,33%	3	16,67%	0	0,00%
Ministerio de Salud Pública	10	4	40,00%	3	30,00%	3	30,00%
Secretaría Técnica de la Circunscripción Territorial Especial Amazónica	2	1	50,00%	0	0,00%	1	50,00%
Secretaría Técnica del Comité de Prevención de Asentamientos Humanos Irregulares	5	3	60,00%	1	20,00%	1	20,00%

Entidad	Número Indicadores	Avance esperado 		Avance cercano al esperado 		Avance menor a lo esperado 	
		Indicadores	%	Indicadores	%	Indicadores	%
Secretaría Técnica Ecuador Crece Sin Desnutrición Infantil	8	7	87,50%	0	0,00%	1	12,50%
Superintendencia de Ordenamiento Territorial Uso y Gestión del Suelo	2	2	100,00%	0	0,00%	0	0,00%
Universidad de Guayaquil	1	1	100,00%	0	0,00%	0	0,00%
Unidad del Registro Social	4	4	100,00%	0	0,00%	0	0,00%
Total	119	92	77,31%	14	11,76%	13	10,92%

Fuente: SNP, SIPeIP corte 30 de junio de 2025. GPR corte 30 de junio de 2025.

Elaboración: Dirección de Seguimiento a la Planificación y Política Pública – SNP.

Principales Logros

Ministerio de Inclusión Económica y Social

- El 93,11% de niñas y niños de 0 a 3 años y gestantes, es decir, 258.641 usuarios/as, asistieron a los Servicios de Desarrollo Infantil Integral que se brindan a través de los Centros de Desarrollo Infantil (CDI) y Creciendo con Nuestros Hijos (CNH) a nivel nacional.
- El 96% de usuarias(os), es decir 33.779 personas fueron atendidas a través de la Prestación de Servicios para personas con Discapacidad en sus tres modalidades a nivel nacional: Atención en el Hogar y la Comunidad, Centros Diurnos y Centros de Referencia y Acogida a escala nacional a través de convenios de cooperación técnico - económica y centros de administración directa del Ministerio de Inclusión Económica y Social.
- 29 adopciones de niñas, niños y adolescentes a nivel nacional e internacional fueron concretadas, desde abril a junio 2025.
- 12.134 usuarias(os), fueron atendidos en el marco de la erradicación del trabajo infantil, de los cuales se erradicó a 2.393 niñas, niños y adolescentes de 5 a 17 años en situación de trabajo infantil a nivel nacional.
- 28.102 usuarias(os) de los servicios Ministerio de Inclusión Económica y Social fueron capacitados en Mecanismos para la Promoción de los Derechos de las Mujeres y la Prevención de toda forma de Discriminación con la finalidad de reducir la discriminación y violencia basada en género a nivel nacional.
- 1.681 emprendimientos fueron vinculados entre el periodo de abril a junio 2025, al Sistema Nacional de Comercialización Inclusiva, que visibiliza y totaliza la participación de los emprendedores del Créditos de Desarrollo Humano, usuarios de los servicios Ministerio de Inclusión Económica y Social y actores de la Economía Popular y Solidaria, que cuentan con un emprendimiento funcional, activo y han sido articulados a espacios de comercialización.
- USD 142,98 millones en total acumulado hasta el segundo trimestre 2025, entregados para usuarios de Bonos y Pensiones, con cargo al Créditos de Desarrollo Humano Individuales y Asociativos. En este sentido, durante los meses de abril a junio de 2025, se entregó un Monto total de USD 11'332.510 en Créditos de Desarrollo Humano, a nivel nacional.
- 1'438.267 usuarias(os) habilitados al pago de las transferencias monetarias no contributivas, lo que representa un cumplimiento mayor a la programación del mes de junio.
- 18.912 núcleos familiares usuarios del Bono de Desarrollo Humano variable a nivel nacional alcanzaron condiciones básicas de desarrollo familiar.
- 46.525 usuarias(os) fueron habilitadas al Bono Joaquín Gallegos Lara a nivel nacional.

Instituto Nacional de Economía Popular y Solidaria



- USD 58,61 millones en ventas alcanzadas como resultado de la articulación de mercados nacionales e internacionales que corresponden al período de enero a junio de 2025. Estas ventas fueron realizadas por las Organizaciones de la Economía Popular y Solidaria y las Unidades Económicas Populares, con el apoyo del Instituto Nacional de Economía Popular y Solidaria, a través de sus ocho direcciones zonales, incluyendo el Distrito Metropolitano de Quito.
- 85 planes de negocio solidario fueron asesorados a las Organizaciones de la Economía Popular y Solidaria y las Unidades Económicas Populares, al segundo trimestre 2025, mediante una gestión coordinada con las organizaciones de la Economía Popular y Solidaria, ejecutados en las 8 direcciones zonales del Instituto, incluido el Distrito Metropolitano de Quito.

Ministerio de Salud Pública

- 102.508 vacunas de tercera dosis aplicadas contra el neumococo en menores de un año, sobre una población de 259.168, realizadas a junio 2025.
- 104.575 vacunas de segunda dosis contra el rotavirus aplicadas en menores de un año sobre una población de 259.168 realizadas a junio 2025.
- 137 entidades Operativas Desconcentradas del Ministerio de Salud Pública, cuentan con un stock igual o superior al 70% de medicamentos contenidos en el Cuadro Nacional de Medicamentos Básicos, para lo cual se contó con las asignaciones presupuestarias realizadas por el MEF a nivel nacional.
- 93.341 neonatos tamizados a nivel nacional, previniendo así la discapacidad intelectual y la muerte precoz; y, garantizando la prestación del servicio de Tamizaje Metabólico Neonatal.

Secretaría Técnica Ecuador Crece Sin desnutrición Infantil

- 3 subcomités técnicos abordaron el tema de la inscripción temprana de nacimientos, generando un análisis que evidencia la necesidad de implementar acciones específicas en provincias con bajos niveles de inscripción.
- 221 cantones avanzan con la implementación de la Fase 2 (Diagnóstico) y Fase 3 (Producción y validación de mensajes) de la propuesta de cambio de comportamiento para la prevención de la Desnutrición Crónica Infantil, operativizada mediante la ejecución de las Comisiones Estratégicas Locales y Planes Locales de Educomunicación.
- 5 espacios de articulación territorial se desarrollaron con entidades y organizaciones como el GAD de Sucre, Education for development, RESCUE International, GAD de Cayambe y el Ministerio de Salud Pública, fortaleciendo el trabajo conjunto en territorio.
- 2 proyectos cumplieron con los requisitos para la emisión del Aval de Alineación al Plan Estratégico Intersectorial para la Prevención y Reducción de la Desnutrición Crónica Infantil.

Unidad del Registro Social

- 11 documentos fueron elaborados con metodologías, normas y lineamientos técnicos para medir la información de los niveles de bienestar de la población del Registro Social, entre los cuales destacan: propuesta de ejecución del proceso para aplicación de normativa, propuesta metodológica para completar y actualizar el Registro Social con información proveniente del Ministerio de Salud Pública, variables para la actualización de Formulario del Registro Social a través de la modalidad de Ventanilla Física.



Ministerio de Desarrollo Urbano y Vivienda

- 189 proyectos de Vivienda de Interés Social, registrados del total de solicitudes ingresadas por los Promotores/Constructores a nivel nacional.
- 589 beneficiarios calificados para viviendas de interés público.
- 145 beneficiarios calificados para viviendas de interés social en terrenos urbanizados por el Estado, emergencias y subsidio parcial.

Consejo Nacional para la Igualdad Intergeneracional

- 199 cantones de un total de 221 fueron fortalecidos en conocimientos y gestión sobre el Sistema de Protección de Derechos a nivel local, mediante asistencia técnica realizada directamente en territorio.
- Se realizó un análisis comparativo de la tasa de mortalidad de niños, niñas y adolescentes por accidentes de tránsito en la última década, a través de una investigación enfocada en el cumplimiento de sus derechos.

Consejo Nacional para la Igualdad de Pueblos y Nacionalidades

- 1 Agenda Nacional de Igualdad de Nacionalidades y Pueblos Indígenas, Afroecuatoriano y Montubio fue transversalizada y articulada entre enero y junio de 2025, fortaleciendo la incidencia de políticas públicas con enfoque intercultural en la gestión nacional y local, e integrándola en los Planes de Desarrollo de Ordenamiento Territorial y agendas sectoriales mediante mesas técnicas interinstitucionales.
- 9 instituciones: Secretaría del Sistema de Educación Intercultural Bilingüe, Ministerio de Agricultura, Defensoría Pública, Ministerio de Desarrollo Urbano y Vivienda, Secretaría de Educación Superior, Ciencia, Tecnología e Innovación, Ministerio de Cultura y Patrimonio, Ministerio del Interior, Secretaría General de la Presidencia y Ministerio de Trabajo, articularon y alinearon sus acciones a la política pública de la Agenda Nacional para la Igualdad de Derechos de los Pueblos y Nacionalidades Indígenas, Pueblo Afroecuatoriano y Pueblo Montubio durante el primer semestre de 2025.
- 1 caso de vulneración de derechos iniciado en 2024 en la ciudad de Esmeraldas fue concluido en el primer semestre de 2025, marcando un avance en la atención a situaciones de injusticia.

Consejo Nacional para la Igualdad de Discapacidades

- 30.306 personas sensibilizadas entre servidores públicos y trabajadores del sector privado mediante cursos virtuales enfocados en el ámbito de las discapacidades.
- 2 mesas de diálogo con el Ministerio de Salud Pública, para impulsar la articulación institucional y mejorar el proceso de calificación y recalificación de personas con discapacidad, con énfasis en la capacitación al personal de la red pública integral de salud sobre el correcto llenado de formularios.
- 487 atenciones brindadas en temas relacionados con la vulneración de derechos de personas con discapacidad.
- 23 mesas de Diálogo Intersectorial Provincial ejecutadas para promover la implementación de políticas públicas en discapacidad conforme a la Agenda Nacional para la Igualdad en Discapacidades 2021–2025, articulando con instituciones rectoras y ejecutoras en el territorio.



Agencia de Aseguramiento de la Calidad de los Servicios de Salud y Medicina Prepagada

- 2.642 vigilancias realizadas a prestadores de servicios de salud no habilitados a nivel nacional.
- 1.213 procedimientos sancionatorios resueltos en el periodo abril a junio a nivel nacional.
- 201 procesos coactivos iniciados a través de la estructuración de mecanismos de seguimiento a nivel nacional.
- 5.049 solicitudes atendidas de registro de títulos de Profesionales de la salud a nivel nacional.
- 168 solicitudes atendidas de permisos para el ejercicio de terapias alternativas a nivel nacional.

Instituto Nacional de Donación y Trasplantes de Órganos Tejidos y Células

- 9.657 personas sensibilizadas mediante 52 actividades de sensibilización en el periodo de abril a junio de 2025.
- 5.310 personas capacitadas respecto a la actividad de trasplantes mediante 13 capacitaciones.
- 6 auditorías fueron ejecutadas al primer semestre de 2025 a los procesos de donación y trasplante.
- 3 visitas sorpresas (una por cada coordinación zonal) realizadas a los establecimientos de salud y servicios de apoyo que realizan actividad de trasplantes nivel nacional en las cuales se verificó el cumplimiento de la normativa legal y vigente.
- 88 trasplantes de corneas realizas a nivel nacional que fueron importadas en el segundo trimestre.

Agencia Nacional de Regulación, Control y Vigilancia Sanitaria

- 13.510 controles fueron ejecutados en establecimientos relacionados con productos de uso y consumo humano, en todas las provincias bajo las coordinaciones zonales.
- 4.499 solicitudes atendidas de productos cosméticos en tiempo óptimo durante el periodo de abril a junio 2025, con reducción del 61,8% de pendientes a nivel nacional.
- 2.976 certificados emitidos para alimentos, suplementos y regímenes especiales.

Instituto Nacional de Investigación en Salud Pública

- 90.310 pruebas especializadas de laboratorio realizadas entre abril y junio de 2025 por los Centros de Referencia Nacional, en respuesta a las solicitudes diagnósticas²¹ de los laboratorios de la Red Nacional de Salud, fortaleciendo la capacidad diagnóstica del sistema nacional de vigilancia.
- 17 documentos técnicos elaborados durante el segundo trimestre 2025, entre manuales técnicos, guías de laboratorio, algoritmos diagnósticos e informes técnicos, con la participación directa de los Centros de Referencia Nacional, como aporte a la estandarización y fortalecimiento técnico del sistema de salud pública.

²¹ Total de pruebas realizadas en laboratorio, el indicador es respecto al número de pruebas realizadas

Ministerio del Deporte

- 700 puntos activados respecto al servicio Actívate, que busca promover la actividad física y un estilo de vida saludable a nivel nacional, a través de programas gratuitos como bailoterapia, ejercicios funcionales y caminatas, dirigidos por instructores capacitados, se cuenta con 32.890 beneficiarios permanentes a junio y 78.364 beneficiarios eventuales.


7.1.3. Avance Físico Proyectos de Inversión

El Objetivo 1 cuenta con 32 proyectos de inversión ejecutados por 8 entidades. El monto codificado total asciende a USD 286,19 millones, con un devengado de USD 94,97 millones, lo que representa una ejecución presupuestaria del 33,19%. Considerando anticipos, la ejecución asciende al 34,62%, con un monto devengado más anticipo de USD 99,09 millones frente al codificado con fuente.

El Ministerio de Salud Pública, el Ministerio de Inclusión Económica y Social, el Ministerio de Desarrollo Urbano y Vivienda y el Instituto Nacional de Economía Popular y Solidaria concentran el 91,86% del presupuesto codificado al eje social (USD 262,88 millones) y ejecutan el 87,50% de los proyectos (28 de 32).

En cuanto al avance físico, este objetivo registra un cumplimiento del 23,48% respecto de las metas anuales programadas, con un nivel promedio de cumplimiento del 81,81% al segundo trimestre, lo que indica un *“avance menor al esperado”*. Se destacan las entidades como el Instituto Nacional de Economía Popular y Solidaria, el Ministerio de Desarrollo Urbano y Vivienda, el Ministerio de Inclusión Económica y Social, el Ministerio de Salud Pública y la Unidad de Registro Social quienes registran varios proyectos que alcanzaron el 100,00% de cumplimiento de sus metas físicas programadas.

Ilustración 23. Gasto No Permanente, avance físico promedio y avance presupuestario-Objetivo 1

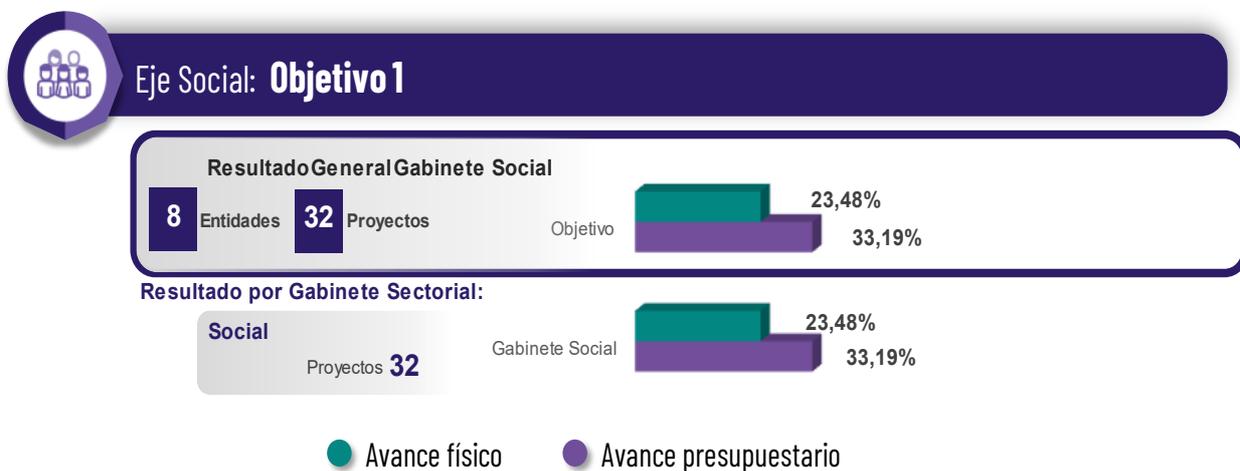

Fuente: SIPeIP, SNP. e-SIGEF, MEF– Ejecución Presupuestaria. Corte 30 de junio 2025.
Elaboración: Dirección de Seguimiento a la Inversión – SNP.

A continuación, se detalla el cumplimiento físico de los proyectos de inversión por gabinetes sectoriales relacionados con el Objetivo 1, lo que permite identificar los niveles de ejecución alcanzados por cada sector en relación con las metas físicas programadas.



Tabla 17. Cumplimiento físico por gabinete – Objetivo 1

Gabinete Sectorial	Número de Entidades	Número de Proyectos	Número de proyectos por nivel de cumplimiento			
			●	●	●	●
Social	8	32	13	1	9	9
Total	8	32	13	1	9	9

Nota: ● Avance esperado ≥ 95% y < 100% / ● Avance cercano al esperado ≥ 85% y < 95% / ● Avance menor al esperado < 85% / ● Proyecto sin programación de metas.

Fuente: SIPeIP, SNP. e-SIGEF, MEF- Ejecución Presupuestaria. Corte 30 de junio de 2025.

Elaboración: Dirección de Seguimiento a la Inversión – SNP.

Para conocer más información acerca de las entidades, por favor revisar el Anexo 2, que contiene la matriz resumen con información de avance presupuestario y físico.

A continuación, se presenta la información de ejecución de los principales proyectos de inversión que contribuyen a este objetivo:

Causas y Logros

Ministerio de Salud Pública

El Ministerio de Salud Pública contó, dentro del Objetivo 1, con un monto codificado de USD 125,32 millones y un monto devengado de USD 37,80 millones, lo que representa una ejecución presupuestaria del 30,17%. Al considerar el devengado más anticipos en relación con el codificado con fuente, se registra una ejecución del 33,02%. Adicionalmente, se identifican 13 proyectos alineados a este objetivo, de los cuales 10 cuentan con programación de metas físicas al segundo trimestre de 2025. De estos, 8 proyectos presentan un cumplimiento del 100,00% en sus metas físicas programadas.

Tabla 18. Avance Físico de Proyectos de Inversión al Segundo Trimestre Ministerio de Salud Pública – Objetivo 1

Nombre del proyecto	Programación metas físicas al ii trimestre (a)	Ejecución metas físicas al ii Trimestre (b)	Cumplimiento metas físicas c (b/a)	Codificado (MM USD) (d)	Devengado (MM USD) (e)	Ejecución presupuestaria 2025 f(e/d)	Devengado + anticipos / codificado con fuente (g)
Apoyo a la Transformación Digital y Fortalecimiento de los Servicios Integrales de Salud	10,00%	10,00%	● 100,00%	3,63	2,58	70,99%	70,99%
Apoyo al Fortalecimiento de los Establecimientos de Salud del MSP por Situación de Movilidad Humana	0,00%	0,00%	● 0,00%	0,15	0,01	8,06%	8,06%
Desarrollo de la Estrategia para el Abordaje Integral del Fenómeno Socio Económico de las Drogas y Fortalecimiento de la Salud Mental	1,52%	1,52%	● 100,00%	4,26	1,50	35,26%	35,26%
Ecuador Libre de Desnutrición Infantil	15,35%	7,63%	● 49,71%	13,87	3,76	27,14%	27,14%
Eliminación de la Malaria en Ecuador y Prevención del Restablecimiento	8,04%	7,50%	● 93,28%	1,85	0,22	11,65%	11,65%
Fortalecimiento a la Atención Integral en Salud en el Primer Nivel de Atención como Apoyo a la Estrategia Ecuador Crece Sin Desnutrición	1,67%	1,67%	● 100,00%	20,20	8,77	43,40%	43,40%
Fortalecimiento de la Atención Integral, Detección, Prevención, Rehabilitación y Habilitación de Personas con Discapacidades, a Nivel Nacional	6,57%	7,59%	● 100,00%	11,39	2,44	21,44%	21,44%



Nombre del proyecto	Programación metas físicas al ii trimestre (a)	Ejecución metas físicas al ii Trimestre (b)	Cumplimiento metas físicas c (b/a)	Codificado (MM USD) (d)	Devengado (MM USD) (e)	Ejecución presupuestaria 2025 f(e/d)	Devengado + anticipos / codificado con fuente (g)
Fortalecimiento de la Calidad de Infraestructura, Equipamiento y Sistemas Conexos de Comunicación del Primer Nivel de Atención en Salud	1,42%	1,42%	● 100,00%	20,62	4,37	21,19%	28,11%
Fortalecimiento de la Salud Intercultural en el Ecuador	5,86%	5,86%	● 100,00%	5,26	1,77	33,62%	33,62%
Fortalecimiento del Sector Materno Infantil de la Red de Salud Pública de la Coordinación Zonal No 6	0,00%	0,00%	● 0,00%	4,00	0,00	0,00%	0,00%
Proyecto para Elaboración Integral de la Salud Sexual y Salud Reproductiva en Adolescentes	0,00%	0,00%	● 0,00%	3,12	0,30	9,70%	9,70%
Reducción de las Enfermedades Crónico-Transmisibles de Mayor Impacto en el Ecuador: VIH/Sida, ITS, Tuberculosis y Hepatitis Viral B y C	0,50%	0,50%	● 100,00%	9,14	1,09	11,89%	11,89%
Reingeniería de la Infraestructura y Equipamiento Hospitalario para los Servicios de Salud del Segundo y Tercer Nivel de Atención	36,01%	36,01%	● 100,00%	27,82	11,00	39,53%	47,26%
							33,02%

Nota: ● Avance esperado ≥ 95% y < 100% / ● Avance cercano al esperado ≥ 85% y < 95% / ● Avance menor al esperado < 85% / ● Proyecto sin programación de metas.

Fuente: SIPeIP - SNP. e-SIGEF - MEF- Ejecución Presupuestaria. Corte 30 de junio de 2025.

Elaboración: Dirección de Seguimiento a la Inversión – SNP.

El Ministerio de Salud Pública reporta las siguientes acciones:

Proyecto Apoyo a la Transformación Digital y Fortalecimiento de los Servicios Integrales de Salud

Al segundo trimestre de 2025, el proyecto registra un monto codificado de USD 3,63 millones y una ejecución presupuestaria acumulada del 70,99%. Entre los principales avances la entidad reporta: la liquidación del proceso de adquisición del sistema hiperconvergente para el fortalecimiento del procesamiento de aplicaciones y gestión de respaldos del centro de datos del Ministerio de Salud Pública, con una inversión de USD 2,41 millones más IVA.

No obstante, se identifica como causa de la no ejecución de la adquisición de compras, el plazo limitado para la finalización del contrato de préstamo, lo que requiere ajustar la planificación y priorización de las mismas para asegurar su cumplimiento dentro del período establecido.

Proyecto Desarrollo de la Estrategia para el Abordaje Integral del Fenómeno Socioeconómico de las Drogas y Fortalecimiento de la Salud Mental

Al segundo trimestre de 2025, el proyecto registra un monto codificado de USD 4,26 millones y una ejecución presupuestaria acumulada del 35,26%. Entre los principales avances reportados por la entidad: se destaca la implementación de 566 actividades de prevención en reducción de la demanda de drogas a nivel nacional, abarcando ámbitos como el comunitario, educativo, laboral, de salud, cultural, recreativo y deportivo, bajo enfoques de derechos, género, discapacidad, cultura y atención a personas en situación de vulnerabilidad.

La institución señala que el incumplimiento de la meta 1.4 establecida al inicio del proyecto, se debe a que esta fue subestimada en su planteamiento inicial. Se requiere que la entidad realice la gestión para su ajuste y cumplimiento.



Proyecto Fortalecimiento a la Atención Integral en Salud en el Primer Nivel de Atención como Apoyo a la Estrategia Ecuador Crece Sin Desnutrición

Al segundo trimestre de 2025, el proyecto registra un monto codificado de USD 20,20 millones y una ejecución presupuestaria acumulada del 43,40%. Entre los principales avances reportados por la entidad se incluyen: la continuidad del equipo gestor para el 2025, en cumplimiento de lo establecido en el acuerdo de préstamo con el Banco Mundial. Asimismo, se obtuvo la no objeción por parte del organismo, lo que permitió dar inicio a la fase precontractual.

Proyecto Fortalecimiento de la Atención Integral, Detección, Prevención, Rehabilitación y Habilitación de Personas con Discapacidades, a Nivel Nacional

Al segundo trimestre de 2025, el proyecto registra un monto codificado de USD 11,39 millones y una ejecución presupuestaria acumulada del 21,44%. Entre los principales avances reportados por la entidad se incluyen: la entrega de 980 ayudas técnicas de especialidad en el II trimestre por lo que se ha superado la meta anual 2025, entregado 13.971 ayudas técnicas de movilidad.

Como causa de demoras vinculadas a la gestión del proyecto la entidad identifica: plazos contractuales de 154 días. Lo que requiere evaluar alternativas para optimizar estos plazos, como la agilización de procesos administrativos y la revisión de cronogramas, con el fin de asegurar el cumplimiento oportuno de las metas establecidas.

Proyecto Fortalecimiento de la Calidad de Infraestructura, Equipamiento y Sistemas Conexos de Comunicación del Primer Nivel de Atención en Salud

Al segundo trimestre de 2025, el proyecto registra un monto codificado de USD 20,62 millones y una ejecución presupuestaria acumulada al considerar anticipos del 28,11%. Entre los principales avances reportados por la entidad se incluyen: la inauguración de 4 establecimientos de salud (Guaslan, Licto, Chiriyacu Alto y Villaflora), se desarrollaron 7 eventos de primera piedra para la intervención de infraestructura sanitaria en 11 establecimientos de salud (Poalo, Toacaso, Belisario Quevedo, 11 de noviembre, Alaquez, Guachapala, Pachicutza, Fajardo y Nambacola, Chuquiribamba). Promoción Familiar, se desarrolló 1 evento de primera piedra para la intervención de infraestructura sanitaria en el C.S Borja.

Como causa de demoras vinculadas a la gestión del proyecto la entidad identifica Curs pendientes. Lo que requiere priorizar la gestión y aprobación de dichos pagos a fin de evitar retrasos adicionales y asegurar la continuidad de las actividades planificadas.

Proyecto Fortalecimiento de la Salud Intercultural en el Ecuador

Al segundo trimestre de 2025, el proyecto registra un monto codificado de USD 5,26 millones y una ejecución presupuestaria acumulada del 33,62%.

La entidad reporta que la causa de la no ejecución plena de las actividades contempladas en el *Manual de Articulación de prácticas y saberes de parteras y parteros ancestrales tradicionales* es la existencia de barreras de acceso geográfico, dado que gran parte del grupo objetivo reside en zonas distantes o de difícil acceso, lo que dificulta su movilización hacia los puntos destinados para dichas actividades.



Proyecto Reducción de las Enfermedades Crónico-Trasmisibles de Mayor Impacto en el Ecuador: VIH/Sida, ITS, Tuberculosis y Hepatitis Viral B y C

Al segundo trimestre de 2025, el proyecto registra un monto codificado de USD 9,14 millones y una ejecución presupuestaria acumulada del 11,89%. Entre los principales avances reportados por la entidad indica que se realizó la capacitación a profesionales de la salud en ETMI-Plus, Hepatitis Virales B y C, e ITS-VIH, abarcando aspectos de atención, diagnóstico y seguimiento. Además, se elaboraron documentos normativos para el manejo de estas enfermedades.

Proyecto Reingeniería de la Infraestructura y Equipamiento Hospitalario para los Servicios de Salud del Segundo y Tercer Nivel de Atención

Al segundo trimestre de 2025, el proyecto registra un monto codificado de USD 27,82 millones y una ejecución presupuestaria acumulada al considerar anticipos del 47,26%. La entidad reporta entre los avances que el proyecto ha cumplido oportunamente con la presentación de todos los informes requeridos, en concordancia con la planificación establecida para el indicador.

La entidad reporta que la causa del riesgo identificado es la posible terminación unilateral, por parte del proveedor, del contrato para el proceso de remediación y rehabilitación de la infraestructura, situación que demanda una gestión oportuna para garantizar la continuidad de las obras.

Ministerio de Inclusión Económica y Social

El MIES contó, dentro del Objetivo 1, con un monto codificado de inversión de USD 71,49 millones y un monto devengado de USD 28,93 millones, lo que representa una ejecución presupuestaria del 40,46%. Adicionalmente, se identifican 9 proyectos alineados a este objetivo. De los 5 proyectos que cuentan con programación de metas físicas al segundo trimestre de 2025, 2 registran cumplimiento del 100,00%.

Tabla 19. Avance Físico de Proyectos de Inversión al Segundo Trimestre Ministerio de Inclusión Económica y Social – Objetivo 1

Nombre del proyecto	Programación metas físicas (a)	Ejecución metas físicas (b)	Cumplimiento metas físicas c(b/a)	Codificado (MM USD) (d)	Devengado (MM USD) (e)	Ejecución presupuestaria 2025 f (d/e)	Devengado + anticipos /codificado con fuente (g)
Diseño e Implementación de Servicios de Inclusión Económica y Social Dirigidos a Usuarios del MIES	0,00%	0,00%	● 0,00%	6,18	0,49	7,93%	7,93%
Estrategia de Fortalecimiento del Talento Humano e Innovación en los Servicios Sociales - EFTHISS	8,03%	5,93%	● 73,85%	0,30	0,12	41,93%	41,93%
Fortalecimiento a la Gestión e Innovación en el Cuidado de Personas con Discapacidad Severa	0,00%	0,00%	● 0,00%	1,45	0,00	0,00%	0,00%
Fortalecimiento Ampliación e Innovación de los Servicios de Desarrollo Infantil Estrategia Nacional Misión Ternura	0,00%	0,00%	● 0,00%	22,47	10,82	48,16%	48,16%
Fortalecimiento de los Servicios de Prevención y Protección Especial en el Ciclo de Vida a Nivel Nacional	30,63%	18,31%	● 59,78%	14,11	4,42	31,33%	31,33%
Implementar y Fortalecer Servicios de Atención de Movilidad Humana y Modalidades Alternativas para la Protección Atención y Restitución de Derechos Vulnerados de Niñas, Niños y Adolescentes	19,61%	15,81%	● 80,62%	6,41	3,02	47,18%	47,18%



Nombre del proyecto	Programación metas físicas (a)	Ejecución metas físicas (b)	Cumplimiento metas físicas c(b/a)	Codificado (MM USD) (d)	Devengado (MM USD) (e)	Ejecución presupuestaria 2025 f (d/e)	Devengado + anticipos /codificado con fuente (g)
Inclusión en el Sistema Formal Productivo de las Mujeres en Condiciones de Vulnerabilidad Pobreza y Extrema Pobreza	2,86%	2,86%	● 100,00%	0,37	0,09	24,92%	24,92%
Innovación, Diversificación y Ampliación de los Servicios de Inclusión Social para Personas con Discapacidad y sus Redes de Apoyo en Marco de la Implementación del Modelo Social de Atención en el Ministerio de Inclusión Económica y Social	0,00%	0,00%	● 0,00%	4,28	2,10	48,94%	48,94%
Sostenibilidad de los Servicios Gerontológicos y Ampliación de la Cobertura con un Enfoque en el Envejecimiento Activo, Digno y Saludable "Envejeciendo Juntos"	1,50%	1,50%	● 100,00%	15,93	7,87	49,37%	49,37%
Total							40,46%

Nota: ● Avance esperado ≥ 95% y < 100% / ● Avance cercano al esperado ≥ 85% y < 95% / ● Avance menor al esperado < 85% / ● Proyecto sin programación de metas.

Fuente: SiPeIP - SNP. e-SIGEF - MEF- Ejecución Presupuestaria. Corte 30 de junio de 2025.

Elaboración: Dirección de Seguimiento a la Inversión – SNP.

El Ministerio de Inclusión Económica y Social reporta las siguientes acciones:

Proyecto Inclusión en el Sistema Formal Productivo de las Mujeres en Condiciones de Vulnerabilidad, Pobreza y Extrema Pobreza

Al segundo trimestre de 2025, el proyecto registra un monto codificado de USD 0,37 millones y una ejecución presupuestaria acumulada del 24,92%. Entre los principales avances la entidad reporta: la emisión de la certificación presupuestaria para el grupo de gasto 78, la elaboración del informe técnico, la suscripción del cuarto convenio modificatorio, la emisión del aval específico para el grupo de gasto 78, la solicitud de pago correspondiente a los trimestres IV-2024 e I-2025 (CUR 4039), y la aprobación de la reforma presupuestaria para el grupo de gasto 78.

La entidad reporta que la causa del incumplimiento de las metas establecidas para el proyecto es la suspensión de colocaciones desde junio de 2023, situación que requiere la implementación de acciones correctivas y de reprogramación para retomar el avance previsto.

Proyecto Sostenibilidad de los Servicios Gerontológicos y Ampliación de la Cobertura con un Enfoque en el Envejecimiento Activo, Digno y Saludable "Envejeciendo Juntos"

Al segundo trimestre de 2025, el proyecto registra un monto codificado de USD 15,93 millones, con una ejecución presupuestaria acumulada del 49,37%. La entidad reporta que: este avance permitió atender a 51.907 Personas Adultas Mayores en las cuatro modalidades planificadas.

La entidad reporta que las causas de la ejecución del proyecto son los retrasos en la acreditación de pagos por parte del MEF y la insuficiencia del presupuesto asignado para cubrir convenios durante todo el año, lo que ha obligado a planificar su suscripción. Se recomienda gestionar con el ente rector las transferencias oportunas y evaluar mecanismos para optimizar el uso de los recursos disponibles, garantizando así la continuidad y alcance de los convenios previstos.



7.2. OBJETIVO 2: Impulsar las capacidades de la ciudadanía con educación equitativa e inclusiva de calidad y promoviendo espacios de intercambio cultural.


Este Objetivo impulsa las capacidades de la ciudadanía con educación equitativa e inclusiva de calidad y promoviendo espacios de intercambio cultural, tiene como prioridad adoptar un modelo educativo diverso y descentralizado que contribuya a garantizar la igualdad de oportunidades y el derecho a una vida libre de violencia. Establece políticas y estrategias que promueven la cultura, investigación e innovación y el desarrollo de un sistema educativo inclusivo, eficiente y de calidad en todos los niveles.

Con base en la gestión desarrollada por el Estado a través de la implementación de sus planes institucionales, estudios, programas y proyectos durante el segundo trimestre del 2025, a continuación, se detallan los resultados alineados a este Objetivo:

7.2.1. Gestión Presupuestaria

Para el cumplimiento de las metas del Objetivo 2, se devengó un total de USD 1.760,23 millones en el segundo trimestre del 2025, de los cuales, el 97,41% corresponde a Gasto Permanente con un monto devengado de USD 1.714,55 millones; y, la diferencia corresponde al **Gasto No Permanente** vinculado a estudios, programas y proyectos de inversión, de diferentes entidades, con un monto devengado de USD 45,68 millones.

Ilustración 24. Gasto Permanente y No Permanente en 2025 – Objetivo 2 (millones de dólares)

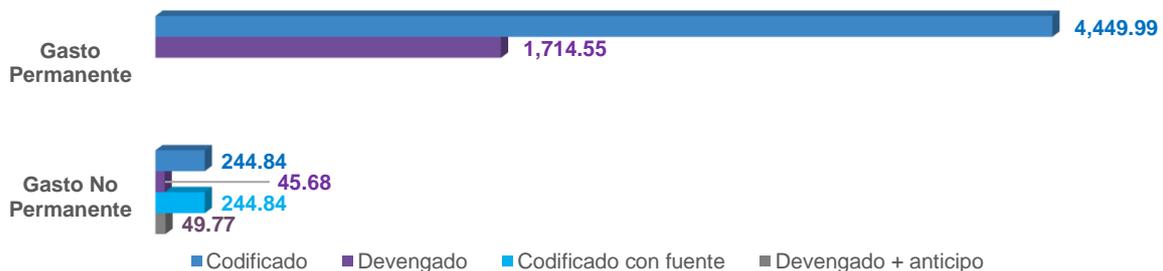

Fuente: SIPeIP, SNP. e-SIGEF, MEF- Ejecución Presupuestaria. Corte 30 de junio de 2025.

Elaboración: Dirección de Seguimiento a la Planificación y Política Pública y Dirección de Seguimiento a la Inversión – SNP.

Por su parte, la ejecución presupuestaria del **Gasto No Permanente** destinado al Objetivo 2, considerando el monto devengado más anticipos entregados en el periodo (USD 49,77 millones), frente al monto codificado con fuente de financiamiento (USD 244,84 millones), alcanza un nivel de ejecución del 20,33%.

Ilustración 25. Devengado más anticipos en relación al codificado con fuente – Objetivo 2 (millones de dólares)




Fuente: SIPeIP -SNP, e-SIGEF - MEF- Ejecución Presupuestaria. Corte 30 de junio de 2025.
Elaboración: Dirección de Seguimiento a la Inversión – SNP.

A continuación, se detallan los montos correspondientes al **Gasto Permanente** y **Gasto No Permanente** que fueron ejecutados, alineados al Objetivo 2, en función de los gabinetes sectoriales establecidos para la gestión institucional.

En **Gasto Permanente**, el Gabinete Sectorial de lo Social es el que más recursos ejecutó en este Objetivo, con un monto devengado de USD 1.411,28 millones, conforme la siguiente ilustración:

Ilustración 26. Gasto Permanente por Gabinete Sectorial en 2025 – Objetivo 2 (millones de dólares)



Fuente: Base de datos e-SIGEF, Ejecución Presupuestaria Consolidada – MEF corte al 30 de junio de 2025. Base de alineación al PND segundo trimestre 2025 – SNP, corte 30 de junio de 2025.
Elaboración: Dirección de Seguimiento a la Planificación y Política Pública – SNP.

En relación al **Gasto Permanente** alineado al Objetivo 2, se identifica que se encuentran alineadas 38 entidades, con un presupuesto codificado de USD 4.449,99 millones y un monto devengado de USD 1,714,55 millones, lo que representa una ejecución presupuestaria del 38,53%. A continuación, se detalla la ejecución presupuestaria correspondiente al segundo trimestre por institución:

Tabla 20. Ejecución presupuestaria de las entidades alineadas al Objetivo 2

Gabinete Sectorial	Entidad	Codificado (MM USD)	Devengado (MM USD)	Ejecución (%)
Gabinete Sectorial de lo Social	Instituto Nacional de Evaluación Educativa	1,32	0,63	47,65%
	Instituto Nacional de Investigación en Salud Pública Dr. Leopoldo Izquieta Pérez	0,07	0,04	53,63%
	Ministerio de Cultura y Patrimonio	8,93	4,08	45,68%
	Ministerio de Educación	3,576,20	1,332,91	37,27%
	Ministerio del Deporte	40,04	27,23	68,02%
	Secretaría de Educación Intercultural Bilingüe y la Etnoeducación	1,03	0,24	23,60%
	Secretaría de Educación Superior Ciencia Tecnología e Innovación	116,29	44,71	38,45%
	Servicio Nacional de Derechos Intelectuales	3,16	1,43	45,33%
Sin Gabinete	Casa de Montalvo	0,08	0,03	37,42%



Gabinete Sectorial	Entidad	Codificado (MM USD)	Devengado (MM USD)	Ejecución (%)
	Consejo de Aseguramiento de la Calidad de la Educación Superior	2,23	0,75	33,66%
	Consejo de Educación Superior	2,29	0,97	42,47%
	Escuela Politécnica Nacional	41,87	18,67	44,60%
	Escuela Superior Politécnica Agropecuaria de Manabí Manuel Félix López	11,34	5,10	44,93%
	Escuela Superior Politécnica del Chimborazo	46,28	21,19	45,79%
	Escuela Superior Politécnica del Litoral	5,84	2,33	39,86%
	Instituto de Altos Estudios Nacionales	4,46	1,19	26,75%
	Universidad de Cuenca	56,30	24,42	43,37%
	Universidad de Guayaquil	85,62	37,22	43,47%
	Universidad de Investigación de Tecnología Experimental Yachay	8,70	4,15	47,72%
	Universidad de las Artes	8,85	3,70	41,84%
	Universidad de las Fuerzas Armadas Espe	47,87	20,18	42,17%
	Universidad Estatal Amazónica	13,40	5,26	39,23%
	Universidad Estatal de Bolívar	13,65	5,17	37,90%
	Universidad Estatal de Milagro	26,08	11,66	44,69%
	Universidad Estatal Península de Santa Elena	13,23	6,53	49,32%
	Universidad Laica Eloy Alfaro de Manabí	52,51	26,77	50,98%
	Universidad Nacional de Chimborazo	23,57	11,25	47,71%
	Universidad Nacional de Educación	12,95	4,64	35,82%
	Universidad Nacional de Loja	26,31	11,76	44,72%
	Universidad Politécnica Estatal del Carchi	9,60	3,72	38,81%
	Universidad Regional Amazónica Ikiam	7,46	2,64	35,40%
	Universidad Técnica de Ambato	43,38	16,16	37,26%
	Universidad Técnica de Babahoyo	17,54	6,71	38,25%
	Universidad Técnica de Cotopaxi	20,37	8,07	39,64%
	Universidad Técnica de Machala	19,98	8,94	44,77%
	Universidad Técnica de Manabí	38,13	14,92	39,13%
	Universidad Técnica de Quevedo	21,43	9,44	44,06%
	Universidad Técnica del Norte	21,64	9,71	44,86%
Total		4.449,99	1.714,55	38,53%


Fuente: SNP, SIPeIP-Seguimiento a planes institucionales corte 30 de junio de 2025. e-SIGEF –MEF- Ejecución Presupuestaria, se excluye el sectorial Tesoro Nacional, que son entidades virtuales manejadas por MEF, corte 30 de junio de 2025.

Elaboración: Dirección de Seguimiento a la Planificación y Política Pública – SNP.

El objetivo 2 relacionado con impulsar las capacidades de la ciudadanía en el ámbito educativo y cultural, presenta a las instituciones Ministerio de Educación y la Secretaría de Educación Superior Ciencia Tecnología e Innovación que concentran el 82,98% del codificado del objetivo, cuyos niveles de ejecución presupuestaria son 37,27% y 38,45% respectivamente.

Por su parte, en lo que respecta al **Gasto No Permanente**, las entidades que conforman el Gabinete Sectorial de lo Social ejecutaron USD 25,70 millones, mientras que las entidades sin Gabinete alineados al Objetivo 2 ejecutaron USD 19,98 millones.

Ilustración 27. Gasto No Permanente por Gabinete Sectorial en 2025 (segundo trimestre) – Objetivo 2 (millones de dólares)

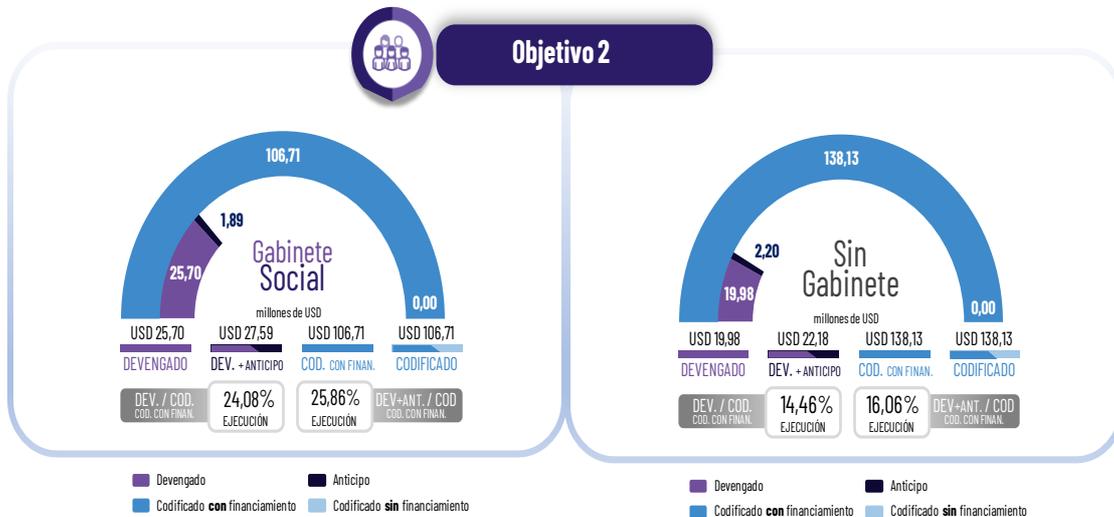

Fuente: SIPeIP, SNP. e-SIGEF, MEF- Ejecución Presupuestaria. Corte 30 de junio de 2025.
Elaboración: Dirección de Seguimiento a la Inversión – SNP.

De esta manera, se evidencia que las entidades del Gabinete Sectorial de lo Social presentan la mayor ejecución presupuestaria considerando anticipos en el Objetivo 2, alcanzando un 25,86%, correspondiente a 30 proyectos de inversión. Mientras que las entidades Sin Gabinete presentan una ejecución de 16,06% correspondiente a 171 proyectos de inversión.

Tabla 21. Cumplimiento presupuestario por gabinete sectorial en 2025 – Objetivo 2

Gabinete Sectorial	Número de Entidades	Número de Proyectos	% Ejecución presupuestaria	
			Devengado / Codificado	Devengado más anticipos / Codificado con fuente
Social	6	30	24,08%	25,86%
Sin Gabinete	28	171	14,46%	16,06%
Total	34	201		

Fuente: SIPeIP - SNP. e-SIGEF – MEF– Ejecución Presupuestaria. Corte 30 de junio de 2025.
Elaboración: Dirección de Seguimiento a la Inversión – SNP.

Para obtener información detallada sobre las entidades, se recomienda revisar el Anexo 2, que contiene la matriz resumen con datos sobre el avance presupuestario y físico.

7.2.2. Avance Físico de la Planificación Institucional

Las 32 entidades que cumplieron con el proceso de registro y sistematización de su planificación institucional y cuentan con indicadores alineados al objetivo 2, sujetos a seguimiento (mensuales, trimestrales y semestrales), registran 71 objetivos institucionales y 153 indicadores estratégicos. En este sentido, se identifica que, el 69,93% presentan un avance esperado, el 5,23% presenta un avance cercano al esperado, el 24,84% presenta un avance menor al esperado, conforme el detalle que se establece a continuación:

Tabla 22. Ejecución Indicadores Institucionales – Objetivo 2

Entidad	Número Indicadores	Avance esperado		Avance cercano al esperado		Avance menor a lo esperado	
		Indicadores	%	Indicadores	%	Indicadores	%



Entidad	Número Indicadores	Avance esperado 		Avance cercano al esperado 		Avance menor a lo esperado 	
		Indicadores	%	Indicadores	%	Indicadores	%
Centro Interamericano de Artesanías y Artes Populares	4	1	25,00%	0	0,00%	3	75,00%
Consejo Nacional para la Igualdad de Discapacidades	1	1	100,00%	0	0,00%	0	0,00%
Consejo de Aseguramiento de La Calidad de la Educación Superior	4	4	100,00%	0	0,00%	0	0,00%
Consejo de Educación Superior	3	3	100,00%	0	0,00%	0	0,00%
Escuela Politécnica Nacional	1	1	100,00%	0	0,00%	0	0,00%
Escuela Superior Politécnica Agropecuaria de Manabí Manuel Félix López	7	7	100,00%	0	0,00%	0	0,00%
Escuela Superior Politécnica del Chimborazo	3	2	66,67%	0	0,00%	1	33,33%
Instituto Nacional de Investigación en Salud Pública Dr. Leopoldo Izquieta Pérez	6	6	100,00%	0	0,00%	0	0,00%
Instituto Nacional de Biodiversidad	4	4	100,00%	0	0,00%	0	0,00%
Instituto Superior Tecnológico de Artes del Ecuador	3	0	0,00%	0	0,00%	3	100,00%
Ministerio de Cultura y Patrimonio	4	0	0,00%	0	0,00%	4	100,00%
Ministerio del Deporte	3	0	0,00%	0	0,00%	3	100,00%
Secretaría de Educación Intercultural Bilingüe y la Etnoeducación	1	1	100,00%	0	0,00%	0	0,00%
Servicio Nacional de Derechos Intelectuales	3	2	66,67%	0	0,00%	1	33,33%
Secretaría de Educación Superior, Ciencia, Tecnología e Innovación	7	6	85,71%	0	0,00%	1	14,29%
Unidad Nacional Antidopaje del Ecuador	3	1	33,33%	0	0,00%	2	66,67%
Universidad de Guayaquil	8	5	62,50%	2	25,00%	1	12,50%
Universidad de las Fuerzas Armadas	8	6	75,00%	0	0,00%	2	25,00%
Universidad Estatal Amazónica	5	5	100,00%	0	0,00%	0	0,00%
Universidad Estatal de Bolívar	4	4	100,00%	0	0,00%	0	0,00%
Universidad Estatal Península de Santa Elena	7	5	71,43%	0	0,00%	2	28,57%
Universidad Laica Eloy Alfaro de Manabí	14	11	78,57%	2	14,29%	1	7,14%
Universidad Nacional de Chimborazo	3	1	33,33%	0	0,00%	2	66,67%
Universidad Nacional de Educación	1	0	0,00%	1	100,00%	0	0,00%
Universidad Nacional de Loja	7	5	71,43%	0	0,00%	2	28,57%
Universidad Politécnica Estatal del Carchi	18	6	33,33%	3	16,67%	9	50,00%
Universidad Técnica de Ambato	5	5	100,00%	0	0,00%	0	0,00%
Universidad Técnica de Babahoyo	3	3	100,00%	0	0,00%	0	0,00%
Universidad Técnica de Manabí	3	2	66,67%	0	0,00%	1	33,33%



Entidad	Número Indicadores	Avance esperado		Avance cercano al esperado		Avance menor a lo esperado	
		Indicadores	%	Indicadores	%	Indicadores	%
Universidad Técnica del Norte	1	1	100,00%	0	0,00%	0	0,00%
Universidad Técnica Estatal de Quevedo	6	6	100,00%	0	0,00%	0	0,00%
Total	153	107	69,93%	8	5,23%	38	24,84%

Fuente: SNP, SIPeIP corte 30 de junio de 2025. GPR corte 30 de junio de 2025.

Elaboración: Dirección de Seguimiento a la Planificación y Política Pública – SNP.

Principales Logros

Secretaría de Educación Superior Ciencia Tecnología e Innovación

- 110.468 postulantes fueron asignados con cupo a nivel nacional en una universidad, escuela politécnica, instituto tecnológico o conservatorio superior público. De ellos, 90.887 aspirantes (8 de cada 10) aceptaron el cupo para iniciar sus estudios de educación superior.
- 131.613 cupos estuvieron disponibles para la ciudadanía en general, gestionados exitosamente en cada período académico a través de la plataforma informática del Sistema Nacional de Nivelación y Admisión, a nivel nacional.
- 20.181 cupos ofertados por institutos públicos, de los cuales 8.159 fueron aceptados, mediante la misma plataforma del sistema nacional.
- 301.056 becas de gasto corriente fueron adjudicadas a nivel nacional para el acceso y permanencia en la educación superior.
- 2 espacios de innovación tipo incubadora fueron acreditados en la provincia de Pichincha y 1 oficina de transferencia de tecnología en la provincia de Guayas, en cumplimiento del Reglamento de Registro de Coworkings y Acreditación de Espacios de Innovación y Espacios de Transferencia de Tecnología.

Secretaría de Educación Intercultural Bilingüe y la Etnoeducación

- 4 centros educativos se incorporaron durante el primer semestre de 2025 a la implementación del Modelo del Sistema de Educación Intercultural Bilingüe, ubicados en las provincias de Orellana, Bolívar y Pichincha, fortaleciendo el acceso a una educación con enfoque intercultural y bilingüe.

Consejo de Aseguramiento de la Calidad de la Educación Superior

- 8 informes técnicos elaborados correspondientes a: 4 revisiones de Planes de Aseguramiento de la Calidad en universidades públicas (Universidad Nacional de Educación, Universidad Regional Amazónica Ikiam, Universidad Yachay, Universidad de las Artes) y 4 de acompañamientos a planes de mejora de la carrera de Derecho no acreditadas.
- Elaboración de informes técnicos para el reconocimiento de acreditaciones internacionales (Agencia Acreditadora de Chile A&C, Consejo Mexicano para la Acreditación de la Educación Médica, Accreditation Council for Business Schools and Programs y Association of MBAs) aplicadas a programas de cinco universidades (Universidad de las Américas, Universidad Internacional del Ecuador, Universidad Técnica de Cotopaxi, Universidad San Francisco de Quito y Hemisferios), además de la planificación de reformas normativas en el Consejo de Aseguramiento de la Calidad de la Educación Superior.
- Se planificó y ejecutó el lanzamiento del Encuentro Internacional de Formación Técnica y Tecnológica 2025 con coorganizadores, responsabilidades, metodología y página web



establecidos.

Consejo de Educación Superior

- 220 carreras y 192 programas presentados por las Instituciones de Educación Superior que cumplieron con la normativa vigente, fueron aprobados en los diferentes niveles de formación, mismas que se ofertan a los estudiantes que acceden a este servicio a nivel nacional.
- 275 actos normativos fueron expedidos para garantizar los principios del Sistema de Educación Superior, mismos que tienen como finalidad impulsar la autonomía responsable de las Instituciones de Educación Superior, así como mejorar la calidad educativa, la equidad y la accesibilidad de los estudiantes a la educación superior a nivel nacional.

Servicio Nacional de Derechos Intelectuales

- 1.823 registros de Derechos de Autor fueron atendidos, lo que representa el 100,00% de las solicitudes ingresadas durante el período, garantizando una gestión eficiente y oportuna de los trámites.
- 27 depósitos voluntarios de conocimientos tradicionales registrados en el primer semestre de 2025, contribuyendo al reconocimiento y preservación de expresiones culturales de los pueblos y nacionalidades del país, entre ellas prácticas culinarias ancestrales y saberes sobre plantas medicinales.

Instituto Nacional de Investigación en Salud Pública

- 49 publicaciones científicas generadas por técnicos e investigadores del Instituto Nacional de Investigación en Salud Pública, basadas en los resultados de sus líneas de investigación.
- 72 ponencias y/o posters científicos presentados en eventos nacionales e internacionales, con aval académico de universidades y entidades públicas o privadas, evidenciando la activa participación del Instituto Nacional de Investigación en Salud Pública en la difusión del conocimiento científico.

Universidad de las Fuerzas Armadas

- 2 proyectos aprobados con financiamiento indirecto enfocados en: la ejecución de un estudio de eficiencia energética asistida por inteligencia artificial y marketing social; y rendimiento operacional y bienestar psicológico del personal militar expuestos a situaciones de alto riesgo, desarrollado en la Universidad de las Fuerzas Armadas ESPE.
- 228 investigadores activos fueron registrados en la entidad.
- 89 postulantes participaron en el Proyecto de Preincubación de Negocios en el marco del fortalecimiento del emprendimiento universitario.

Universidad Laica Eloy Alfaro de Manabí

- 2.238 estudiantes graduados al primer semestre 2025, distribuidos en: 1.947 graduados de tercer nivel y 291 de nivel técnico superior.
- 27.206 estudiantes matriculados en total (11.671 hombres y 15.535 mujeres), que frente a lo programado corresponde un crecimiento de 6.81%.
- 474 maestrantes matriculados en 12 programas de maestrías ejecutados en la sede Matriz Manta y Extensiones. Del total, 300 son mujeres (63%) y 174 hombres (37%).
- 218 publicaciones fueron generadas, distribuidas en: 35 de impacto mundial, 150 de impacto regional, 18 libros y 15 capítulos de libros.



Escuela Superior Politécnica del Chimborazo

- 894 becas y ayudas económicas adjudicadas, con una inversión total de USD 357.780,00, en beneficio de estudiantes de la institución.
- 130 artículos científicos de alto impacto, 134 regionales y 8 libros publicados, fortaleciendo la producción científica institucional y la participación en congresos académicos.

Universidad Nacional de Loja

- 3 nuevos programas de maestría ofertados en primeras cohortes: Derecho Constitucional con mención en Derecho Procesal Constitucional, Sanidad Vegetal, y Contabilidad y Auditoría con mención en Auditoría Interna, alineados a las demandas del entorno laboral y científico del país.
- 150 productos científicos generados, entre artículos, libros y capítulos de libros, lo que permitió alcanzar un índice institucional de producción académica per cápita del 0,21 %.
- 19 proyectos de vinculación ejecutados, en coordinación con organizaciones, comunidades e instituciones, beneficiando a aproximadamente 25.434 personas en la zona 7.
- 30 eventos de Educación Continúa desarrollados, en distintas áreas disciplinares, con un alcance de 2.479 personas a través de cursos y talleres.

Universidad Técnica de Manabí

- 37 nuevos grupos de investigación activos, lo que ha contribuido al incremento de publicaciones científicas y al fortalecimiento institucional en I+D+i.
- 50 publicaciones científicas en revistas Q1 con factor de impacto SJR, de acuerdo con datos de la fuente Scival.
- 152 publicaciones en SCOPUS, lo que representa un 44% del total de publicaciones (344) en todas las bases de datos, resultado del aumento de publicaciones Regionales como parte de las modalidades de titulación de tercer y cuarto nivel.
- 11 proyectos de investigación integrales (Docencia + Investigación + Vinculación) cofinanciados con sectores externos, además de la participación en convocatorias nacionales e internacionales y gestiones con organismos interinstitucionales, con miras al registro de nuevos proyectos en el segundo semestre.

Universidad Estatal de Milagro

- 2 proyectos de investigación multidisciplinarios, estos proyectos promueven la articulación entre facultades y buscan soluciones a problemáticas locales y regionales, contribuyendo a la transferencia de conocimientos y al desarrollo científico.
- 117 artículos publicados en revistas indexadas de alto impacto en el primer semestre de 2025, alcanzando un total acumulado de 394 y superando la meta planificada de 273.
- 23 proyectos de vinculación multidisciplinarios mediante convocatorias internas lideradas por docentes y estudiantes, en colaboración con actores sociales del cantón Milagro y zonas aledañas.

Universidad de Guayaquil

- 12,18% de incremento en becas y programas a docentes.
- 57,55% de implementación de estrategias en el proceso de titulación.
- 2.095 producciones científicas publicadas.
- 469 proyectos de investigación fueron aceptados y aprobados por el Consejo Superior Universitario de la Universidad de Guayaquil.



- 137 proyectos de vinculación con la sociedad aprobados.

Universidad Técnica de Ambato

- 79 profesores fueron capacitados mediante un curso intersemestral sobre Docencia Universitaria Innovación y Tecnología Educativa con inteligencia artificial para la educación 4.0, en modalidad MOOC.
- 106 proyectos de prácticas de servicio comunitario ejecutados, con la participación de 1.177 estudiantes y con la asistencia técnica de 135 docentes. La intervención se realizó en coordinación con 83 entidades cooperantes, destacando la participación de Gobiernos Autónomos Descentralizados, el Gobierno Provincial de Tungurahua, asociaciones, fundaciones y unidades educativas.

Universidad Estatal de Bolívar

- 1.086 titulaciones fueron otorgadas, mediante procesos de titulación asistida y acompañamiento académico implementados en las facultades de la Universidad Estatal de Bolívar.
- 16.929 estudiantes registrados, mediante campañas de admisión y procesos de nivelación ejecutados en todas las facultades de la Universidad Estatal de Bolívar.

Universidad Estatal Amazónica

- 7.757 estudiantes matriculados para presencialidad y 5.465 estudiantes matriculados en carreras en línea.
- 150 publicaciones por los grupos de investigación y los programas institucionales de publicación distribuidos en 137 artículos científicos, 8 libros y 5 capítulos de libro.

Universidad Estatal Península de Santa

- 20 publicaciones en revistas que corresponden a 4 artículos científicos de impacto regional y 16 artículos registrados por profesores titulares.
- 11 proyectos de vinculación aprobados por parte del Consejo Superior, que han beneficiado a 139.210 personas.

7.2.3. Avance Físico Proyectos de Inversión

El Objetivo 2 cuenta con 201 proyectos de inversión ejecutados por 34 entidades. El monto codificado total asciende a USD 244,84 millones, con un devengado de USD 45,68 millones, lo que representa una ejecución presupuestaria del 18,66%. Considerando anticipos, la ejecución asciende al 20,33%, con un monto devengado más anticipo de USD 49,77 millones frente al codificado con fuente.

El Ministerio de Educación, la Secretaría Nacional de Educación Superior Ciencia Tecnología e Innovación, La Escuela Superior Politécnica del Chimborazo, la Universidad Estatal Amazónica, La Universidad de las Fuerzas Armadas – ESPE, el Ministerio del Deporte, la Universidad Técnica Estatal de Quevedo, la Universidad Nacional de Chimborazo, la Universidad Nacional de Loja, la Universidad Laica Eloy Alfaro de Manabí y la Universidad Técnica de Cotopaxi concentran el 78,05% del presupuesto codificado (USD 191,10 millones) y ejecutan el 45.27% de los proyectos (91 de 201).

En cuanto al avance físico, este objetivo registra un cumplimiento del 21,31% respecto de las metas anuales programadas, con un nivel promedio de cumplimiento del 83,02% al segundo trimestre, lo

que indica un “*avance menor al esperado*”. Destacan las entidades como la Escuela Politécnica Nacional, el Instituto Nacional de Evaluación Educativa, la Universidad de las Artes y la Universidad Intercultural de las Nacionalidades y Pueblos Indígenas Amawtay Wasi, quienes registran la totalidad de sus proyectos que alcanzaron el 100,00% de cumplimiento de sus metas físicas programadas en este objetivo.

Ilustración 28. Gasto No Permanente, avance físico promedio y avance presupuestario- Objetivo 2



Fuente: SIPeIP, SNP. e-SIGEF, MEF– Ejecución Presupuestaria. Corte 30 de junio 2025.
Elaboración: Dirección de Seguimiento a la Inversión – SNP.

A continuación, se detalla el cumplimiento físico de los proyectos de inversión por gabinetes sectoriales relacionados con el Objetivo 2, lo que permite identificar los niveles de ejecución alcanzados por cada sector en relación con las metas físicas programadas.

Tabla 23. Cumplimiento físico por gabinete – Objetivo 2

Gabinete Sectorial	Número de Entidades	Número de Proyectos	Número de proyectos por nivel de cumplimiento			
			●	●	●	●
Social	6	30	6	0	4	20
Sin Gabinete	28	171	69	2	25	75
Total	34	201	75	2	29	95

Nota: ● Avance esperado ≥ 95% y < 100% / ● Avance cercano al esperado ≥ 85% y < 95% / ● Avance menor al esperado < 85% / ● Proyecto sin programación de metas.

Fuente: SIPeIP - SNP. e-SIGEF - MEF- Ejecución Presupuestaria. Corte 30 de junio de 2025.
Elaboración: Dirección de Seguimiento a la Inversión – SNP.

Para conocer más información acerca de las entidades, por favor revisar el Anexo 2, que contiene la matriz resumen con información de avance presupuestario y físico.

A continuación, se presenta la información de ejecución de los principales proyectos de inversión que contribuyen a este objetivo:

Causas y Logros

Ministerio de Educación

El Ministerio de Educación registró, en el marco del Objetivo 2, un monto codificado de inversión de USD 57,57 millones y un devengado de USD 9,34 millones, lo que representa una ejecución presupuestaria del 16,23%. Al considerar el devengado más anticipos en relación con el codificado



con fuente, la ejecución alcanza el 19,16%. Asimismo, se identifican 14 proyectos alineados a este objetivo; sin embargo, solo 3 proyectos cuentan con programación de metas físicas al segundo trimestre de 2025. No obstante, todos los proyectos presentan ejecución presupuestaria.

Tabla 24. Avance Físico de Proyectos de Inversión al Segundo Trimestre Ministerio de Educación – Objetivo 2

Nombre del proyecto	Programación metas físicas (a)	Ejecución metas físicas (b)	Cumplimiento metas físicas c(b/a)	Codificado (MM USD) (d)	Devengado (MM USD) (e)	Ejecución presupuestaria 2025 f (d/e)	Devengado + anticipos /codificado con fuente (g)
Adecuaciones Emergentes en Instituciones Educativas	0,00%	0,00%	● 0,00%	0,14	0,06	42,91%	42,91%
Culminación y Construcción de Infraestructura Educativa - Fase I	0,00%	0,00%	● 0,00%	7,72	1,63	21,13%	21,13%
Formar para Transformar	19,44%	11,67%	● 60,03%	3,46	0,17	4,92%	4,92%
Inclusión Universal para el Aprendizaje	0,00%	0,00%	● 0,00%	0,61	0,16	26,29%	26,29%
Infraestructura Educativa recuperada	0,00%	0,00%	● 0,00%	0,11	0,00	0,00%	0,00%
Nueva Infraestructura Educativa	0,00%	0,00%	● 0,00%	1,26	0,44	34,81%	34,81%
Prevención y Abordaje de Riesgos Psicosociales en el Entorno Educativo	0,00%	0,00%	● 0,00%	0,17	0,07	38,17%	38,17%
Proyecto emergente de las Unidades Educativas del Milenio y establecimientos anexos	0,00%	0,00%	● 0,00%	1,65	0,00	0,00%	0,00%
Red de Ambientes de Lectura en Instituciones Educativas Rurales	0,00%	0,00%	● 0,00%	0,03	0,01	36,17%	36,17%
Reducción de la Brecha Digital en el Sistema Nacional de Educación	14,24%	14,24%	● 100,00%	8,42	4,06	48,23%	48,23%
Reestructuración Integral de Infraestructura Educativa	0,00%	0,00%	● 0,00%	30,24	2,35	7,78%	13,36%
Reforma Integral al Bachillerato	0,00%	0,00%	● 0,00%	3,45	0,08	2,35%	2,35%
Reliquidación de jubilaciones de docentes por aplicación de la Ley Interpretativa de la Disposición General Novena de la Ley Orgánica de Educación Intercultural – MINEDUC	0,49%	0,49%	● 100,00%	0,31	0,31	99,64%	99,64%
Transformación educativa de Educación Inicial	0,00%	0,00%	● 0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00%
Total							19,16%

Nota: ● Avance esperado ≥ 95% y < 100% / ● Avance cercano al esperado ≥ 85% y < 95% / ● Avance menor al esperado < 85% / ● Proyecto sin programación de metas.

Fuente: SIPeIP - SNP. e-SIGEF - MEF- Ejecución Presupuestaria. Corte 30 de junio de 2025.

Elaboración: Dirección de Seguimiento a la Inversión – SNP.

El Ministerio de Educación reporta las siguientes acciones:

Proyecto Reducción de la Brecha Digital en el Sistema Nacional de Educación

Al segundo trimestre de 2025, el proyecto registra un monto codificado de USD 8,42 millones y una ejecución presupuestaria acumulada del 48,23%. Entre los principales avances reportados por la entidad constan: la adquisición de 1.670 laptops, y la instalación de 1.000 puntos de conectividad en instituciones educativas uni, bi y pluridocentes priorizadas.

La entidad reporta que las causas que han limitado el avance del proyecto son la espera por la disposición de las fuentes de financiamiento del Banco de Desarrollo de América Latina y el Caribe y del Banco Interamericano de Desarrollo, la necesidad de reformular las metas de los componentes 1, 3 y 4, que se encuentran en revisión con la SNP, así como la falta de disponibilidad de infraestructura física en los laboratorios de las instituciones educativas para la implementación del componente 4. Se recomienda gestionar oportunamente el financiamiento, la revisión de metas y la habilitación de la infraestructura requerida.



Proyecto Reliquidación de jubilaciones de docentes por aplicación de la Ley Interpretativa de la Disposición General Novena de la Ley Orgánica de Educación Intercultural – MINEDUC

Al segundo trimestre de 2025, el proyecto registra un monto codificado de USD 0,31 millones y una ejecución presupuestaria acumulada del 99,64%. Como principal avance, la entidad reporta: la realización del proceso de arrastre correspondiente al pago para 22 docentes.

La entidad reporta que la causa de que el pago no se ejecute en los plazos previstos es la dependencia de la disponibilidad presupuestaria emitida por el MEF. Se recomienda fortalecer la coordinación interinstitucional para asegurar la asignación oportuna de los recursos y garantizar el cumplimiento de los plazos establecidos.

Secretaría Nacional de Educación Superior Ciencia Tecnología e Innovación

Al segundo trimestre de 2025, la Secretaría Nacional de Educación Superior, Ciencia, Tecnología e Innovación registra un monto codificado de inversión de USD 31,27 millones y una ejecución presupuestaria acumulada del 23,43%. La entidad reporta la presentación de 8 proyectos alineados al Objetivo 2, de los cuales solo 2 cuentan con programación de metas físicas al segundo trimestre de 2025.

Tabla 25. Avance Físico de Proyectos de Inversión al Segundo Trimestre Secretaría Nacional de Educación Superior Ciencia Tecnología e Innovación – Objetivo 2

Nombre del proyecto	Programación metas físicas (a)	Ejecución metas físicas (b)	Cumplimiento metas físicas c(b/a)	Codificado (MM USD) (d)	Devengado (MM USD) (e)	Ejecución presupuestaria 2025 f (d/e)	Devengado + anticipos /codificado con fuente (g)
Fortalecimiento de la educación superior universitaria, técnica y tecnológica en la Región Amazónica con criterios de inclusión, calidad y pertinencia	0,00%	0,00%	● 0,00%	1,80	0,00	0,00%	0,00%
Fortalecimiento del Conocimiento y Talento Humano	0,00%	0,00%	● 0,00%	3,89	1,08	27,88%	27,88%
Proyecto Ciudad del Conocimiento	0,00%	0,00%	● 0,00%	0,24	0,00	0,00%	0,00%
Proyecto de Inversión para el Desarrollo de Actividades de Ciencia, Tecnología e Innovación	20,01%	6,67%	● 33,33%	1,60	1,49	92,94%	92,94%
Proyecto de Oportunidades para el Desarrollo y Fortalecimiento del Talento Humano	1,23%	3,77%	● 100,00%	13,84	4,32	31,22%	31,22%
Reconversión de la Educación Técnica y Tecnológica Superior Pública del Ecuador	0,00%	0,00%	● 0,00%	9,78	0,41	4,23%	4,23%
Sistema Ecuatoriano de Acceso a la Educación Superior	0,00%	0,00%	● 0,00%	0,11	0,02	22,11%	22,11%
Sistema Nacional de Nivelación y Admisión	0,00%	0,00%	● 0,00%	0,01	0,00	0,00%	0,00%
Total							23,43%

Nota: ● Avance esperado ≥ 95% y < 100% / □ Avance cercano al esperado ≥ 85% y < 95% / ● Avance menor al esperado < 85% / ● Proyecto sin programación de metas.

Fuente: SiPeIP - SNP. e-SIGEF - MEF- Ejecución Presupuestaria. Corte 30 de junio de 2025.

Elaboración: Dirección de Seguimiento a la Inversión – SNP.

La Secretaría Nacional de Educación Superior, Ciencia, Tecnología e Innovación reporta las siguientes acciones:

Proyecto de Oportunidades para el Desarrollo y Fortalecimiento del Talento Humano

Al segundo trimestre de 2025, el proyecto registra un monto codificado de USD 13,84 millones y una ejecución presupuestaria acumulada del 31,22%. Entre los principales logros reportados por la entidad se encuentra: la recaudación de al menos el 10% del capital adeudado, en cumplimiento de la Disposición Transitoria Cuarta de la Ley Orgánica de Educación Superior del Ecuador (LOEEGE), lo cual incrementó el monto recaudado durante el primer trimestre del año.

La entidad reporta que la causa de que la planificación permanezca pendiente es que el proyecto aún se encuentra en ejecución de becas de arrastre. Adicionalmente, la cartera vencida continúa sujeta a dos procesos de plazo de gracia y remisión establecidos en las leyes económicas urgentes. Se recomienda agilizar la planificación y definir estrategias para gestionar la cartera vencida, con el fin de habilitar la programación y cumplimiento de nuevas metas físicas.



7.3. OBJETIVO 3: Garantizar la seguridad integral, la paz ciudadana y transformar el sistema de justicia respetando los derechos humanos.


Este Objetivo busca garantizar la seguridad integral, la paz ciudadana y transformar el sistema de justicia respetando los derechos humanos. A partir de este se promueve la construcción de una sociedad pacífica e inclusiva y libre de violencia que protege la vida de los ciudadanos. Adicionalmente, construye políticas de seguridad integrales que atacan todas las aristas de la violencia y garantizan el derecho de la ciudadanía a vivir en un entorno de paz.

Con base en la gestión desarrollada por el Estado a través de la implementación de sus planes institucionales, estudios, programas y proyectos durante el segundo trimestre del 2025, a continuación, se detallan los resultados alineados a este Objetivo:

7.3.1. Gestión Presupuestaria

Para el cumplimiento de las metas del Objetivo 3, se devengó un total de USD 1.742,97 millones en el segundo trimestre del 2025, de los cuales, el 97,56% corresponde a **Gasto Permanente** con un monto devengado de USD 1.700,45 millones; y, la diferencia corresponde al **Gasto No Permanente** vinculado a estudios, programas y proyectos de inversión, de diferentes entidades, con un monto devengado de USD 42,52 millones.

Ilustración 29. Gasto Permanente y No Permanente en 2025 – Objetivo 3 (millones de dólares)

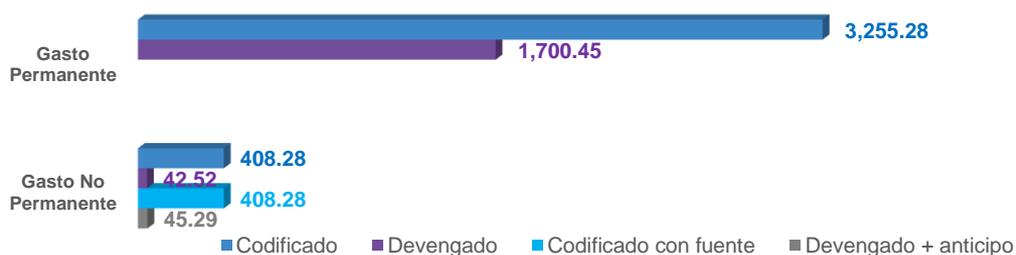

Fuente: SIPeIP, SNP. e-SIGEF, MEF- Ejecución Presupuestaria. Corte 30 de junio de 2025.

Elaboración: Dirección de Seguimiento a la Planificación y Política Pública y Dirección de Seguimiento a la Inversión –SNP.

Por su parte, la ejecución presupuestaria del **Gasto No Permanente** destinado al Objetivo 3, considerando el monto devengado más anticipos entregados en el periodo (USD 45,29 millones), frente al monto codificado con fuente de financiamiento (USD 408,28 millones), alcanza un nivel de ejecución del 11,09%.

Ilustración 30. Ejecución: Devengado más anticipos en relación al codificado con fuente – Objetivo 3 (millones de dólares)




Fuente: SIPeIP -SNP, e-SIGEF - MEF- Ejecución Presupuestaria. Corte 30 de junio de 2025.
Elaboración: Dirección de Seguimiento a la Inversión – SNP.

A continuación, se detallan los montos correspondientes al **Gasto Permanente** y **Gasto No Permanente** que fueron ejecutados, alineados al Objetivo 3, en función de los gabinetes sectoriales establecidos para la gestión institucional.

En **Gasto Permanente**, el Gabinete Sectorial de Seguridad es el que más recursos ejecutó en este Objetivo con un monto devengado de USD 1.479,88 millones, conforme la siguiente ilustración:

Ilustración 31. Gasto Permanente por Gabinete Sectorial en 2025 – Objetivo 3 (millones de dólares)

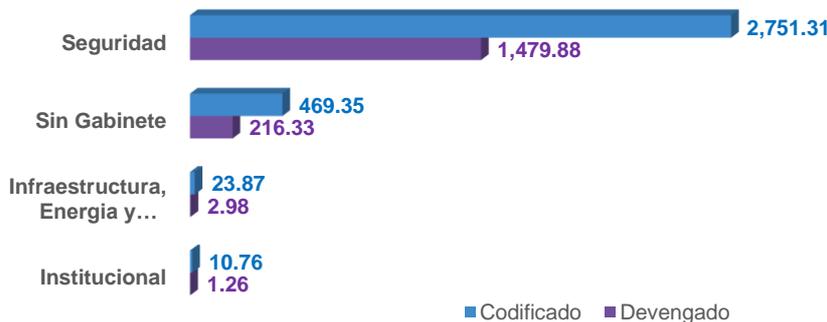

Fuente: Base de datos e-SIGEF, Ejecución Presupuestaria Consolidada – MEF corte al 30 de junio de 2025. Base de alineación al PND segundo trimestre 2025 – SNP, corte 30 de junio de 2025.
Elaboración: Dirección de Seguimiento a la Planificación y Política Pública – SNP.

En relación al **Gasto Permanente** alineado al Objetivo 3, se identifica que se encuentran alineadas 16 entidades, con un presupuesto codificado de USD 3.255,28 millones y un monto devengado de USD 1.700,45 millones, lo que representa una ejecución presupuestaria del 52,24%. A continuación, se detalla la ejecución presupuestaria correspondiente al segundo trimestre por institución:

Tabla 26. Ejecución presupuestaria de las entidades alineadas al Objetivo 3

Gabinete Sectorial	Entidad	Codificado (MM USD)	Devengado (MM USD)	Ejecución (%)
Gabinete Sectorial de Infraestructura, Energía y Medio Ambiente	Agencia de Regulación y Control de las Telecomunicaciones	23,87	2,98	12,48%
Gabinete Sectorial de Seguridad	Instituto Geográfico Militar	27,02	13,42	49,66%
	Ministerio de Defensa Nacional	1.264,44	682,55	53,98%
	Ministerio de Gobierno	0,78	0,11	14,56%
	Policía Nacional	1.351,48	732,18	54,18%
	Servicio Integrado de Seguridad Ecu 911	18,69	8,41	45,01%

Gabinete Sectorial	Entidad	Codificado (MM USD)	Devengado (MM USD)	Ejecución (%)
	Servicio Nacional de Atención Integral a Personas Adultas Privadas de la Libertad y a Adolescentes Infractores	88,90	43,21	48,60%
Gabinete Sectorial Institucional	Ministerio de Relaciones Exteriores y Movilidad Humana	10,76	1,26	11,68%
Sin Gabinete	Casa Militar Presidencial	9,99	4,65	46,59%
	Consejo de Desarrollo y Promoción de la Información y Comunicación	1,23	0,55	44,83%
	Consejo de la Judicatura	312,76	143,33	45,83%
	Consejo Nacional para la Igualdad de Género	0,26	0,12	45,50%
	Consejo Nacional para la Igualdad de Movilidad Humana	0,28	0,15	53,71%
	Defensoría Pública	28,01	13,05	46,59%
	Fiscalía General del Estado	115,03	53,65	46,64%
	Unidad de Análisis Financiero y Económico	1,79	0,83	46,48%
Total		3.255,28	1.700,45	52,24%


Fuente: SNP, SIPeIP corte 30 de junio de 2025. e-SIGEF –MEF- Ejecución Presupuestaria, se excluye el sectorial Tesoro Nacional, que son entidades virtuales manejadas por MEF, corte 30 de junio de 2025.

Elaboración: Dirección de Seguimiento a la Planificación y Política Pública – SNP.

El objetivo 3 relacionado con la seguridad integral, la paz ciudadana y sistema de justicia, presenta a las instituciones Policía Nacional y Ministerio de Defensa Nacional que concentran el 80,36% del codificado del objetivo, cuyos niveles de ejecución presupuestaria son 54,18% y 53.98% respectivamente.

Por su parte, en lo que respecta al **Gasto No Permanente**, las entidades que conforman el Gabinete Sectorial de Seguridad ejecutaron USD 41,11 millones, mientras que las entidades sin Gabinete alineados al Objetivo 3 ejecutaron USD 1,41 millones.

Ilustración 32. Gasto No Permanente por Gabinete Sectorial en 2025 (segundo trimestre) – Objetivo 3 (millones de dólares)

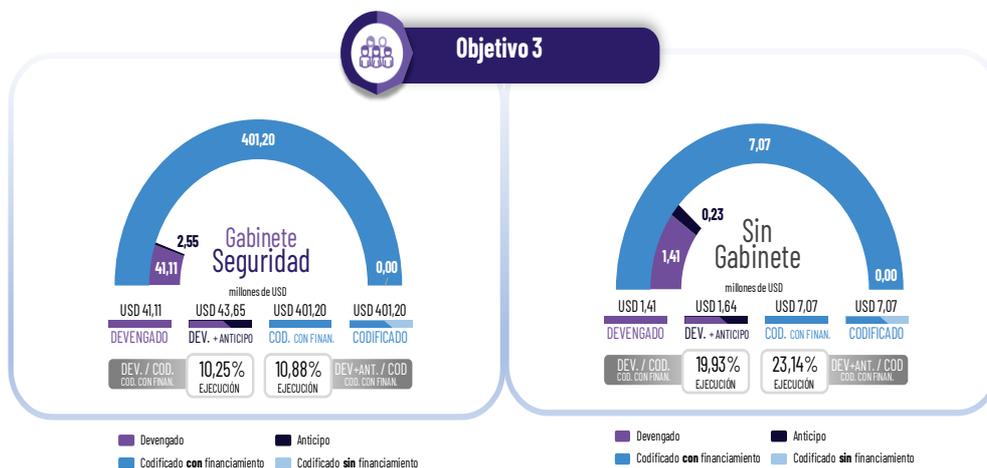

Fuente: SIPeIP, SNP. e-SIGEF, MEF- Ejecución Presupuestaria. Corte 30 de junio de 2025.

Elaboración: Dirección de Seguimiento a la Inversión – SNP.

En este sentido, se evidencia que las entidades del Gabinete Sectorial de Seguridad presentan la mayor ejecución presupuestaria en el Objetivo 3, alcanzando un 10,88%, correspondiente a 30 proyectos de inversión. Mientras que las entidades Sin Gabinete presentan una ejecución de 16,06% correspondiente a 171 proyectos de inversión.

Tabla 27. Cumplimiento presupuestario por gabinete sectorial en 2025 – Objetivo 3

Gabinete Sectorial	Número de Entidades	Número de Proyectos	% Ejecución presupuestaria	
			Devengado / Codificado	Devengado más anticipos / Codificado con fuente
Seguridad	6	23	10,25%	10,88%
Sin Gabinete	3	6	19,93%	23,14%
Total	9	29		

Fuente: SIPeIP - SNP. e-SIGEF – MEF– Ejecución Presupuestaria. Corte 30 de junio de 2025.

Elaboración: Dirección de Seguimiento a la Inversión – SNP.

Para obtener información detallada sobre las entidades, se recomienda revisar el Anexo 2, que contiene la matriz resumen con datos sobre el avance presupuestario y físico.

7.3.2. Avance Físico de la Planificación Institucional

Las 14 entidades que cumplieron con el proceso de registro y sistematización de su planificación institucional y cuentan con indicadores alineados al objetivo 3, sujetos a seguimiento (mensuales, trimestrales y semestrales), registran 40 objetivos institucionales y 70 indicadores estratégicos. Así, se identifica que, el 72,86% presentan un avance esperado, el 1,43% presenta un avance cercano al esperado, el 25,71% presenta un avance menor al esperado, conforme el detalle que se establece a continuación:

Tabla 28. Ejecución Indicadores Institucionales – Objetivo 3

Entidad	Número Indicadores	Avance esperado 		Avance cercano al esperado 		Avance menor a lo esperado 	
		Indicadores	%	Indicadores	%	Indicadores	%
Agencia de Regulación y Control de las Telecomunicaciones	4	4	100,00%	0	0,00%	0	0,00%
Centro de Inteligencia Estratégica	1	1	100,00%	0	0,00%	0	0,00%
Consejo de Gobierno del Régimen Especial de Galápagos	1	1	100,00%	0	0,00%	0	0,00%
Consejo de Desarrollo y Promoción de la Información Y Comunicación	2	2	100,00%	0	0,00%	0	0,00%
Consejo Nacional para la Igualdad de Género	4	4	100,00%	0	0,00%	0	0,00%
Consejo Nacional para la Igualdad de Movilidad Humana	1	1	100,00%	0	0,00%	0	0,00%
Defensoría Pública	4	2	50,00%	0	0,00%	2	50,00%
ECU 911 - Servicio Integrado de Seguridad	9	9	100,00%	0	0,00%	0	0,00%
Instituto Geográfico Militar	4	4	100,00%	0	0,00%	0	0,00%
Ministerio de Defensa Nacional	5	2	40,00%	0	0,00%	3	60,00%
Policía Nacional	16	10	62,50%	1	6,25%	5	31,25%
Servicio Nacional de Atención Integral a Personas Adultas Privadas de la Libertad y a Adolescentes Infractores	11	3	27,27%	0	0,00%	8	72,73%
Servicio Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses	3	3	100,00%	0	0,00%	0	0,00%
Unidad de Análisis Financiero Y Económico	5	5	100,00%	0	0,00%	0	0,00%
Total	70	51	72,86%	1	1,43%	18	25,71%

Fuente: SNP, SIPeIP corte 30 de junio de 2025. GPR corte 30 de junio de 2025.

Elaboración: Dirección de Seguimiento a la Planificación y Política Pública – SNP.

Principales Logros

Agencia de Regulación y Control de las Telecomunicaciones

- 2 normativas de regulación emitidas, para normar el servicio de videovigilancia gestionado por GADs en coordinación con el ECU-911 y la habilitación de la banda “S” para radiolocalización de uso reservado del Ministerio de Defensa.
- 8 acciones de seguimiento implementadas sobre la prestación de servicios de telecomunicaciones, mediante controles del espectro radioeléctrico en todo el país.

Ministerio de Telecomunicaciones y de la Sociedad de la Información

- Curso virtual EGSI V3 habilitado, dirigido a Oficiales de Seguridad de la Información, entre abril y junio de 2025.
- 141 requerimientos atendidos mediante socializaciones, asesorías y asistencia técnica en distintos canales, registrados en la bitácora institucional.

Servicio Integrado de Seguridad ECU 911

- 96,78 % de disponibilidad operativa de la plataforma tecnológica, incluyendo un 99,86 % en disponibilidad de llamadas, 68 % en videovigilancia y 99,51 % en smartphone, permitiendo atender 2'344.928 alertas vía llamadas y 1.943 alertas mediante smartphones a nivel nacional.
- 122 segundos de tiempo promedio de atención a emergencias por violencia intrafamiliar, con coordinación de 17.453 casos a nivel nacional.
- 123 segundos de tiempo promedio de atención general a emergencias, permitiendo la coordinación de 812.770 alertas a nivel nacional.
- 91,63 % de satisfacción del usuario externo, evaluado mediante la aplicación de 7.316 encuestas, lo cual respalda la mejora continua de la atención.
- 1.380 personas capacitadas de las áreas operativas y administrativas del ECU 911 y de instituciones articuladas, a través de su plataforma virtual a nivel nacional para fortalecer la atención de emergencias.
- 7 propuestas de coordinación interinstitucional ejecutadas en el ámbito nacional e internacional, orientadas a fortalecer la operatividad del servicio.

Centro de Inteligencia Estratégica

- 23.671 productos de inteligencia estratégica y contrainteligencia elaborados y difundidos, contribuyendo a la generación de alertas para la toma de decisiones político-estratégicas orientadas a la seguridad y desarrollo nacional.

Servicio Nacional de Atención Integral a Personas Adultas Privadas de la Libertad y Adolescentes Infractores

- Avances en el Plan Permanente de Pacificación y sostenibilidad de la paz, mediante capacitación y profesionalización de agentes penitenciarios, atención a las bandas de crimen organizado, e implementación de indultos humanitarios para reducir el hacinamiento.
- 31 alertas de seguridad registradas en Centros de Privación de Libertad, asociadas a condiciones estructurales y operativas, lo cual activó protocolos de intervención y traslados.
- 2.665 servidores penitenciarios equipados con uniformes y chalecos de protección balística, fortaleciendo su capacidad operativa en los centros penitenciarios.



Consejo Nacional para la Igualdad de Género

- 7 insumos técnicos generados y 10 diálogos realizados con organizaciones de mujeres y personas LGBTI+ en las zonas 1, 3, 4, 5 y 6, como parte del proceso de construcción de la Agenda Nacional para la Igualdad de Género 2025–2029.
- 1 documento estratégico elaborado sobre información de género y avance de investigación sobre seguridad ciudadana y género, además del mapeo de un compendio estadístico cantonal para el diseño de agendas locales.
- 100,00 % de atención a casos de amenaza o violación de derechos de mujeres y personas LGBTI+, conforme al Reglamento de Observancia, a nivel nacional.
- 9 informes técnicos elaborados sobre el cumplimiento de derechos humanos de mujeres y personas LGBTI+, con enfoque de situación de derechos a nivel nacional.

Consejo Nacional para la Igualdad de Movilidad Humana

- 41 entidades del nivel central, 94 Consejos Cantonales para Protección de Derechos y 47 GAD proporcionaron información relevante para el seguimiento a la Agenda Nacional para la Igualdad de Movilidad Humana 2021 – 2025.

Unidad de Análisis Financiero y Económico

- 2 convenios de cooperación fueron suscritos en materia de prevención, detección y erradicación del lavado de activo y del financiamiento de delitos con Global Financial Integrity y con el Ministerio de Defensa Nacional.
- 13.266 personas participaron en capacitaciones presenciales y virtuales (mediante plataformas como CISCO Webex y el Campus Virtual Unidad de Análisis Financiero y Económico en temas de prevención de lavado de activos y financiamiento de delitos.
- 1.024 informes ejecutivos fueron elaborados por requerimiento de la Fiscalía General del Estado.

Policía Nacional

- 52% de afectaciones a estructuras de delincuencia organizada, presentando un avance conforme a la meta programada del 50% con la ejecución de acciones operativas calificadas, direccionadas a la afectación de estructuras de delincuencia organizada, dirigidas especialmente a organizaciones como Los Lobos, Los Lobos Espejo, Lagartos, Choneros y Chone Killer, este resultado se fortaleció mediante procesos de estudio y caracterización de indicios periciados para establecer trazabilidad y conexión entre evidencias y redes criminales, el fortalecimiento de mesas de trabajo con la Fiscalía General del Estado y el Consejo de la Judicatura, así como la generación de nuevas alianzas con organismos nacionales e internacionales para combatir la delincuencia organizada, el narcotráfico, la minería ilegal y otros delitos que inciden en la violencia a nivel nacional.

Servicio Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses

- 45.572 pericias fueron desarrolladas en los ámbitos de Ciencias Forenses y Medicina Legal, conjuntamente entre el Servicio Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses, y la Dirección Nacional de Investigación Técnico Científica Policial, alcanzando un acumulado de 89.917 pericias al cierre del segundo trimestre del año.
- 2 instrumentos de normalización forense fueron aprobados por el Comité Directivo del Órgano de Gobierno del Sistema Especializado Integral de Investigación, Medicina Legal y Ciencias



Forenses, con fecha 3 de abril de 2025: el “*Reglamento para Regular el proceso de Marcaciones y Remarcaciones de Sistemas de identificación de Vehículos Motorizados y No Motorizados*” y el “*Manual de procedimientos de laboratorio de Radiología Forense*”.

- Durante el primer y segundo trimestre del 2025 se ha avanzado en la ejecución del Plan de Desarrollo de Instrumentos de Normalización Forense, el cual contempla instrumentos metodológicos que se pondrán al servicio del Sistema Especializado Integral de Investigación, Medicina Legal y Ciencias Forenses, elaborados y validados por funcionarios de las instituciones que lo conforman.
- 7 comisiones técnicas activas: a) Subcomisión Técnica de Manejo de Indicios Percibibles, b) Comisión de Radiología, c) Comisión de Hidrocarburos, d) Comisión de Grabados y Marcaciones, e) Comisión de Incendios y Explosivos, f) Comisión de Evidencia Digital, y g) Comisión de Recursos Mineros, en el marco del Plan de Instrumentos de Normalización Forense.
- 7 eventos de capacitación fueron realizados en el primer semestre de 2025, capacitando a 391 personas con un total de 139 horas de formación en temas técnicos y periciales. Entre los temas abordados estuvieron: incumbencias periciales, manejo de químicos, cromatografía, toma de muestras en cadáveres, análisis de micro indicios con Microscopía Electrónica de Barrido y Espectroscopía de Energía Dispersiva de Rayos X, procedimientos tanatológicos y el Protocolo de Minnesota.

Instituto Geográfico Militar

- 19.789 beneficiarios asistieron a los servicios del Centro Cultural participando de recorridos guiados, eventos, capacitaciones, funciones astronómicas en Pichincha.
- 41,23% de cobertura nacional validada, incluyendo datos geoespaciales de 13 provincias a escala 1:25.000.
- 10 productos generados (8 mapas temáticos en 5 provincias, y 2 revisiones técnicas de GeoEduca).
- 7 pruebas técnicas ejecutadas para validar especificaciones de especies valoradas y documentos de seguridad a escala nacional.


7.3.3. Avance Físico Proyectos de Inversión

El Objetivo 3 cuenta con 29 proyectos de inversión ejecutados por 9 entidades. El monto codificado total asciende a USD 408,28 millones, con un devengado de USD 42,52 millones, lo que representa una ejecución presupuestaria del 10,41%. Considerando anticipos, la ejecución asciende al 11,09%, con un monto devengado más anticipo de USD 45,29 millones frente al codificado con fuente.

El Ministerio de Defensa Nacional y el Servicio Nacional de Atención Integral a Personas Adultas Privadas de la Libertad y a Adolescentes Infractores concentran el 80,12% del presupuesto codificado (USD 327,12 millones) y ejecutan el 55,17% de los proyectos (16 de 29).

En cuanto al avance físico, este objetivo registra un cumplimiento del 14,64% respecto de las metas anuales programadas, con un nivel promedio de cumplimiento del 61,66% al segundo trimestre, lo que indica un “*avance menor al esperado*”. Destacan las entidades como el Instituto Geográfico Militar y el Servicio Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses quienes registran la totalidad de sus proyectos que alcanzaron el 100,00% de cumplimiento de sus metas físicas programadas.

Ilustración 33. Gasto No Permanente, avance físico promedio y avance presupuestario- Objetivo 3

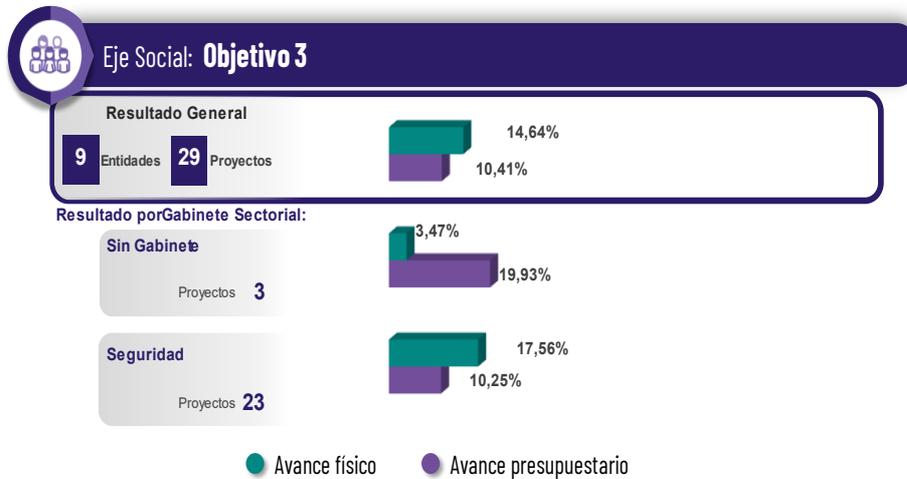

Fuente: SIPeIP, SNP. e-SIGEF, MEF- Ejecución Presupuestaria. Corte 30 de junio 2025.
Elaboración: Dirección de Seguimiento a la Inversión – SNP.

A continuación, se detalla el cumplimiento físico de los proyectos de inversión por gabinetes sectoriales relacionados con el Objetivo 3, lo que permite identificar los niveles de ejecución alcanzados por cada sector en relación con las metas físicas programadas.

Tabla 29. Cumplimiento físico por gabinete – Objetivo 3

Gabinete Sectorial	Número de Entidades	Número de Proyectos	Número de proyectos por nivel de cumplimiento			
			●	●	●	●
Seguridad	6	23	9	1	5	8
Sin Gabinete	3	6	0	0	4	2
Total	9	29	9	1	9	10

Nota: ● Avance esperado ≥ 95% y < 100% / ● Avance cercano al esperado ≥ 85% y < 95% / ● Avance menor al esperado < 85% / ● Proyecto sin programación de metas.

Fuente: SIPeIP, SNP. e-SIGEF, MEF- Ejecución Presupuestaria. Corte 30 de junio de 2025.
Elaboración: Dirección de Seguimiento a la Inversión – SNP.

Para conocer más información acerca de las entidades, por favor revisar el Anexo 2, que contiene la matriz resumen con información de avance presupuestario y físico.

A continuación, se presenta la información de ejecución de los principales proyectos de inversión que contribuyen a este objetivo:

Causas y Logros

Ministerio de Defensa Nacional

El Ministerio de Defensa Nacional contó, dentro del Objetivo 3, con un monto codificado de inversión de USD 253,65 millones y un monto devengado de USD 24,54 millones, lo que representa una ejecución presupuestaria del 9,68%. Al considerar el devengado más anticipos en relación con el codificado con fuente, la ejecución alcanza el 10,12%. Adicionalmente, se identifican 13 proyectos alineados a este objetivo, de los cuales 8 cuentan con programación de metas físicas al segundo trimestre de 2025. Entre ellos, 3 proyectos registran un cumplimiento físico del 100,00%.

Tabla 30. Avance Físico de Proyectos de Inversión al Segundo Trimestre Ministerio de Defensa Nacional – Objetivo 3

Nombre del proyecto	Programación metas físicas (a)	Ejecución metas físicas (b)	Cumplimiento metas físicas c(b/a)	Codificado (MM USD) (d)	Devengado (MM USD) (e)	Ejecución presupuestaria 2025 f (d/e)	Devengado + anticipos /codificado con fuente (g)
Adquisición de Aeronaves de Entrenamiento Básico para el Curso Unificado de Pilotos Militares de las Fuerzas Armadas en la Escuela Superior Militar de Aviación Cosme Rennella Barbatto	0,00%	0,00%	● 0,00%	6,28	0,00	0,00%	0,00%
Adquisición de material y equipo para el control de disturbios y motines	25,00%	8,50%	● 34,00%	6,35	0,98	15,37%	15,37%
Adquisición De Unidades Guardacostas	0,00%	0,00%	● 0,00%	2,50	0,00	0,00%	0,00%
Fortalecimiento de las Capacidades del Sistema de Vigilancia, Alarma Y control del Espacio Aéreo Nacional (Radares)	0,00%	0,00%	● 0,00%	0,75	0,00	0,00%	0,00%
Implementación de la Brigada de Caballería Mecanizada No 3 Manabí	0,55%	0,55%	● 100,00%	19,39	15,95	82,25%	82,25%
Incrementar la Capacidad de Ciberdefensa en FFAA	0,00%	0,00%	● 0,00%	2,32	2,32	100,00%	100,00%
Incrementar la Capacidad Operativa del Sistema de Vigilancia, Alarma y Control del Espacio Aéreo Nacional	15,00%	7,19%	● 47,93%	15,27	0,00	0,02%	0,02%
Liberación de Tierras Polucionadas por las Minas Terrestres O Artefactos Explosivos en Estado de Riesgo Conocidos Hasta el Momento en la Frontera Común Entre Ecuador y Perú	5,4%	1,03%	● 19,07%	1,24	0,07	5,86%	5,86%
Proyecto de Fortalecimiento, Implementación y Optimización del Subsistema de Inteligencia Militar	0,57%	0,00%	● 0,00%	4,49	0,00	0,00%	0,00%
Recuperación de la Capacidad Operativa de la Aviación de la Fuerza Aérea Ecuatoriana	0,29%	0,00%	● 0,00%	32,74	1,82	5,56%	5,56%
Recuperación de la Capacidad Operativa de la Fuerza Terrestre para el Control Efectivo del Territorio Nacional y Zonas de Seguridad del Estado	6,61%	6,61%	● 100,00%	101,77	3,39	3,34%	4,45%
Recuperación y Fortalecimiento de las Capacidades Oceánicas de la Armada	4,02%	7,43%	● 100,00%	30,07	0,00	0,00%	0,00%
Renovación de la Infraestructura de Seguridad de los Espacios Marítimos	0,00%	0,00%	● 0,00%	30,48	0,00	0,00%	0,00%
Total							10,12%

Nota: ● Avance esperado $\geq 95\%$ y $< 100\%$ / ● Avance cercano al esperado $\geq 85\%$ y $< 95\%$ / ● Avance menor al esperado $< 85\%$ / ● Proyecto sin programación de metas.

Fuente: SIPeIP - SNP. e-SIGEF - MEF- Ejecución Presupuestaria. Corte 30 de junio de 2025.

Elaboración: Dirección de Seguimiento a la Inversión – SNP.

El Ministerio de Defensa reporta las siguientes acciones:

Proyecto Implementación de la Brigada de Caballería Mecanizada No 3 "Manabí"

Al segundo trimestre de 2025, el proyecto registra un monto codificado de USD 19,39 millones y una ejecución presupuestaria acumulada del 82,25%. Entre los principales logros reportados por la entidad se encuentra: a nivel físico, alcanzó un cumplimiento del 100,00% respecto a las metas programadas, destacando la recepción de los vehículos mecanizados previstos.

Proyecto Recuperación de la Capacidad Operativa de la Fuerza Terrestre para el Control Efectivo del Territorio Nacional y Zonas de Seguridad del Estado

Al segundo trimestre de 2025, el proyecto registra un monto codificado de USD 101,77 y una ejecución presupuestaria acumulada al considerar anticipos del 4,45%. Entre los principales logros reportados por la entidad se encuentra: se realizó el contrato modificadorio de helicópteros, el MEF realizó el pago de los anticipos para la adquisición de prendas de intendencia y equipamiento de búsqueda y rescate.

Proyecto Recuperación y Fortalecimiento de las Capacidades Oceánicas de la Armada

Al segundo trimestre de 2025, el proyecto registra un monto codificado de USD 30,07 millones y no presenta ejecución presupuestaria acumulada.

La entidad reporta que la causa del retraso en la ejecución del proyecto es la ampliación de plazos debido a que el MEF no ha cancelado los hitos cumplidos. Se recomienda coordinar con el MEF para priorizar dichos pagos y evitar nuevas demoras en el avance del proyecto.

Servicio Nacional de Atención Integral a Personas Adultas Privadas de la Libertad y a Adolescentes Infractores

La entidad contó, dentro del Objetivo 3, con un monto codificado de inversión de USD 73,47 millones y un monto devengado de USD 4,84 millones, lo que representa una ejecución presupuestaria del 6,59%. Al considerar el devengado más anticipos en relación con el codificado con fuente, la ejecución alcanza el 8,49%. Adicionalmente, se identifican 3 proyectos alineados a este objetivo, de los cuales 2 cuentan con programación de metas físicas y registran un cumplimiento físico del 100,00%.al segundo trimestre de 2025.

Tabla 31. Avance Físico de Proyectos de Inversión al Segundo Trimestre Servicio Nacional de Atención Integral a Personas Adultas Privadas de la Libertad y a Adolescentes Infractores – Objetivo 3

Nombre del proyecto	Programación metas físicas (a)	Ejecución metas físicas (b)	Cumplimiento metas físicas c(b/a)	Codificado (MM USD) (d)	Devengado (MM USD) (e)	Ejecución presupuestaria 2025 f (d/e)	Devengado + anticipos /codificado con fuente (g)
Construcción Centro de Privación de Libertad -CPL En Archidona	0,00%	0,00%	● 0,00%	11,46	0,02	0,19%	0,19%
Construcción Centro de Privación de Libertad en Santa Elena	0,35%	0,35%	● 100,00%	49,27	2,10	4,26%	4,26%
Reestructuración del Sistema Nacional de Rehabilitación Social	5,13%	7,13%	● 100,00%	12,74	2,72	21,34%	32,29%
Total							8,49%

Nota: ● Avance esperado ≥ 95% y < 100% / ● Avance cercano al esperado ≥ 85% y < 95% / ● Avance menor al esperado < 85% / ● Proyecto sin programación de metas.

Fuente: SIPeIP - SNP. e-SIGEF - MEF- Ejecución Presupuestaria. Corte 30 de junio de 2025.

Elaboración: Dirección de Seguimiento a la Inversión – SNP.

El Servicio Nacional de Atención Integral a Personas Adultas Privadas de la Libertad y a Adolescentes Infractores reporta las siguientes acciones:

Proyecto Construcción Centro de Privación de Libertad en Santa Elena

Al segundo trimestre de 2025, el proyecto registra un monto codificado de USD 49,27 millones y una ejecución presupuestaria acumulada del 4,26%.

La entidad reporta que la causa de la alta rotación de personal, tanto en la construcción como en la



fiscalización, se debe a un atentado ocurrido. Se recomienda implementar medidas de seguridad y continuidad operativa que permitan mantener la estabilidad del equipo y garantizar el cumplimiento de las actividades programadas.

Proyecto Restructuración del Sistema Nacional de Rehabilitación Social

Al segundo trimestre de 2025, el proyecto registra un monto codificado de USD 12,74 millones y una ejecución presupuestaria acumulada, al considerar anticipos, del 32,29%. Entre los principales logros reportados por la entidad se indica que se ha cumplido con lo programado.



Eje Desarrollo Económico



7.4. OBJETIVO 4: Estimular el sistema económico y de finanzas públicas para dinamizar la inversión y las relaciones comerciales.

Este Objetivo pretende estimular el sistema económico y de finanzas públicas para dinamizar la inversión y las relaciones comerciales. En este aspecto, promueve una política económica y exterior que contribuya a la atracción de inversiones y a la promoción comercial y cultural a través de la firma de acuerdos comerciales, inversiones, entre otros. Además, busca garantizar la estabilidad económica de largo plazo al modernizar la economía y fomentar las inversiones en sectores productivos.

Con base en la gestión desarrollada por el Estado a través de la implementación de sus planes institucionales, estudios, programas y proyectos durante el segundo trimestre del 2025, a continuación, se detallan los resultados alineados a este Objetivo:


7.4.1. Gestión Presupuestaria

Para el cumplimiento de las metas del Objetivo 4, se devengó un total de USD 22,33 millones en el segundo trimestre del 2025, de los cuales, el 87,57% corresponde a **Gasto Permanente** con un monto devengado de USD 19,56 millones; y, la diferencia corresponde al **Gasto No Permanente** vinculado a estudios, programas y proyectos de inversión, de diferentes entidades, con un monto devengado de USD 2,78 millones.

Es importante señalar que, el “*Programa de preservación de capital periodo 2025*”, con grupos de gasto 73, 96 y 99, se encuentra alineado al Objetivo 4, alcanzando un monto codificado de USD 6.053,51 millones, y un devengado de USD 2.962,86 millones, lo cual representa una ejecución del 48,82%.

En la ilustración 34, se detalla el presupuesto de **Gasto No Permanente** excluyendo al “*Programa de preservación de capital periodo 2025*”, obteniendo un monto codificado de USD 20,92 millones y una ejecución de USD 2,78 millones, lo cual corresponde al 13,27% de ejecución.

Ilustración 34. Gasto Permanente y No Permanente en 2025 – Objetivo 4
(millones de dólares)

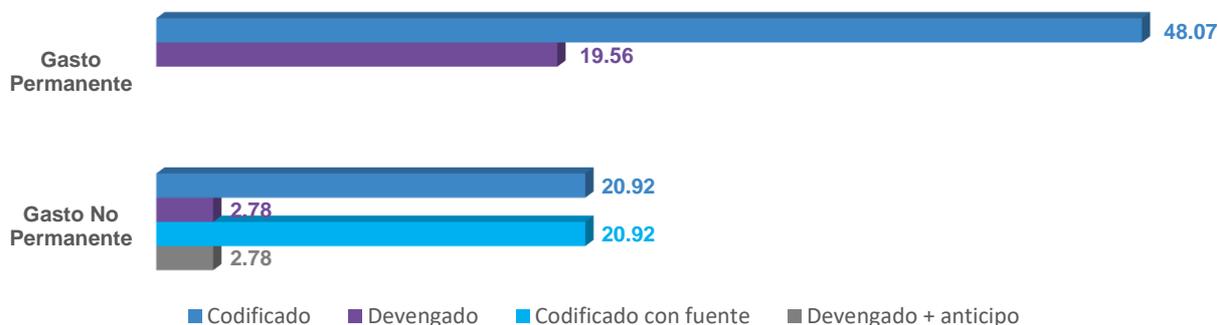

Nota: Para una mejor visualización, se excluye la información del “Programa de preservación de capital periodo 2025”, que se encuentra alineado al Objetivo 4.

Fuente: SIPeIP, SNP, e-SIGEF, MEF- Ejecución Presupuestaria. Corte 30 de junio de 2025.

Elaboración: Dirección de Seguimiento a la Planificación y Política Pública y Dirección de Seguimiento a la Inversión – SNP.

Por su parte, la ejecución presupuestaria del **Gasto No Permanente** destinado al Objetivo 4, considerando el monto devengado más anticipos entregados en el periodo (USD 2,78 millones), frente al monto codificado con fuente de financiamiento (USD 20,92 millones), alcanza un nivel de ejecución del 13,27%.

Ilustración 35. Ejecución: Devengado más anticipos en relación al codificado con fuente – Objetivo 4
(millones de dólares)



Nota: Para una mejor visualización, se excluye la información del “Programa de preservación de capital periodo 2025”, que se encuentra alineado al Objetivo 4.


Fuente: SIPeIP -SNP, e-SIGEF - MEF- Ejecución Presupuestaria. Corte 30 de junio de 2025.

Elaboración: Dirección de Seguimiento a la Inversión – SNP.

A continuación, se detallan los montos correspondientes al **Gasto Permanente** y **Gasto No Permanente** que fueron ejecutados al Objetivo 4, en función de los gabinetes sectoriales establecidos para la gestión institucional.

En **Gasto Permanente**, las entidades de la categoría Sin Gabinete son las que más recursos ejecutaron en este Objetivo con un monto devengado de USD 9,15 millones, conforme la siguiente ilustración:

Ilustración 36. Gasto Permanente por Gabinete Sectorial en 2025 – Objetivo 4 (millones de dólares)



Fuente: Base de datos e-SIGEF, Ejecución Presupuestaria Consolidada – MEF corte al 30 de junio de 2025. Base de alineación al PND segundo trimestre 2025 – SNP, corte 30 de junio de 2025.

Elaboración: Dirección de Seguimiento a la Planificación y Política Pública – SNP.

En relación al **Gasto Permanente** alineado al Objetivo 4, se identifica que se encuentran 9 entidades, con un presupuesto codificado de USD 48,07 millones y un monto devengado de USD 19,56 millones lo que representa una ejecución presupuestaria del 40,68%. A continuación, se detalla la ejecución presupuestaria correspondiente al segundo trimestre por institución:

Tabla 32. Ejecución presupuestaria de las entidades alineadas al Objetivo 4

Gabinete Sectorial	Entidad	Codificado (MM USD)	Devengado (MM USD)	Ejecución (%)
Gabinete Sectorial de Desarrollo Productivo	Ministerio de Producción Comercio Exterior Inversiones y Pesca	5,12	3,49	68,09%
	Servicio Nacional de Aduana del Ecuador	7,08	0,24	3,40%
	Servicio Nacional de Contratación Pública	0,88	0,41	46,12%
Gabinete Sectorial Institucional	Ministerio de Economía y Finanzas	14,87	6,26	42,12%
	Ministerio de Relaciones Exteriores y Movilidad Humana	0,03	0,01	32,73%
Sin Gabinete	Corporación del Seguro de Depósitos	0,02	0,02	66,83%
	Junta de Política y Regulación Financiera	1,08	0,52	48,27%
	Superintendencia de Bancos	9,38	4,02	42,92%
	Superintendencia de Compañías Valores y Seguros	9,62	4,59	47,75%
Total		48,07	19,56	40,68%

Fuente: SNP, SIPeIP corte 30 de junio de 2025. e-SIGEF –MEF- Ejecución Presupuestaria, se excluye el sectorial Tesoro Nacional, que son entidades virtuales manejadas por MEF, corte 30 de junio de 2025.

Elaboración: Dirección de Seguimiento a la Planificación y Política Pública – SNP.

El objetivo 4 relacionado con estimular el sistema económico y de finanzas públicas, presenta a las instituciones Ministerio de Economía y Finanzas y a la Superintendencia de Compañías Valores y Seguros que concentran el 50,93% del codificado del objetivo, cuyos niveles de ejecución presupuestaria son 42,12% y 47,75% respectivamente.


Para el análisis del **Gasto No Permanente** se excluye el “Programa de Preservación de Capital – periodo 2025”, identificado con el CUP 81300000.0000.390031, cuya entidad responsable es el MEF. Al 30 de junio de 2025, este programa registra un presupuesto codificado de USD 6.053,51 millones y un devengado de USD 2.962,86 millones.

En este contexto, dentro del conjunto de entidades que ejecutan estudios, programas y proyectos de inversión alineados al Objetivo 4, se observa que las entidades pertenecientes al Gabinete Sectorial Institucional registraron una ejecución de USD 2,12 millones. Les siguen las entidades del Gabinete

Sectorial de Desarrollo Productivo, con un devengado de USD 0,46 millones, y las entidades sin adscripción a Gabinete, con un monto ejecutado de USD 0,20 millones.

A continuación, se presenta la ejecución correspondiente al Objetivo 4, considerando el monto devengado más los anticipos en relación con el presupuesto codificado con fuente, desagregado por Gabinete Sectorial.

Ilustración 37. Gasto No Permanente por Gabinete Sectorial en 2025 (segundo trimestre) – Objetivo 4 (millones de dólares)

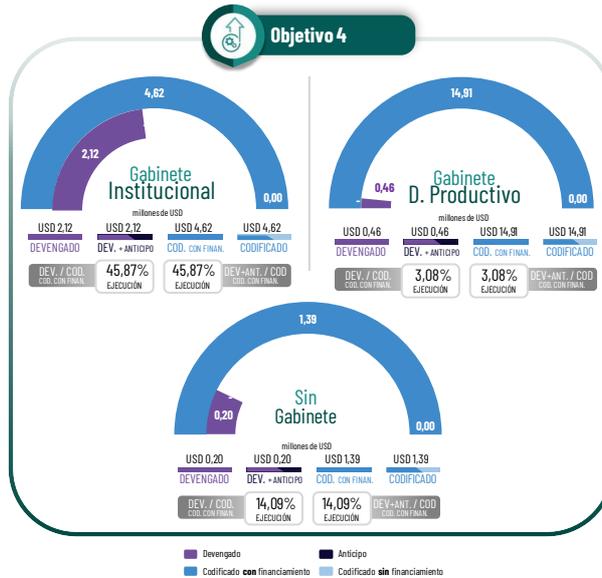

Nota: Para una mejor visualización, se excluye la información del “Programa de preservación de capital periodo 2025”, que se encuentra alineado al Objetivo 4.

Fuente: SIPeIP, SNP. e-SIGEF, MEF- Ejecución Presupuestaria. Corte 30 de junio de 2025.

Elaboración: Dirección de Seguimiento a la Inversión – SNP.

En este marco, se evidencia que las entidades del Gabinete Sectorial Institucional presentan la más alta ejecución presupuestaria en este objetivo, con un 45,87%, correspondiente a 4 proyectos de inversión (excluyendo el Programa de Preservación de Capital – periodo 2025). Les siguen las entidades del Gabinete Sectorial de Desarrollo Productivo, con una ejecución presupuestaria de 14,09% correspondiente a 5 proyectos de inversión, y las sin adscripción a Gabinete Sectorial con una ejecución de 3,08%, con 1 proyecto registrado.

Tabla 33. Cumplimiento presupuestario por gabinete sectorial en 2025 – Objetivo 4

Gabinete Sectorial	Número de Entidades	Número de Proyectos	% Ejecución presupuestaria	
			Devengado / Codificado	Devengado más anticipos / Codificado con fuente
Institucional	1	4	45,87%	45,87%
Sin Gabinete	1	1	14,09%	14,09%
Desarrollo Productivo	4	5	3,08%	3,08%
Total	6	10		

Nota: Se excluye la información del “Programa de preservación de capital periodo 2025”, que se encuentra alineado al Objetivo 4 y forma parte del Gabinete Sectorial Institucional.

Fuente: SIPeIP - SNP. e-SIGEF – MEF– Ejecución Presupuestaria. Corte 30 de junio de 2025.

Elaboración: Dirección de Seguimiento a la Inversión – SNP.

Para obtener información detallada sobre las entidades, se recomienda revisar el Anexo 2, que contiene la matriz resumen con datos sobre el avance presupuestario y físico.

7.4.2. Avance Físico de la Planificación Institucional

Las 8 entidades que cumplieron con el proceso de registro y sistematización de su planificación institucional y cuentan con indicadores alineados al objetivo 4, sujetos a seguimiento (mensuales, trimestrales y semestrales), registran 18 objetivos institucionales y 40 indicadores estratégicos. En este sentido, se identifica que, el 92,50% presentan un avance esperado, el 5,00% presenta un avance cercano al esperado, el 2,50% presenta un avance menor al esperado, conforme el detalle que se establece a continuación:

Tabla 34. Ejecución Indicadores Institucionales – Objetivo 4

Entidad	Número Indicadores	Avance esperado 		Avance cercano al esperado 		Avance menor a lo esperado 	
		Indicadores	%	Indicadores	%	Indicadores	%
Corporación del Seguro de Depósitos, Fondo de Liquidez y Fondo de Seguros Privados	9	9	100,00%	0	0,00%	0	0,00%
Ministerio de Economía y Finanzas	9	9	100,00%	0	0,00%	0	0,00%
Ministerio de Producción, Comercio Exterior, Inversiones y Pesca.	5	4	80,00%	0	0,00%	1	20,00%
Ministerio de Relaciones Exteriores y Movilidad Humana	2	2	100,00%	0	0,00%	0	0,00%
Servicio Nacional de Aduana del Ecuador	1	1	100,00%	0	0,00%	0	0,00%
Servicio Nacional de Contratación Pública	3	3	100,00%	0	0,00%	0	0,00%
Servicio de Rentas Internas	7	5	71,43%	2	28,57%	0	0,00%
Superintendencia de Bancos	4	4	100,00%	0	0,00%	0	0,00%
Total	40	37	92,50%	2	5,00%	1	2,50%

Fuente: SNP, SIPeIP corte 30 de junio de 2025. GPR corte 30 de junio de 2025.

Elaboración: Dirección de Seguimiento a la Planificación y Política Pública – SNP.

Principales Logros

Ministerio de Economía y Finanzas

- Se registra una cobertura de ingresos permanentes sobre egresos permanentes del Presupuesto General del Estado mayor a lo programado, durante el segundo trimestre 2025. Esta cobertura se debió a las reformas de políticas realizadas. Los ingresos permanentes alcanzaron los USD 5.498 millones, en tanto que, el gasto permanente tuvo un desempeño controlado alcanzando los USD 5.329 millones generando un superávit de USD 169 millones.
- 96,85% de pagos efectuados respecto a los pagos autorizados, los pagos procesados corresponden a la priorización y a la disponibilidad de la Caja Fiscal.
- 100,00% de cumplimiento en el número de desarrollos implementados relativos a funcionalidades en los sistemas de finanzas públicas, de complejidad alta o media frente al total de desarrollos solicitados, mediante la priorización basada en impacto y esfuerzo, y la adopción de metodologías ágiles con el equipo del nivel operativo.

Servicio de Rentas Internas

- 5,6% de crecimiento en la recaudación tributaria respecto al mismo periodo de 2024 (enero-junio), (USD 573 millones adicionales) producto del incremento de las tarifas de IVA e incremento en ventas.



- 316.140 correos persuasivos remitidos respecto a la declaración de IVA en atención al programa de Control Dígito caído que coadyuvaron al cumplimiento de la meta de la brecha de presentación a nivel nacional.
- USD 81,82 millones adicionales en gestión de cartera; 2,18% más que la meta prevista, producto de las acciones persuasivas, depuración y seguimiento de la cartera, gestiones para el otorgamiento de facilidades de pago, y ejecución coactiva a nivel nacional.
- 247.778 contribuyentes gestionados a los cuales se inició un proceso de control con estrategias de control (auditorías integrales, rápidas, monitoreos u otros controles intensivos), controles extensivos y semi intensivos a nivel nacional.
- 4.712 ciudadanos incrementaron sus conocimientos tributarios por los cursos de autoestudios ofrecidos a través del campus virtual del SRI a nivel nacional.

Corporación Nacional de Finanzas Populares y Solidarias

- 408 organizaciones del Sector Financiero Popular y Solidario fueron atendidas en procesos de fortalecimiento mediante acompañamiento técnico a nivel nacional, incluyendo la línea base y los resultados correspondientes a los años 2022, 2023 y 2024.
- 37 planes de fortalecimiento para las OSFPS fueron elaborados bajo la modalidad de apoyo directo en las provincias de Azuay, Bolívar, Cañar, Carchi, Chimborazo, Cotopaxi, Loja, Manabí, Orellana, Pichincha, Santo Domingo de los Tsáchilas, Tungurahua y Zamora Chinchipe.
- 1.086 funcionarios de las organizaciones del Sector Financiero Popular y Solidario fueron capacitados a través de 47 cursos de capacitación desarrollados a nivel nacional, con el objetivo de fortalecer sus competencias técnicas e institucionales.

Corporación del Seguro de Depósitos, Fondo de Liquidez y Fondo de Seguros Privados

- 2 días hábiles fue el promedio de tiempo acumulado utilizado para la atención del pago del Seguro de Depósitos durante el primer semestre de 2025, a través de agentes pagadores y los canales presenciales, por oficio y web de la Corporación del Seguro de Depósitos, a nivel nacional.
- 3 títulos de crédito fueron emitidos a junio de 2025, correspondientes a entidades financieras extintas del sector financiero popular y solidario, con el fin de iniciar procesos coactivos tras la coordinación de valores de liquidación. Además, 31 procesos detenidos fueron descongestionados mediante notificaciones por prensa, facilitando la ejecución de la fase de apremio.
- 8.609 beneficiarios del Seguro de Depósitos fueron atendidos con pagos por un total de USD 266.219,02 en el primer semestre de 2025, a través de agentes pagadores y los canales presenciales, oficio y web de la Corporación del Seguro de Depósitos.
- 4,67% de rendimiento ponderado fue alcanzado por el portafolio de los 3 fideicomisos del Seguro de Depósitos en el primer semestre de 2025, resultado de la correcta ejecución de la política de inversión y el comportamiento de tasas internacionales impulsadas por políticas de la FED y otros bancos.
- 2.269 puntos fue el nivel de concentración ponderado de los portafolios de inversión de los Fideicomisos del Seguro de Depósitos y de Seguros Privados en el primer semestre de 2025, como resultado de la estrategia de inversión y la diversificación de contrapartes, medida por el índice HHI.
- 99,30% de participación alcanzaron las inversiones a plazo dentro de los portafolios del Seguro de Depósitos del sector financiero privado, popular y solidario, y fondo de seguros privados, fortaleciendo la diversificación y reduciendo el riesgo.
- 3 metodologías de gestión de riesgos fueron desarrolladas en el primer semestre de 2025: a)



monto de cobertura del Fondo de Seguros Privados, b) monto objetivo de acumulación del fondo, y c) contribución fija y ajustada por riesgo del Fideicomiso del Fondo de Seguros Privados, fortaleciendo la evaluación y control de riesgos institucionales.

Ministerio de Producción Comercio Exterior Inversiones y Pesca

- 7 solicitudes para la suscripción de contratos de inversión registradas, que representa en USD 7.783,32 millones
- USD 450 millones ingreso de un flujo de inversión extranjera directa representada por inversión procedente de España, Estados Unidos y Canadá.

7.4.3. Avance Físico Proyectos de Inversión

El Objetivo 4 cuenta con 11 proyectos de inversión ejecutados por 6 entidades. El monto codificado total asciende a USD 6.074,43 millones, con un devengado de USD 2.965,64 millones, lo que representa una ejecución del 48,82%. Considerando anticipos, la ejecución asciende al 54,35%, con un monto devengado más anticipo de USD 2.965,64 millones frente al codificado con fuente.


Estos valores consideran al “Programa de preservación de capital periodo 2025”, con grupos de gasto 73, 96 y 99, que se encuentra alineado al Objetivo 4, alcanzando un monto codificado de USD 6.053,51 millones, y un devengado de USD 2.962,86 millones, lo que representa una ejecución del 48,94%.

Sin considerar el programa antes mencionado, el monto total codificado del resto de proyectos alineados al Objetivo 4 asciende a USD 20,92 millones, mientras que el monto devengado alcanza los USD 2,78 millones, lo que representa una ejecución presupuestaria del 13,27%.

Excluyendo al “Programa de Preservación de Capital – período 2025”, se identifica que el Servicio de Rentas Internas, Servicio Nacional de Aduana del Ecuador, y el Ministerio de Economía y Finanzas concentran el 87,46% del presupuesto codificado para el Objetivo 4, lo que equivale a USD 18,30 millones de un total de USD 20,92 millones. Además, estas 3 instituciones agrupan el 70,00% del total de proyectos registrados, en este objetivo.

En cuanto al avance físico, este objetivo registra un cumplimiento del 31,85% respecto de las metas anuales programadas, con un nivel promedio de cumplimiento del 78,06% al segundo trimestre, lo que indica un “avance menor al esperado”. Se destacan las entidades como el Ministerio de Producción Comercio Exterior Inversiones y Pesca, y el Servicio de Rentas Internas, quienes registran proyectos que alcanzaron el 100,00% de cumplimiento de sus metas físicas programadas.

Ilustración 38. Gasto No Permanente, avance físico promedio y avance presupuestario- Objetivo 4

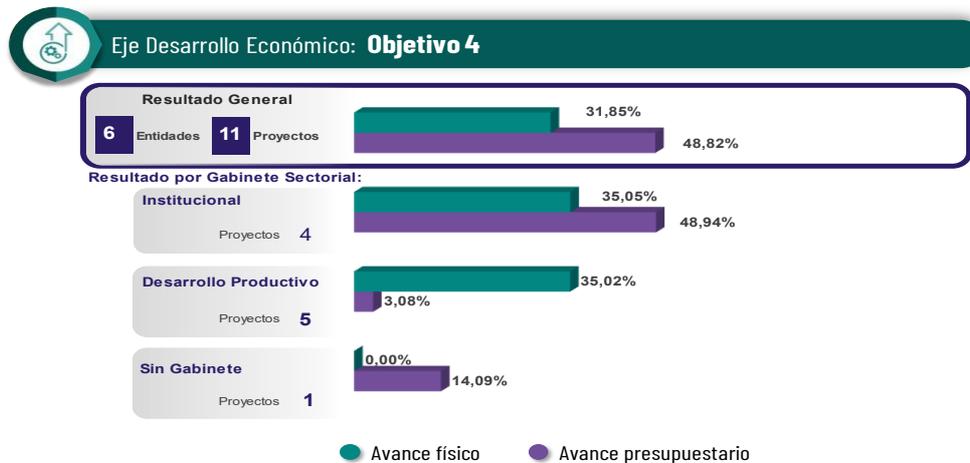

Nota: Se excluye la información del “Programa de preservación de capital periodo 2025”, que se encuentra alineado al Objetivo 4
Fuente: SIPeIP, SNP. e-SIGEF, MEF– Ejecución Presupuestaria. Corte 30 de junio 2025.
Elaboración: Dirección de Seguimiento a la Inversión – SNP.

A continuación, se detalla el cumplimiento físico de los proyectos de inversión por gabinetes sectoriales relacionados con el Objetivo 4, lo que permite identificar los niveles de ejecución alcanzados por cada sector en relación con las metas físicas programadas.

Tabla 35. Cumplimiento físico por gabinete – Objetivo 4

Gabinete Sectorial	Número de Entidades	Número de Proyectos	Número de proyectos por nivel de cumplimiento			
Desarrollo Productivo	4	5	● 3	● 0	● 1	● 1
Institucional	1	5	● 3	● 0	● 1	● 1
Sin Gabinete	1	1	● 0	● 0	● 0	● 1
Total	6	11*	6	0	2	3

Nota: ● Avance esperado ≥ 95% y < 100% / ● Avance cercano al esperado ≥ 85% y < 95% / ● Avance menor al esperado < 85% / ● Proyecto sin programación de metas.

Nota (*): Se incluye el “Programa de preservación de capital periodo 2025”, cuya entidad responsable es el Ministerio de Economía y Finanzas.

Fuente: SIPeIP, SNP. e-SIGEF, MEF- Ejecución Presupuestaria. Corte 30 de junio de 2025.

Elaboración: Dirección de Seguimiento a la Inversión – SNP.

Para conocer más información acerca de las entidades, por favor revisar el Anexo 2, que contiene la matriz resumen con información de avance presupuestario y físico.

A continuación, se presenta la información de ejecución de los principales proyectos de inversión que contribuyen a este objetivo:

Causas y Logros

Ministerio de Economía y Finanzas

El Ministerio de Economía y Finanzas registró un monto codificado de inversión de USD 6.058,13 millones y un devengado de USD 2.964,98 millones, lo que representa una ejecución presupuestaria del 48,94%. Al considerar el devengado más anticipos en relación con el codificado con fuente, la ejecución alcanza el 54,50%. Adicionalmente, se identifican 5 proyectos alineados al Objetivo 4, de los cuales 4 cuentan con programación de metas físicas al segundo trimestre de 2025, 3 proyectos alcanzan un cumplimiento físico del 100,00%.



Tabla 36. Avance Físico de Proyectos de Inversión al Segundo Trimestre Ministerio de Economía y Finanzas – Objetivo 4

Nombre del proyecto	Programación metas físicas (a)	Ejecución metas físicas (b)	Cumplimiento metas físicas c(b/a)	Codificado (MM USD) (d)	Devengado (MM USD) (e)	Ejecución presupuestaria 2025 f (d/e)	Devengado + anticipos /codificado con fuente (g)
Programa de preservación de capital período 2025	54,93%	54,93%	● 100,00%	6.053,51	2.962,86	48,94%	54,51%
Actualización Tecnológica para el Fortalecimiento de las Finanzas Públicas	59,00%	59,00%	● 100,00%	2,94	2,03	68,98%	68,98%
Programa de Modernización de la Administración Financiera - MEF (EC-L1249)	1,75%	3,07%	● 100,00%	0,96	0,04	4,12%	4,12%
Programa de Apoyo a la Reforma de Empresas Públicas MEF	0,00%	0,00%	● 0,00%	0,54	0,00	0,00%	0,00%
Programa de Mejora de la Capacidad Fiscal para la Inversión Pública (EC-L1230)	1,11%	0,00%	● 0,00%	0,19	0,06	29,71%	29,71%
Total							54,50%

Nota: ● Avance esperado ≥ 95% y < 100% / ● Avance cercano al esperado ≥ 85% y < 95% / ● Avance menor al esperado < 85% / ● Proyecto sin programación de metas.

Fuente: SiPeIP - SNP. e-SIGEF - MEF- Ejecución Presupuestaria. Corte 30 de junio de 2025.

Elaboración: Dirección de Seguimiento a la Inversión – SNP.

Al excluir el “Programa de Preservación de Capital – período 2025”, el monto codificado de inversión para los proyectos restantes asciende a USD 4,62 millones, con un devengado de USD 2,12 millones, lo que corresponde a una ejecución presupuestaria del 45,87%.

El Ministerio de Economía y Finanzas reporta las siguientes acciones:

Proyecto Programa de preservación de capital período 2025

Al segundo trimestre de 2025, el proyecto registra un monto codificado de USD 6.053,51 millones y una ejecución presupuestaria acumulada considerando anticipos del 54,51%. Entre los principales logros reportados por la entidad se destaca: la ejecución progresiva de los principales componentes del proyecto. El componente Pago de la amortización de deuda pública, que representa el 94% de las metas físicas, tuvo una ejecución presupuestaria del 21,8%. Por su parte, el Pago de costos de obligaciones firmes presentó una ejecución del 15%, y el componente de Pago de costos y gastos asociados a procedimientos arbitrales o judiciales, una ejecución del 11%. Estos elementos generaron un impacto ponderado que contribuyó significativamente al resultado del segundo trimestre.

Proyecto Actualización Tecnológica para el Fortalecimiento de las Finanzas Públicas

Al segundo trimestre de 2025, el proyecto registra un monto codificado de USD 2,94 millones y una ejecución presupuestaria acumulada del 68,98%. Entre los principales logros reportados por la entidad se encuentra: la gestión para el incremento del techo presupuestario 2025, así como la ejecución de contratos relacionados con la adquisición de equipos balanceadores, servicios para el reforzamiento de la nube privada, y mejoras en la conectividad del Centro de Datos del Ministerio de Economía y Finanzas.

Proyecto Programa de Modernización de la Administración Financiera - MEF (EC-L1249)

Al segundo trimestre de 2025, el proyecto registra un monto codificado de USD 0,96 millones y una ejecución presupuestaria acumulada del 4,12%. Entre los principales logros reportados por la entidad se encuentra: el avance en el proceso de adquisiciones hasta la etapa de aclaraciones a las ofertas, así como el seguimiento permanente al proceso precontractual, el cual, al 30 de junio de 2025, registra un avance ponderado del 2,23%.

La entidad reporta que la causa del retraso en la elaboración y suscripción del informe de evaluación se debe al cambio de dos miembros de la comisión evaluadora, lo que ha afectado la continuidad de los procesos planificados para el ejercicio fiscal en curso. Se recomienda establecer mecanismos de reemplazo ágil y transferencia de conocimiento para minimizar el impacto de cambios de personal en el desarrollo de las actividades.

Servicio de Rentas Internas

El Servicio de Rentas Internas registró un monto codificado de inversión de USD 8,80 millones y un monto devengado de USD 0,24 millones, lo que representa una ejecución presupuestaria del 2,77 %. No se cuenta con anticipos. La entidad reportó un proyecto alineado al Objetivo 4, el cual cuenta con programación de metas físicas para el segundo trimestre de 2025, alcanzando un cumplimiento físico del 100,00 %.

Tabla 37. Avance Físico de Proyectos de Inversión al Segundo Trimestre SRI – Objetivo 4

Nombre del proyecto	Programación metas físicas (a)	Ejecución metas físicas (b)	Cumplimiento metas físicas c(b/a)	Codificado (MM USD) (d)	Devengado (MM USD) (e)	Ejecución presupuestaria 2025 f (d/e)	Devengado + anticipos /codificado con fuente (g)
Construcción del Componente Integral de Aplicaciones Tecnológicas (CIAT) para el Servicio de Rentas Internas	0,05%	0,05%	● 100,00%	0,02	0,02	99,74%	99,74%
Programa de Mejora de la Administración Tributaria y Aduanera / Componente I. Fortalecimiento Institucional del Servicio de Rentas Internas - INNOVA	2,10%	2,90%	● 100,00%	8,79	0,23	2,59%	2,59%
Total							2,77%

Nota: ● Avance esperado $\geq 95\%$ y $< 100\%$ / ● Avance cercano al esperado $\geq 85\%$ y $< 95\%$ / ● Avance menor al esperado $< 85\%$ / ● Proyecto sin programación de metas.

Fuente: SIPeIP - SNP. e-SIGEF - MEF- Ejecución Presupuestaria. Corte 30 de junio de 2025.

Elaboración: Dirección de Seguimiento a la Inversión – SNP.

El Servicio de Rentas Internas reporta las siguientes acciones:

Proyecto Construcción del Componente Integral de Aplicaciones Tecnológicas (CIAT) para el Servicio de Rentas Internas

Al segundo trimestre de 2025, el proyecto registra un monto codificado de USD 0,02 y una ejecución presupuestaria acumulada del 99,74%. Entre los principales logros reportados por la entidad se encuentra: el cumplimiento del último pago por mantenimiento relacionado al contrato NAC-JADNCGC21-00000032, lo que permitió completar el 100,00% de la ejecución del proyecto.

Proyecto Programa de Mejora de la Administración Tributaria y Aduanera / Componente I. Fortalecimiento Institucional del Servicio de Rentas Internas – INNOVA

Al segundo trimestre de 2025, el proyecto registra un monto codificado de USD 8,79 millones y una ejecución presupuestaria acumulada del 2,59 %. Entre los principales logros reportados por la entidad se destacan: la firma de los contratos NAC-JADNCGC25-3, NAC-JADNCGC25-4 y NAC-JADNCGC25-10, así como la activación de licencias, el inicio de la implementación de estos sistemas y el pago del proceso de auditoría financiera que se realizaría en julio. La entidad reporta como causa que ha impedido efectuar el pago del contrato NAC-JADNCGC24-00000007 el retraso en la entrega de documentación por parte del proveedor. Se recomienda reforzar el seguimiento y la coordinación con el proveedor, a fin de garantizar la entrega oportuna de la documentación requerida y evitar afectaciones en el flujo de ejecución.

EJE Desarrollo Económico
Objetivo 5

7.5. OBJETIVO 5: Fomentar de manera sustentable la producción mejorando los niveles de productividad.


Este Objetivo aspira fomentar de manera sustentable la producción mejorando los niveles de productividad. Tiene como fundamento promover un mayor crecimiento económico a través del fomento de las actividades agropecuarias y acuícolas. Además, señala a la productividad como elemento clave para incrementar la producción nacional, por lo que se establecen políticas y estrategias enfocadas a ello.

Con base en la gestión desarrollada por el Estado a través de la implementación de sus planes institucionales, estudios, programas y proyectos durante el segundo trimestre del 2025, a continuación, se detallan los resultados alineados a este Objetivo:

7.5.1. Gestión Presupuestaria

Para el cumplimiento de las metas del Objetivo 5, se devengó un total de USD 68,32 millones en el segundo trimestre del 2025, de los cuales, el 18,54% corresponde a **Gasto Permanente** con un monto devengado de USD 12,66 millones; y, la diferencia corresponde al **Gasto No Permanente** vinculado a estudios, programas y proyectos de inversión, de diferentes entidades, con un monto devengado de USD 55,65 millones.

Ilustración 39. Gasto Permanente y No Permanente en 2025 – Objetivo 5 (millones de dólares)

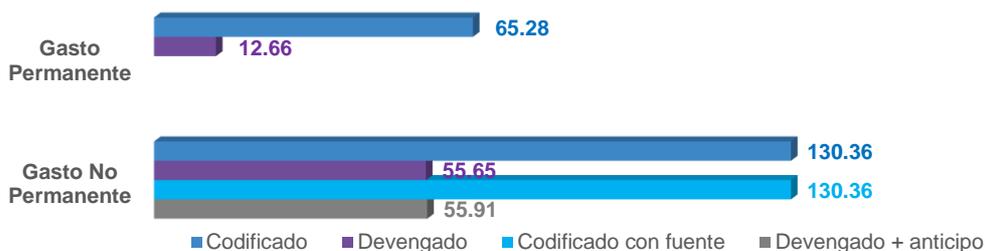

Fuente: SIPeIP, SNP. e-SIGEF, MEF- Ejecución Presupuestaria. Corte 30 de junio de 2025.

Elaboración: Dirección de Seguimiento a la Planificación y Política Pública y Dirección de Seguimiento a la Inversión – SNP.

Por su parte, la ejecución presupuestaria del **Gasto No Permanente** destinado al Objetivo 5, considerando el monto devengado más anticipos entregados en el periodo (USD 55,91 millones), frente al monto codificado con fuente de financiamiento (USD 130,36 millones), alcanza un nivel de ejecución del 42,89%.



Ilustración 40. Ejecución: Devengado más anticipos en relación al codificado con fuente – Objetivo 5 (millones de dólares)



Fuente: SIPeIP -SNP, e-SIGEF - MEF- Ejecución Presupuestaria. Corte 30 de junio de 2025.

Elaboración: Dirección de Seguimiento a la Inversión – SNP.

A continuación, se detallan los montos correspondientes al **Gasto Permanente** y **No Permanente** que fueron ejecutados, alineados al Objetivo 5, en función de los gabinetes sectoriales establecidos para la gestión institucional.

En **Gasto Permanente**, el Gabinete Sectorial de Desarrollo Productivo es el que más recursos ejecutó en este Objetivo con un monto devengado de USD 7,86 millones, conforme la siguiente ilustración:

Ilustración 41. Gasto Permanente por Gabinete Sectorial en 2025 – Objetivo 5 (millones de dólares)



Fuente: Base de datos e-SIGEF, Ejecución Presupuestaria Consolidada –MEF corte al 30 de junio de 2025. Base de alineación al PND segundo trimestre 2025 – SNP, corte 30 de junio de 2025.

Elaboración: Dirección de Seguimiento a la Planificación y Política Pública – SNP.

En relación al **Gasto Permanente** alineado al Objetivo 5, se identifica que se encuentran alineadas 8 entidades, con un presupuesto codificado de USD 65,28 millones y un monto devengado de USD 12,66 millones, lo que representa una ejecución presupuestaria del 19,40%. A continuación, se detalla la ejecución presupuestaria correspondiente al segundo trimestre por institución:

Tabla 38. Ejecución presupuestaria de las entidades alineadas al Objetivo 5

Gabinete Sectorial	Entidad	Codificado (MM USD)	Devengado (MM USD)	Ejecución (%)
Gabinete Sectorial de Desarrollo Productivo	Ministerio de Agricultura y Ganadería	3,77	0,36	9,53%
	Ministerio de Producción Comercio Exterior Inversiones y Pesca	11,83	6,09	51,46%
	Ministerio de Turismo	36,41	0,11	0,30%
	Servicio de Acreditación Ecuatoriano	1,10	0,51	46,87%
	Servicio Ecuatoriano de Normalización	1,65	0,78	47,45%
Gabinete Sectorial de Infraestructura,	Agencia de Regulación y Control Fito y Zoonosanitario	1,05	0,44	42,06%

Gabinete Sectorial	Entidad	Codificado (MM USD)	Devengado (MM USD)	Ejecución (%)
Energía y Medio Ambiente				
Sin Gabinete	Junta Nacional de Defensa del Artesano	0,48	0,21	42,93%
Sin Gabinete	Superintendencia de Economía Popular y Solidaria	8,98	4,16	46,28%
Total		65,28	12,66	19,40%

Fuente: SNP, SIPeIP corte 30 de junio de 2025. e-SIGEF –MEF- Ejecución Presupuestaria, se excluye el sectorial Tesoro Nacional, que son entidades virtuales manejadas por MEF, corte 30 de junio de 2025.

Elaboración: Dirección de Seguimiento a la Planificación y Política Pública –SNP.

El objetivo 5 relacionado con fomentar sustentablemente la producción, presenta a las instituciones Ministerio de Turismo y Ministerio de Producción, Comercio Exterior, Inversiones y Pesca que concentran el 73,90% del codificado del objetivo, cuyos niveles de ejecución presupuestaria son 0,30% y 51,46% respectivamente.

Por su parte, en lo que respecta al **Gasto No Permanente**, las entidades que conforman el Gabinete Sectorial de Desarrollo Productivo ejecutaron USD 54,08 millones, mientras que las entidades del Gabinete Social alineados al Objetivo 5 ejecutaron USD 1,57 millones.

Ilustración 42. Gasto No Permanente por Gabinete Sectorial en 2025 (segundo trimestre) – Objetivo 5 (millones de dólares)



Fuente: SIPeIP, SNP. e-SIGEF, MEF- Ejecución Presupuestaria. Corte 30 de junio de 2025.

Elaboración: Dirección de Seguimiento a la Inversión – SNP.

De esta manera, se evidencia que las entidades del Gabinete de Desarrollo Productivo presentan la mayor ejecución presupuestaria en el Objetivo 5, alcanzando un 43,08%, correspondiente a 29 proyectos de inversión. Mientras que la entidad del Gabinete Social presenta una ejecución del 37,22% correspondiente a 1 proyecto de inversión.

Tabla 39. Cumplimiento presupuestario por gabinete sectorial en 2025 – Objetivo 5

Gabinete Sectorial	Número de Entidades	Número de Proyectos	% Ejecución presupuestaria	
			Devengado / Codificado	Devengado más anticipos / Codificado con fuente
Desarrollo Productivo	5	29	42,90%	43,08%
Social	1	2	36,67%	37,22%
Total	6	31		

Fuente: SIPeIP - SNP. e-SIGEF – MEF- Ejecución Presupuestaria. Corte 30 de junio de 2025.

Elaboración: Dirección de Seguimiento a la Inversión – SNP.

Para obtener información detallada sobre las entidades, se recomienda revisar el Anexo 2, que contiene la matriz resumen con datos sobre el avance presupuestario y físico.

7.5.2. Avance Físico de la Planificación Institucional

Las 11 entidades que cumplieron con el proceso de registro y sistematización de su planificación institucional y cuentan con indicadores alineados al objetivo 5 sujetos a seguimiento (mensuales, trimestrales y semestrales), registran 22 objetivos institucionales y 73 indicadores estratégicos. En este sentido, se identifica que, el 73,97% presentan un avance esperado, el 6.85% presenta un avance cercano al esperado, el 19,18% presenta un avance menor al esperado, conforme el detalle que se establece a continuación:

Tabla 40. Ejecución Indicadores Institucionales – Objetivo 5

Entidad	Número Indicadores	Avance esperado 		Avance cercano al esperado 		Avance menor a lo esperado 	
		Indicadores	%	Indicadores	%	Indicadores	%
Agencia de Regulación y Control Fito y Zoonosanitario	5	5	100,00%	0	0,00%	0	0,00%
Consejo de Gobierno del Régimen Especial de Galápagos	1	0	0,00%	0	0,00%	1	100,00%
Servicio Ecuatoriano de Normalización	9	9	100,00%	0	0,00%	0	0,00%
Instituto Nacional de Investigaciones Agropecuarias	12	9	75,00%	1	8,33%	2	16,67%
Junta Nacional de Defensa del Artesano	2	2	100,00%	0	0,00%	0	0,00%
Ministerio de Agricultura y Ganadería	22	12	54,55%	2	9,09%	8	36,36%
Ministerio de Turismo	4	3	75,00%	1	25,00%	0	0,00%
Misión F.A.O. En El Ecuador	2	2	100,00%	0	0,00%	0	0,00%
Ministerio de Producción, Comercio Exterior, Inversiones y Pesca.	11	8	72,73%	0	0,00%	3	27,27%
Servicio de Acreditación Ecuatoriano	3	3	100,00%	0	0,00%	0	0,00%
Superintendencia de Economía Popular Y Solidaria	2	1	50,00%	1	50,00%	0	0,00%
Total	73	54	73,97%	5	6,85%	14	19,18%

Fuente: SNP, SIPeIP corte 30 de junio de 2025, GPR corte 30 de junio de 2025.

Elaboración: Dirección de Seguimiento a la Planificación y Política Pública –SNP.

Principales Logros

Ministerio de Turismo

- 14 mesas de seguridad turística en el territorio Ecuatoriano a fin de articular esfuerzos para una intervención que consolide al "*Destino como Seguro*", las cuales fueron realizadas en las siguientes provincias del país: Pichincha - Centro Histórico, Haciendas, Floresta y San Miguel de los Bancos (4); Los Ríos - Babahoyo (1); Manabí - Manta (1); Guayas - Guayaquil (1); Azuay - Cuenca (1); Cotopaxi - Latacunga (1); Tungurahua - Ambato (1); Cañar - Azogues (1); Sucumbíos - Lago Agrio (1); Francisco de Orellana - El Coca (1); Santa Cruz - Galápagos (1).
- 74 municipios fueron capacitados y se realizó el lanzamiento del Plan Integral de Seguridad Turística y Asistencia al Turista, que responde a la actualización del Plan Integral de Asistencia Turística PIAT, con este nuevo documento se inició la socialización a nivel nacional



a través de las Direcciones Zonales, con el objeto de determinar protocolos de prevención a las posibles amenazas a los que puedan estar expuestos los turistas, en las provincias de: Esmeraldas; Orellana; Imbabura; Napo; Sucumbíos; Carchi; Galápagos; Guayas; Santa Elena; Santo Domingo; y, Bolívar.

Servicio Ecuatoriano de Normalización

- 35 documentos normativos a escala nacional, se adoptaron y se enviaron a oficialización para el Ministerio de Producción Comercio Exterior Inversiones y Pesca conforme la normativa vigente, en el periodo de abril a junio de 2025.
- 225 sellos de calidad INEN a nivel nacional, fueron emitidos.
- 91 certificados de gestión de micro, pequeñas y medianas empresas y Organizaciones de Economía Popular y Solidaria a nivel nacional, fueron emitidos.
- 325 verificaciones del contenido neto a los productos empacados o envasados que fueron realizados conforme a lo solicitado; el despliegue fue a nivel nacional.

Servicio de Acreditación Ecuatoriano

- 15 acreditaciones iniciales de Organismos de Evaluación de la Conformidad, que apoyan actividades de regulación y control en el país, fueron otorgadas: Laboratorios (6), Organismos de Certificación (5), Organismos de Inspección (4).
- 155 acreditaciones por campo de Organismos de Evaluación de la Conformidad, distribuidas en: Laboratorios (61), Organismos de Certificación (54) y Organismos de Inspección (40).

Superintendencia de Economía Popular y Solidaria

- En el periodo de enero a junio del 2025, USD 10.322.618.076 de activos de los sectores de las entidades del sector Financiero Popular y Solidario y organizaciones de la Economía Popular y Solidaria (33% del total de activos) fueron supervisados por esta Superintendencia a nivel nacional.

Agencia de Regulación y Control Fito y Zoonosanitario

- 10 protocolos zoonosanitarios de exportación fueron homologados o actualizados durante el primer semestre de 2025. Los protocolos corresponden a productos con destino a países como Perú, El Salvador, China, Brasil, Estados Unidos, Panamá y Uruguay.
- 78 productos vegetales fueron gestionados con nuevos requisitos fitosanitarios entre enero y junio de 2025, sumándose a los 14.255 requisitos previamente establecidos, lo que eleva el total acumulado a 14.333 requisitos fitosanitarios vigentes para exportación. Esto fue posible gracias a la actualización del registro y la gestión técnica bilateral con mercados internacionales.
- Se superó lo planificado en notificaciones zoonosanitarias de enfermedades animales priorizadas durante el segundo trimestre de 2025, mediante acciones de supervisión y seguimiento en unidades pecuarias a nivel nacional, fortaleciendo la capacidad de respuesta y control de eventos zoonosanitarios.

Instituto Nacional Autónomo de Investigaciones Agropecuarias

- 30.883 accesiones fueron conservadas en el banco de germoplasma del Instituto Nacional de Investigaciones Agropecuarias, valor acumulado hasta el segundo trimestre de 2025, como parte de las acciones estratégicas orientadas al uso sostenible de los recursos



fitogenéticos para la agricultura y la alimentación en el país.

- 48 publicaciones científicas fueron desarrolladas, en el periodo de abril a junio de 2025, resultado del dinamismo en la generación de conocimiento técnico-científico, impulsado por la alta demanda de investigación en los distintos rubros productivos que actualmente gestiona el Instituto a nivel nacional.
- 1.185,31 toneladas de semilla producida, esta cifra corresponde a la línea base acumulada del periodo 2022-2024, sumada a la planificación correspondiente al primer semestre de 2025. Las toneladas reportadas comprenden semillas producidas en diferentes categorías — básica, registrada y certificada— y abarcan los diversos cultivos en los que el Instituto Nacional de Investigaciones Agropecuarias desarrolla actividades a nivel nacional.
- 72 eventos de transferencia y difusión tecnológica fueron realizados por la Instituto Nacional de Investigaciones Agropecuarias.
- 2.200 agricultores beneficiados en procesos de transferencia y difusión de tecnologías, en el periodo de abril a junio 2025.
- 2.002 técnicos beneficiarios en procesos de transferencia y difusión de tecnologías.

Ministerio de Agricultura y Ganadería

- 45.370 productores agropecuarios fueron atendidos con servicios de Asistencia Técnica y Extensión Rural. La asistencia incluyó apoyo en prevención y respuesta ante eventos climáticos como lluvias intensas e inundaciones.
- 17.083 paquetes de insumos agropecuarios fueron entregados a nivel nacional, como respuesta a las afectaciones de la época invernal 2024–2025, según la siguiente distribución: 15.043 paquetes tecnológicos parcialmente subvencionados; 363 paquetes sostenibles; 327 kits silvopastoriles y pastos mejorados y 1.350 inseminaciones artificiales de la Hacienda El Rosario.
- 853 solicitudes de aprovechamiento forestal fueron atendidas, equivalentes al 100,00% de lo solicitado. Se autorizó el uso de 7.592,42 hectáreas y un volumen de 1.300.365,98 m³, superando ampliamente la meta de 400 licencias.
- 340 productores de la Agricultura Familiar Campesina fueron vinculados a Circuitos Alternativos de Comercialización, en el segundo trimestre de 2025.
- 2.478 mujeres rurales de Agricultura Familiar Campesina, fueron identificadas como promotoras de sistemas de producción sustentable, superando la meta de 2.446 programada.
- 351 circuitos Alternativos de Comercialización, fueron activados por equipos técnicos y en articulación con sectores público-privados en el marco de la construcción de un sistema agroalimentario sostenible a nivel nacional.

Ministerio de Producción Comercio Exterior Inversiones y Pesca

- 306.126 certificados de exportación emitidos, alcanzados mediante la implementación de acciones estratégicas como el fortalecimiento de la capacidad operativa, la capacitación del personal técnico, el uso de firma electrónica, y la eficiencia alcanzada por la digitalización progresiva de los procesos en Guayaquil y Manta.
- USD 35.956,34 millones de exportaciones del sector acuícola y pesquero, mediante la mejora en la producción y la diversificación de mercados, destacando el fortalecimiento de relaciones comerciales con países como Estados Unidos y la Unión Europea.
- 1 iniciativa de Energías Sostenibles como clúster número 19 proyectado, garantizando fuentes energéticas limpias y eficientes para impulsar los procesos industriales en la ciudad de Cuenca, fortaleciendo la matriz energética y la competitividad del sector productivo.
- USD 450 millones de ingreso de un flujo de inversión extranjera directa estimada, de los cuales el 85% de esta inversión es procedente de España, Estados Unidos y Canadá.

- 3.500 participantes entre emprendedores, artesanos y micro, pequeñas y medianas empresas para actividades de vinculación con el mercado acciones emprendidas para impulsar la articulación comercial, generando nuevas oportunidades y fortaleciendo el posicionamiento de los emprendedores en el ecosistema económico, a nivel nacional.


7.5.3. Avance Físico Proyectos de Inversión

El Objetivo 5 cuenta con 31 proyectos de inversión ejecutados por 6 entidades. El monto codificado total asciende a USD 130,36 millones, con un devengado de USD 55,65 millones, lo que representa una ejecución presupuestaria del 42,69%. Considerando anticipos, la ejecución asciende al 42,89%, con un monto devengado más anticipo de USD 55,91 millones frente al codificado con fuente.

El Ministerio de Agricultura y Ganadería y el Ministerio de Producción Comercio Exterior Inversiones y Pesca concentran el 83,06% del presupuesto codificado para el Objetivo 5, lo que equivale a USD 108,28 millones de un total del USD 130,36 millones. Además, estas dos entidades agrupan el 64,52% del total de proyectos registrados, es decir, 20 de los 31 proyectos de inversión.

En cuanto al avance físico, este objetivo registra un cumplimiento del 22,28% respecto de las metas anuales programadas, con un nivel promedio de cumplimiento del 84,29% al segundo trimestre, lo que indica un “*avance menor al esperado*”. Se destacan las entidades como la Agencia de Regulación y Control Fito y Zoonosanitario, Instituto Nacional Autónomo de Investigaciones Agropecuarias, Ministerio de Agricultura y Ganadería, Ministerio de la Mujer y Derechos Humanos, Ministerio de Producción Comercio Exterior Inversiones y Pesca, quienes registran varios proyectos que alcanzaron el 100,00% de cumplimiento de sus metas físicas programadas.

Ilustración 43. Gasto No Permanente, avance físico promedio y avance presupuestario-Objetivo 5

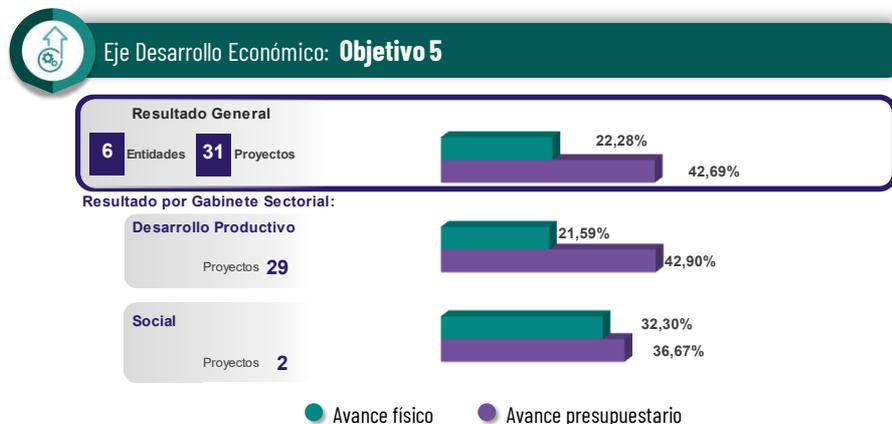

Fuente: SIPeIP, SNP. e-SIGEF, MEF– Ejecución Presupuestaria. Corte 30 de junio 2025.

Elaboración: Dirección de Seguimiento a la Inversión – SNP.

A continuación, se detalla el cumplimiento físico de los proyectos de inversión por gabinetes sectoriales relacionados con el Objetivo 5, lo que permite identificar los niveles de ejecución alcanzados por cada sector en relación con las metas físicas programadas.



Tabla 41. Cumplimiento físico por gabinete – Objetivo 5

Gabinete Sectorial	Número de Entidades	Número de Proyectos	Número de proyectos por nivel de cumplimiento			
			●	●	●	●
Desarrollo Productivo	5	29	● 9	● 4	● 7	● 9
Social	1	2	● 1	● 0	● 1	● 0
Total	6	31	10	4	8	9

Nota: ● Avance esperado ≥ 95% y < 100% / ● Avance cercano al esperado ≥ 85% y < 95% / ● Avance menor al esperado < 85% / ● Proyecto sin programación de metas.

Fuente: SIPeIP, SNP. e-SIGEF, MEF- Ejecución Presupuestaria. Corte 30 de junio de 2025.

Elaboración: Dirección de Seguimiento a la Inversión – SNP.

Para conocer más información acerca de las entidades, por favor revisar el Anexo 2, que contiene la matriz resumen con información de avance presupuestario y físico.

A continuación, se presenta la información de ejecución de los principales proyectos de inversión que contribuyen a este objetivo:

Causas y Logros

Ministerio de Agricultura y Ganadería

El Ministerio de Agricultura y Ganadería registró un monto codificado de inversión de USD 87,95 millones y un devengado de USD 36,90 millones, lo que representa una ejecución del 41,96%.

Al considerar el devengado más anticipos en relación con el codificado con fuente, la ejecución alcanza el 42,22%. Adicionalmente, se identifican 16 proyectos alineados al Objetivo 5, de los cuales 7 cuentan con programación de metas físicas al segundo trimestre de 2025, 4 proyectos alcanzan un cumplimiento físico del 100,00%.

Tabla 42. Avance Físico de Proyectos de Inversión al Segundo Trimestre Ministerio de Agricultura y Ganadería – Objetivo 5

Nombre del proyecto	Programación metas físicas al ii trimestre (a)	Ejecución metas físicas al ii trimestre (b)	Cumplimiento metas físicas c (b/a)	Codificado (MM USD) (d)	Devengado (MM USD) (e)	Ejecución presupuestaria 2025 f(e/d)	Devengado + anticipos /codificado con fuente (g)
Dinamización del Sector Forestal Productivo Sostenible	12,74%	10,68%	● 83,83%	1,28	0,38	29,65%	29,65%
Fomento a la Producción Agrícola a través de la Implementación de Sistemas de uso y aprovechamiento del Recurso Hídrico para el Desarrollo Rural y la Soberanía Alimentaria	0,00%	0,00%	● 0,00%	0,11	0,00	0,00%	0,00%
Fortalecer las Capacidades Productivas Sostenibles y de Comercialización de los Productores de la Agricultura Familiar Campesina	0,00%	0,00%	● 0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00%
Gestión de la Información y Conocimiento para el Desarrollo Económico, Social y Ambiental del Sector Agropecuario	0,00%	0,00%	● 0,00%	11,00	1,54	14,00%	14,00%
Implantación del proceso Reforma Institucional MAGAP	0,00%	0,00%	● 0,00%	0,02	0,00	0,00%	0,00%
Proyecto Agroseguro para pequeños y medianos productores y pescadores Artesanales del Ecuador	0,00%	0,00%	● 0,00%	0,21	0,00	0,00%	0,00%
Proyecto de Fomento a la Inversión Agropecuaria	0,00%	0,00%	● 0,00%	18,32	13,36	72,96%	72,96%
Proyecto de Innovación de Asistencia Técnica y Extensión Rural - PIATER	0,00%	0,00%	● 0,00%	0,07	0,01	8,42%	8,42%



Nombre del proyecto	Programación metas físicas al ii trimestre (a)	Ejecución metas físicas al ii trimestre (b)	Cumplimiento metas físicas c (b/a)	Codificado (MM USD) (d)	Devengado (MM USD) (e)	Ejecución presupuestaria 2025 f(e/d)	Devengado + anticipos /codificado con fuente (g)
Proyecto de Riego Integral Tecnificado Parcelario - PRITEP	1,55%	1,49%	● 96,13%	3,93	1,00	25,55%	31,50%
Proyecto Desarrollo Sostenible y Apropiado en Territorios Rurales - DESATAR	0,90%	3,03%	● 100,00%	5,21	0,88	16,85%	16,85%
Proyecto Financiamiento Productivo Agropecuario "MAKIPURANA"	0,00%	0,00%	● 0,00%	0,00	0,00	13,26%	13,26%
Proyecto Integral de Diversificación Agroproductiva y Reconversión Agrícola	10,83%	9,88%	● 91,23%	36,41	14,36	39,44%	39,44%
Proyecto Nacional de Incentivos Productivos para el Sector Agrícola	0,00%	0,00%	● 0,00%	0,04	0,00	13,79%	13,79%
Proyecto Nacional de Reconversión y Sostenibilidad Ganadera	8,39%	9,06%	● 100,00%	4,13	2,44	59,14%	59,14%
Proyecto para la Ejecución del Sistema de Aseguramiento Agropecuario Subvencionado, con Énfasis en Pequeños y Medianos Productores Vulnerables a los Efectos del Cambio Climático	4,93%	5,08%	● 100,00%	1,67	0,44	26,01%	26,01%
Regularización de Tierras Rurales y Territorios Ancestrales	8,95%	7,08%	● 79,11%	5,56	2,49	44,81%	44,81%
							42,22%

Nota: ● Avance esperado $\geq 95\%$ y $< 100\%$ / ● Avance cercano al esperado $\geq 85\%$ y $< 95\%$ / ● Avance menor al esperado $< 85\%$ / ● Proyecto sin programación de metas.

Fuente: SIPeIP - SNP. e-SIGEF - MEF- Ejecución Presupuestaria. Corte 30 de junio de 2025.

Elaboración: Dirección de Seguimiento a la Inversión – SNP.

El Ministerio de Agricultura y Ganadería reporta las siguientes acciones:

Proyecto de Riego Integral Tecnificado Parcelario – PRITEP

Al segundo trimestre de 2025, el proyecto registra un monto codificado de USD 3,93 millones y una ejecución presupuestaria acumulada considerando anticipos del 31,50%. Entre los principales logros reportados por la entidad se destacan: el avance de obra de 2,02 hectáreas en el Subproyecto Pijumbi, que benefició directamente a 20 productores, así como la capacitación y asistencia técnica brindada a 174 productores.

Proyecto Desarrollo Sostenible y Apropiado en Territorios Rurales -DESATAR

Al segundo trimestre de 2025, el proyecto registra un monto codificado de USD 5,21 millones y una ejecución presupuestaria acumulada del 16,85%. Entre los principales logros reportados por la entidad se destacan: la transferencia de 15 innovaciones tecnológicas a organizaciones de pequeños productores intervenidas y la capacitación a 13 funcionarios en temas de género, seguimiento y evaluación.

Proyecto Nacional de Reconversión y Sostenibilidad Ganadera

Al segundo trimestre de 2025, el proyecto registra un monto codificado de USD 4,13 millones y una ejecución presupuestaria acumulada del 59,14%. Entre los principales logros reportados se incluyen: la entrega de 1.633 paquetes tecnológicos pecuarios motoguadañas, picadoras de pasto, bombas nebulizadoras y cercas eléctricas y 17 tractores asociativos, beneficiando a 3.772 productores. Asimismo, se implementaron 53 escuelas pecuarias, con un impacto en 1.060 productores, y se intervinieron 562 hectáreas con pastos y forrajes mejorados en beneficio de 281 productores

Proyecto para la Ejecución del Sistema de Aseguramiento Agropecuario Subvencionado, con Énfasis en Pequeños y Medianos Productores Vulnerables a los Efectos del Cambio Climático

Al segundo trimestre de 2025, el proyecto registra un monto codificado de USD 1,67 millones y una ejecución presupuestaria acumulada del 26,01 %. Entre los principales logros reportados se incluyen: la capacitación a 12.965 productores sobre el funcionamiento del sistema de aseguramiento, la entrega de subvenciones focalizadas a 4.531 pequeños y medianos productores, y el aseguramiento de un total de 5.355,16 hectáreas agrícolas correspondientes a los rubros priorizados.

Ministerio de Producción, Comercio Exterior, Inversiones y Pesca

El Ministerio de Producción, Comercio Exterior, Inversiones y Pesca registró un monto codificado de inversión de USD 20,33 millones y un devengado de USD 10,16 millones, lo que representa una ejecución presupuestaria del 49,97%. No se cuenta con anticipos. Adicionalmente, se identifican 4 proyectos alineados al Objetivo 5, los 4 cuentan con programación de metas físicas al segundo trimestre de 2025, 2 proyectos alcanzan un cumplimiento físico del 100,00%.

Tabla 43. Avance Físico de Proyectos de Inversión al Segundo Trimestre Ministerio de Producción, Comercio Exterior, Inversiones y Pesca – Objetivo 5

Nombre del proyecto	Programación metas físicas al ii trimestre (a)	Ejecución metas físicas al ii trimestre (b)	Cumplimiento metas físicas c (b/a)	Codificado (MM USD) (d)	Devengado (MM USD) (e)	Ejecución presupuestaria 2025 f(e/d)	Devengado + anticipos /codificado con fuente (g)
Agenda de Competitividad para la Transformación Productiva, Fomento de la Calidad y el Emprendimiento en Ecuador	5,31%	5,35%	● 100,00%	0,75	0,33	43,33%	43,33%
Fomento a la Inversión Productiva de las Microempresas	2,66%	1,46%	● 54,89%	5,72	5,68	99,38%	99,38%
Fortalecimiento de las Capacidades de las Unidades Productivas Rurales en el Territorio Focalizado - EMPRENDER	9,31%	12,89%	● 100,00%	0,65	0,09	14,04%	14,04%
Fortalecimiento Integral y Sostenible del Sector Acuícola y Pesquero	16,68%	15,44%	● 92,57%	13,20	4,06	30,74%	30,74%
							49,97%

Nota: ● Avance esperado ≥ 95% y < 100% / □ Avance cercano al esperado ≥ 85% y < 95% / ● Avance menor al esperado < 85% / ● Proyecto sin programación de metas.

Fuente: SIPeIP - SNP. e-SIGEF - MEF- Ejecución Presupuestaria. Corte 30 de junio de 2025.

Elaboración: Dirección de Seguimiento a la Inversión – SNP.

El Ministerio de Producción, Comercio Exterior, Inversiones y Pesca reporta las siguientes acciones:

Proyecto Agenda de Competitividad para la Transformación Productiva, Fomento de la Calidad y el Emprendimiento en Ecuador

Al segundo trimestre de 2025, el proyecto registra un monto codificado de USD 0,75 millones y una ejecución presupuestaria acumulada del 43,33 %. Entre los principales logros reportados se incluyen: la inauguración de un Centro de Desarrollo Empresarial y Laboral en Morona Santiago, la realización de 8.101 inspecciones a empresas con productos sujetos a reglamentación técnica y el apoyo a 125 emprendedores, MiPymes y artesanos mediante eventos de promoción y difusión.



La entidad reporta como causa de los retrasos administrativos el cambio de autoridades, situación que ha impedido solicitar oportunamente las certificaciones presupuestarias. Se recomienda implementar mecanismos internos que aseguren la continuidad de los procesos administrativos durante los períodos de transición de autoridades.

Proyecto Fortalecimiento de las Capacidades de las Unidades Productivas Rurales en el Territorio Focalizado – EMPRENDER

Al segundo trimestre de 2025, el proyecto registra un monto codificado de USD 0,65 millones y una ejecución presupuestaria acumulada del 14,04%. Entre los principales logros reportados se incluyen: Se realizaron 2 mesas participativas, se desarrollaron 2 ofertas de valor territorial en Napo e Imbabura, 2 portafolios de fortalecimiento productivo, beneficiando a 32 unidades productivas rurales, con 32 servicios de asesoramiento y/o asistencias técnicas. Se abordaron temas de comercialización, fidelización y redes comerciales. Además, se ejecutaron 3 Planes de Mejora de Agronegocios en Napo, Santo Domingo e Imbabura, para sostenibilidad y posterior ejecución.



7.6. OBJETIVO 6: Incentivar la generación de empleo digno


Este Objetivo incentiva la generación de empleo digno, representa el deseo de alcanzar la justicia social a través de empleo con salarios justos que permitan mejorar verdaderamente la calidad de vida de los ciudadanos. En adición, las políticas planteadas otorgan especial importancia al crecimiento y expansión empresarial para generar empleo joven y, por último, se prioriza la reducción de brechas salariales entre hombres y mujeres.

Con base en la gestión desarrollada por el Estado a través de la implementación de sus planes institucionales, estudios, programas y proyectos durante el segundo trimestre del 2025, a continuación, se detallan los resultados alineados a este Objetivo:

7.6.1. Gestión Presupuestaria

Para el cumplimiento de las metas del Objetivo 6, se devengó un total de USD 22,27 millones en el segundo trimestre del 2025, de los cuales, el 91,90% corresponde a Gasto Permanente con un monto devengado de USD 20,47 millones; y, la diferencia corresponde al Gasto No Permanente vinculado a estudios, programas y proyectos de inversión, de diferentes entidades, con un monto devengado de USD 1,81 millones.

Ilustración 44. Gasto Permanente y No Permanente en 2025 – Objetivo 6 (millones de dólares)

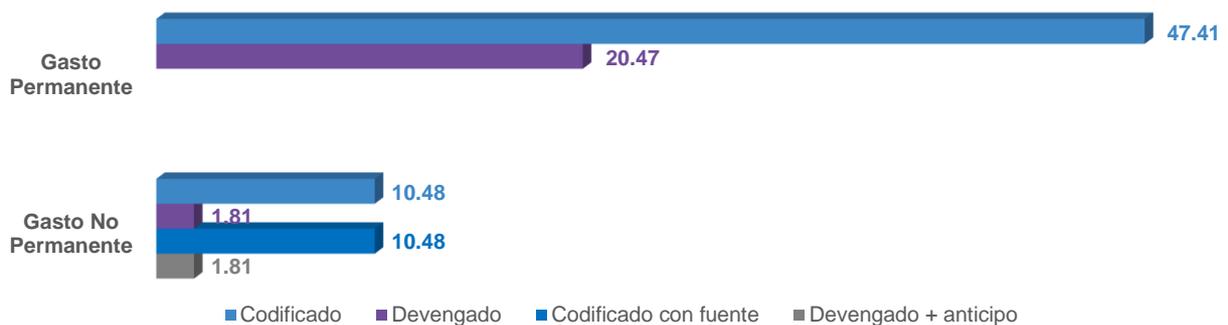

Fuente: SIPeIP, SNP. e-SIGEF, MEF- Ejecución Presupuestaria. Corte 30 de junio de 2025.

Elaboración: Dirección de Seguimiento a la Planificación y Política Pública y Dirección de Seguimiento a la Inversión. SNP.

Por su parte, la ejecución presupuestaria del **Gasto No Permanente** destinado al Objetivo 6, considerando el monto devengado más anticipos entregados en el periodo (USD 1,81 millones), frente al monto codificado con fuente de financiamiento (USD 10,48 millones), alcanza un nivel de ejecución del 17,25%.

Ilustración 45. Ejecución: Devengado más anticipos en relación al codificado con fuente – Objetivo 6 (millones de dólares)




Fuente: SIPeIP -SNP, e-SIGEF - MEF- Ejecución Presupuestaria. Corte 30 de junio de 2025.
Elaboración: Dirección de Seguimiento a la Inversión – SNP.

A continuación, se detallan los montos correspondientes al **Gasto Permanente** y **Gasto No Permanente** que fueron ejecutados, alineados al Objetivo 6, en función de los gabinetes sectoriales establecidos para la gestión institucional.

En **Gasto Permanente**, las entidades Sin Gabinete ejecutaron en este Objetivo un monto devengado de USD 19,86 millones, conforme la siguiente ilustración:

Ilustración 46. Gasto Permanente por Gabinete Sectorial en 2025 – Objetivo 6 (millones de dólares)



Fuente: Base de datos e-SIGEF, Ejecución Presupuestaria Consolidada – MEF corte al 30 de junio de 2025. Base de alineación al PND segundo trimestre 2025 – SNP, corte 30 de junio de 2025.
Elaboración: Dirección de Seguimiento a la Planificación y Política Pública – SNP.

En relación al **Gasto Permanente** alineado al Objetivo 6, se identifica que se encuentran alineadas 4 entidades, con un presupuesto codificado de USD 47,41 millones y un monto devengado de USD 20,47 millones, lo que representa una ejecución presupuestaria del 43,17%. A continuación, se detalla la ejecución presupuestaria correspondiente al segundo trimestre por institución:

Tabla 44. Ejecución presupuestaria de las entidades alineadas al Objetivo 6


Gabinete Sectorial	Entidad	Codificado (MM USD)	Devengado (MM USD)	Ejecución (%)
Gabinete Sectorial Institucional	Ministerio del Trabajo	0,96	0,45	47,40%
	Servicio Ecuatoriano de Capacitación Profesional	0,38	0,15	39,19%
Sin Gabinete	Centro Interamericano de Artesanías y Artes Populares	0,05	0,03	59,86%
	Escuela Superior Politécnica del Litoral	46,01	19,83	43,10%
Total		47,41	20,47	43,17%

Fuente: SNP, SIPeIP corte 30 de junio de 2025. e-SIGEF –MEF- Ejecución Presupuestaria, se excluye el sectorial Tesoro Nacional, que son entidades virtuales manejadas por MEF, corte 30 de junio de 2025.
Elaboración: Dirección de Seguimiento a la Planificación y Política Pública – SNP.

El objetivo 6 relacionado con incentivar la generación de empleo digno, presenta a las instituciones Escuela Superior Politécnica del Litoral y Ministerio del trabajo que concentran el 99,08% del codificado del objetivo, cuyos niveles de ejecución presupuestaria son 43,10% y 47,40% respectivamente.

Por su parte, en lo que respecta al **Gasto No Permanente**, las entidades que conforman el Gabinete Sectorial Institucional ejecutaron USD 0,04 millones, mientras que las entidades sin Gabinete alineados al Objetivo 6 ejecutaron USD 1,77 millones.

Ilustración 47. Gasto No Permanente por Gabinete Sectorial en 2025 (segundo trimestre) – Objetivo 6 (millones de dólares)

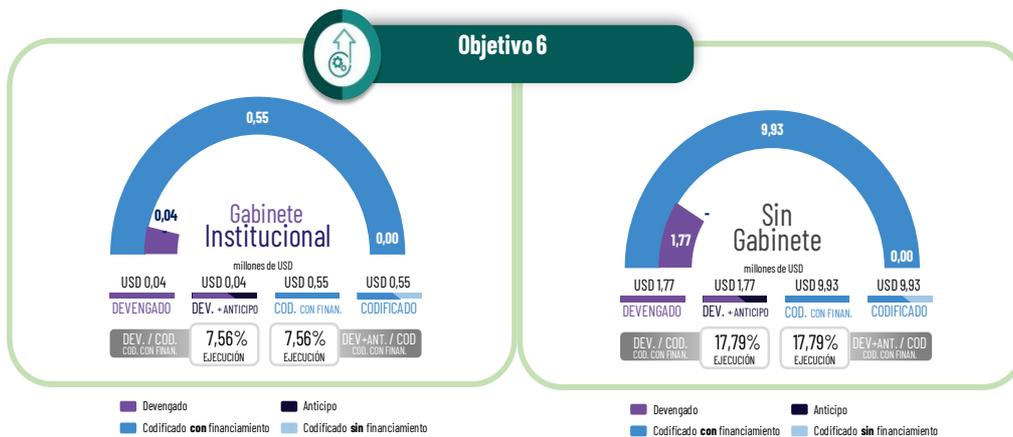

Fuente: SIPeIP, SNP. e-SIGEF, MEF- Ejecución Presupuestaria. Corte 30 de junio de 2025.
Elaboración: Dirección de Seguimiento a la Inversión – SNP.

Así, se evidencia que la entidad sin Gabinete presenta la mayor ejecución presupuestaria en el Objetivo 6, alcanzando un 17,79%, correspondiente a 1 proyecto de inversión. Mientras que la entidad del Gabinete Institucional presenta una ejecución del 7,56% correspondiente a 1 proyecto de inversión.

Tabla 45. Cumplimiento presupuestario por gabinete sectorial en 2025 – Objetivo 6

Gabinete Sectorial	Número de Entidades	Número de Proyectos	% Ejecución presupuestaria	
			Devengado / Codificado	Devengado más anticipos / Codificado con fuente
Institucional	1	1	7,56%	7,56%
Sin Gabinete	1	1	17,79%	17,79%
Total	2	2		

Fuente: SIPeIP - SNP. e-SIGEF – MEF– Ejecución Presupuestaria. Corte 30 de junio de 2025.
Elaboración: Dirección de Seguimiento a la Inversión – SNP.

Para obtener información detallada sobre las entidades, se recomienda revisar el Anexo 2, que contiene la matriz resumen con datos sobre el avance presupuestario y físico.

7.6.2. Avance Físico de la Planificación Institucional

Las 4 entidades que cumplieron con el proceso de registro y sistematización de su planificación institucional y cuentan con indicadores alineados al objetivo 6 sujetos a seguimiento (mensuales, trimestrales y semestrales), registran 7 objetivos institucionales y 26 indicadores estratégicos. En este sentido, se identifica que, el 76,92% presentan un avance esperado, y el 23,08% presenta un avance menor al esperado, conforme el detalle que se establece a continuación:

Tabla 46. Ejecución Indicadores Institucionales – Objetivo 6

Entidad	Número Indicadores	Avance esperado 		Avance cercano al esperado 		Avance menor a lo esperado 	
		Indicadores	%	Indicadores	%	Indicadores	%
Centro Interamericano de Artesanías y Artes Populares	3	3	100,00%	0	0,00%	0	0,00%
Consejo Nacional para la Igualdad de Discapacidades	5	5	100,00%	0	0,00%	0	0,00%
Ministerio de Trabajo	8	8	100,00%	0	0,00%	0	0,00%
Servicio Ecuatoriano de Capacitación Profesional	10	4	40,00%	0	0,00%	6	60,00%
Total	26	20	76,92%	0	0,00%	6	23,08%

Fuente: SNP, SIPeIP corte 30 de junio de 2025. GPR corte 30 de junio de 2025.

Elaboración: Dirección de Seguimiento a la Planificación y Política Pública – SNP.

Principales Logros

Ministerio del Trabajo

- 1 estudio especializado emitido: “Proceso de jubilación en el Ecuador para personas con enfermedades catastróficas”, con enfoque en garantizar el acceso a la jubilación por invalidez, según lo establece la normativa vigente, para quienes no pueden continuar en sus funciones por condiciones graves de salud.
- 3.642 mujeres colocadas a través de la plataforma del Servicio Público de Empleo "Encuentra Empleo" a nivel nacional.
- 5.112 jóvenes colocados a través de la plataforma del Servicio Público de Empleo "Encuentra Empleo" a nivel nacional.
- 251 inspecciones realizadas para la identificación de niñas, niños y adolescentes en situación de trabajo infantil y trabajo adolescente peligroso, proceso realizado a nivel nacional.
- 386 talleres de sensibilización en las temáticas de derechos de equidad con inclusión al trabajo, acoso laboral y protocolo de prevención y atención de casos de discriminación a nivel nacional.


7.6.3. Avance Físico Proyectos de Inversión

El Objetivo 6 cuenta con 2 proyectos de inversión ejecutados por 2 entidades. El monto codificado total asciende a USD 10,48 millones, con un devengado de USD 1,81 millones, lo que representa una ejecución presupuestaria del 17,25%. Considerando anticipos, la ejecución asciende al 17,25%, con un monto devengado más anticipo de USD 1,81 millones frente al codificado con fuente.

La Escuela Superior Politécnica del Litoral concentra el 94,71% del presupuesto codificado (USD 9,93 millones) y ejecuta el 50,00% de los proyectos (1 de 2).

En cuanto al avance físico, este objetivo registra un cumplimiento del 0,00% respecto de las metas anuales programadas, con un nivel promedio de cumplimiento del 0,00% al segundo trimestre, ya que no existen metas programadas. Las metas fueron programadas desde el tercer y cuarto trimestre.

Ilustración 48. Gasto No Permanente, avance físico promedio y avance presupuestario- Objetivo 6

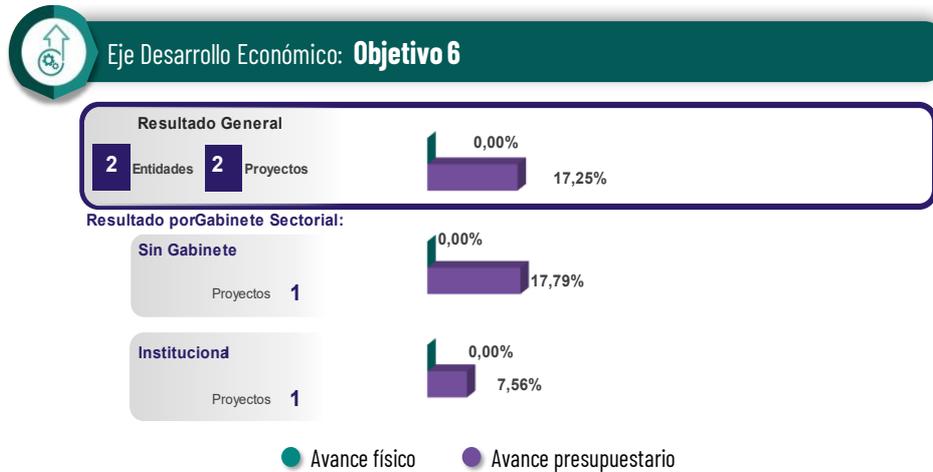

Fuente: SIPeIP, SNP. e-SIGEF, MEF- Ejecución Presupuestaria. Corte 30 de junio 2025.
Elaboración: Dirección de Seguimiento a la Inversión – SNP.

A continuación, se detalla el cumplimiento físico de los proyectos de inversión por gabinetes sectoriales relacionados con el Objetivo 6, lo que permite identificar los niveles de ejecución alcanzados por cada sector en relación con las metas físicas programadas.

Tabla 47. Cumplimiento físico por gabinete – Objetivo 6

Gabinete Sectorial	Número de Entidades	Número de Proyectos	Número de proyectos por nivel de cumplimiento			
Institucional	1	1	● 0	● 0	● 0	● 1
Sin Gabinete	1	1	● 0	● 0	● 0	● 1
Total	2	2	0	0	0	1

Nota: ● Avance esperado $\geq 95\%$ y $< 100\%$ / ● Avance cercano al esperado $\geq 85\%$ y $< 95\%$ / ● Avance menor al esperado $< 85\%$ / ● Proyecto sin programación de metas.

Fuente: SIPeIP, SNP. e-SIGEF, MEF- Ejecución Presupuestaria. Corte 30 de junio de 2025.
Elaboración: Dirección de Seguimiento a la Inversión – SNP.

Para conocer más información acerca de las entidades, por favor revisar el Anexo 2, que contiene la matriz resumen con información de avance presupuestario y físico.

A continuación, se presenta la información de ejecución de los principales proyectos de inversión que contribuyen a este objetivo:

Causas y Logros

Escuela Superior Politécnica del Litoral

La Escuela Superior Politécnica del Litoral contó, dentro del Objetivo 6, con un monto codificado de inversión de USD 9,93 millones y un monto devengado de USD 1,77 millones, lo que representa una ejecución presupuestaria del 17,79%. Se identifica además la presentación de un proyecto alineado a este objetivo, el cual no cuenta con programación de metas físicas al segundo trimestre de 2025; no obstante, registra ejecución presupuestaria durante el período analizado.

Tabla 48. Avance Físico de Proyectos de Inversión al Segundo Trimestre Escuela Politécnica del Litoral – Objetivo 6

Nombre del proyecto	Programación metas físicas (a)	Ejecución metas físicas (b)	Cumplimiento metas físicas c(b/a)	Codificado (MM USD) (d)	Devengado (MM USD) (e)	Ejecución presupuestaria a 2025 f (d/e)	Devengado + anticipos /codificado con fuente (g)
Fortalecimiento de la Educación Superior	0,00%	0,00%	● 0,00%	9,93	1,77	17,79%	17,79%
Total							17,79%

Nota: ● Avance esperado $\geq 95\%$ y $< 100\%$ / ● Avance cercano al esperado $\geq 85\%$ y $< 95\%$ / ● Avance menor al esperado $< 85\%$ / ● Proyecto sin programación de metas.

Fuente: SIPeIP - SNP. e-SIGEF - MEF- Ejecución Presupuestaria. Corte 30 de junio de 2025.

Elaboración: Dirección de Seguimiento a la Inversión – SNP.

La Escuela Superior Politécnica del Litoral reporta las siguientes acciones:

Proyecto Fortalecimiento de la Educación Superior

Al segundo trimestre de 2025, el proyecto registra un monto codificado de USD 9,93 millones y una ejecución presupuestaria acumulada del 17,79%. Entre los logros alcanzados la entidad destaca la finalización de una obra correspondiente a ejercicios de años anteriores y el avance a la etapa precontractual de los procesos de contratación para obras, consultorías, servicios, equipos y mobiliarios.

La entidad reporta cambios recurrentes en la normativa de contratación pública. Se recomienda fortalecer la planificación y establecer mecanismos de adaptación ágil a reformas normativas, con el fin de minimizar su impacto en el cumplimiento de metas y plazos.

Ministerio del Trabajo

El Ministerio del Trabajo contó, dentro del Objetivo 6, con un monto codificado de inversión de USD 0,55 millones y un monto devengado de USD 0,04 millones, lo que representa una ejecución presupuestaria del 7,56%. Se identifica además la presentación de un proyecto alineado a este objetivo, el cual no cuenta con programación de metas físicas al segundo trimestre de 2025; no obstante, registra ejecución presupuestaria durante el período analizado.

Tabla 49. Avance Físico de Proyectos de Inversión al Segundo Trimestre Ministerio del Trabajo – Objetivo 6

Nombre del proyecto	Programación metas físicas (a)	Ejecución metas físicas (b)	Cumplimiento metas físicas c(b/a)	Codificado (MM USD) (d)	Devengado (MM USD) (e)	Ejecución presupuestaria a 2025 f (d/e)	Devengado + anticipos /codificado con fuente (g)
Compromiso por el Empleo	0,00%	0,00%	● 0,00%	0,55	0,04	7,56%	7,56%
Total							7,56%

Nota: ● Avance esperado $\geq 95\%$ y $< 100\%$ / ● Avance cercano al esperado $\geq 85\%$ y $< 95\%$ / ● Avance menor al esperado $< 85\%$ / ● Proyecto sin programación de metas.

Fuente: SIPeIP - SNP. e-SIGEF - MEF- Ejecución Presupuestaria. Corte 30 de junio de 2025.

Elaboración: Dirección de Seguimiento a la Inversión – SNP.

El Ministerio del Trabajo reporta las siguientes acciones:

Proyecto Compromiso por el Empleo

Al segundo trimestre de 2025, el proyecto registra un monto codificado de USD 0,55 millones y una ejecución presupuestaria acumulada de 7,56%. Entre los principales logros reportados por la entidad se encuentra: la aprobación para la publicación de la Encuesta de Demanda Laboral 2024 y su tablero de visualización, así como la preparación del levantamiento de la versión 2025 con nuevos términos de referencia para certificación plurianual. Asimismo, se destaca la actualización del dictamen de prioridad por parte de la SNP y la aprobación del incremento presupuestario.

La entidad reporta la declaratoria de proceso desierto por parte del Banco Interamericano de Desarrollo para la contratación del gerente, la espera de los resultados del CTES para la incorporación del equipo técnico y la permanencia en la fase de elaboración de convenios de certificación laboral con el Servicio Ecuatoriano de Capacitación Profesional. Se recomienda agilizar las gestiones con los organismos involucrados y establecer un cronograma de hitos para garantizar el avance oportuno de estas contrataciones y acuerdos.



Eje Infraestructura, Energía y Medio Ambiente



7.7. OBJETIVO 7: Precautelar el uso responsable de los recursos naturales con un entorno ambientalmente sostenible.

Este Objetivo busca precautelar el uso responsable de los recursos naturales con un entorno ambientalmente sostenible. Considera al ambiente como un aspecto fundamental de la política pública y pretende recuperar el capital natural, así como minimizar el impacto ambiental de las actividades económicas. Adicionalmente, implementa políticas y estrategias para fortalecer el abastecimiento energético y el uso eficiente de recursos naturales no renovables. Finalmente, es importante destacar que pretende fortalecer la resiliencia nacional para minimizar los riesgos y peligros de desastres asociados al cambio climático.

Con base en la gestión desarrollada por el Estado a través de la implementación de sus planes institucionales, estudios, programas y proyectos durante el segundo trimestre del 2025, a continuación, se detallan los resultados alineados a este Objetivo:

7.7.1. Gestión Presupuestaria

Para el cumplimiento de las metas del Objetivo 7, se devengó un total de USD 30,80 millones en el segundo trimestre del 2025, de los cuales, el 28,66% corresponde a **Gasto Permanente** con un monto devengado de USD 8,83 millones; y, la diferencia corresponde al **Gasto No Permanente** vinculado a estudios, programas y proyectos de inversión, de diferentes entidades, con un monto devengado de USD 21,97 millones, lo cual corresponde al 7,35% de ejecución.

Ilustración 49. Gasto Permanente y No Permanente en 2025 – Objetivo 7 (millones de dólares)



Fuente: SIPeIP, SNP. e-SIGEF, MEF- Ejecución Presupuestaria. Corte 30 de junio de 2025.

Elaboración: Dirección de Seguimiento a la Planificación y Política Pública y Dirección de Seguimiento a la Inversión – SNP.

Por su parte, la ejecución presupuestaria del **Gasto No Permanente** destinado al Objetivo 7, considerando el monto devengado más anticipos entregados en el periodo (USD 21,97 millones), frente al monto codificado con fuente de financiamiento (USD 298,90 millones), alcanza un nivel de ejecución del 7,35%.

Ilustración 50. Ejecución: Devengado más anticipos en relación al codificado con fuente – Objetivo 7 (millones de dólares)




Fuente: SIPeIP -SNP, e-SIGEF - MEF- Ejecución Presupuestaria. Corte 30 de junio de 2025.
Elaboración: Dirección de Seguimiento a la Inversión – SNP.

A continuación, se detallan los montos correspondientes al **Gasto Permanente** y **Gasto No Permanente** que fueron ejecutados, alineados al Objetivo 7, en función de los gabinetes sectoriales establecidos para la gestión institucional.

En **Gasto Permanente**, el Gabinete Sectorial de Infraestructura, Energía y Medio Ambiente es el que concentra los recursos en este objetivo con un monto devengado de USD 8,83 millones, conforme la siguiente ilustración:

Ilustración 51. Gasto Permanente por Gabinete Sectorial en 2025 – Objetivo 7 (millones de dólares)



Fuente: Base de datos e-SIGEF, Ejecución Presupuestaria Consolidada –MEF corte al 30 de junio de 2025. Base de alineación al PND segundo trimestre 2025 –SNP, corte 30 de junio de 2025.
Elaboración: Dirección de Seguimiento a la Planificación y Política Pública – SNP.

A continuación, se detallan los montos correspondientes a **Gasto Permanente** y **Gasto No Permanente** que fueron ejecutados, alineados al Objetivo 7, en función de los gabinetes sectoriales establecidos para la gestión institucional.

En relación al **Gasto Permanente** alineado al Objetivo 7, se identifica que se encuentran alineadas 9 entidades, con un presupuesto codificado de USD 22,61 millones y un monto devengado de USD 8,83 millones, lo que representa una ejecución presupuestaria del 39,04%. A continuación, se detalla la ejecución presupuestaria correspondiente al segundo trimestre por institución:

Tabla 50. Ejecución presupuestaria de las entidades alineadas al Objetivo 7

Gabinete Sectorial	Entidad	Codificado (MM USD)	Devengado (MM USD)	Ejecución (%)
Gabinete Sectorial de Infraestructura,	Agencia de Regulación y Control de la Bioseguridad y Cuarentena para Galápagos	3,16	1,40	44,21%
	Agencia de Regulación y Control Del Agua	1,20	0,49	40,71%


Gabinete Sectorial	Entidad	Codificado (MM USD)	Devengado (MM USD)	Ejecución (%)
Energía y Medio Ambiente	Instituto de Investigación Geológico y Energético	1,97	0,90	45,79%
	Instituto Nacional de Biodiversidad	0,00	-	0,00%
	Instituto Nacional de Meteorología e Hidrología	0,11	0,06	55,18%
	Ministerio de Energía y Minas	5,74	2,75	47,95%
	Ministerio del Ambiente Agua y Transición Ecológica	0,52	0,14	27,22%
	Operador Nacional de Electricidad	7,69	2,20	28,59%
	Parque Nacional Galápagos	2,21	0,88	39,97%
Total		22,61	8,83	39,04%

Fuente: SNP, SIPeIP corte 30 de junio de 2025. e-SIGEF –MEF- Ejecución Presupuestaria, se excluye el sectorial Tesoro Nacional, que son entidades virtuales manejadas por MEF, corte 30 de junio de 2025.
 Elaboración: Dirección de Seguimiento a la Planificación y Política Pública – SNP.

El objetivo 7 relacionado con precautelar el uso responsable de los recursos naturales, presenta a las instituciones Operador Nacional de Electricidad y Ministerio de Energía y Minas que concentran el 59,40% del codificado del objetivo, cuyos niveles de ejecución presupuestaria son 28,59% y 47,95% respectivamente.

Por su parte, en lo que respecta al **Gasto No Permanente**, las entidades que conforman el Gabinete Sectorial de Infraestructura, Energía y Medio Ambiente ejecutaron USD 21,97 millones.

Ilustración 52. Gasto No Permanente por Gabinete Sectorial en 2025 (segundo trimestre) – Objetivo 7 (millones de dólares)

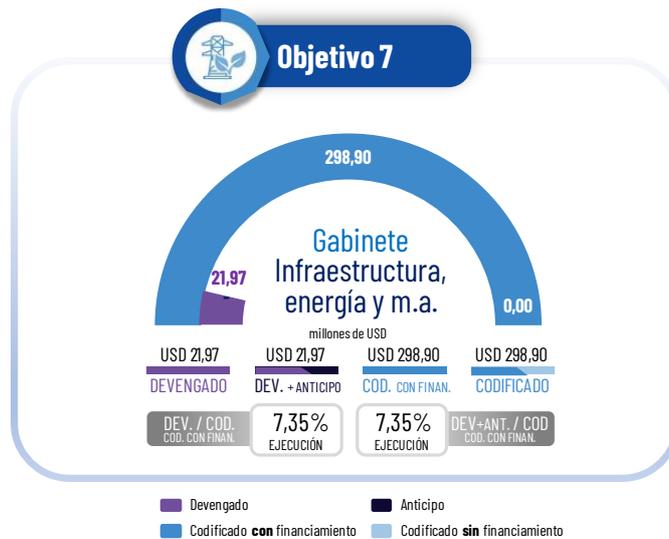

Fuente: SIPeIP, SNP. e-SIGEF, MEF- Ejecución Presupuestaria. Corte 30 de junio de 2025.
 Elaboración: Dirección de Seguimiento a la Inversión – SNP.

Se identifica que las entidades del Gabinete Sectorial de Infraestructura, Energía y Medio Ambiente alcanzan una ejecución presupuestaria del 7,35%, correspondiente a 30 proyectos de inversión.

Tabla 51. Cumplimiento presupuestario por gabinete sectorial en 2025 – Objetivo 7

Gabinete Sectorial	Número de Entidades	Número de Proyectos	% Ejecución presupuestaria	
			Devengado / Codificado	Devengado más anticipos / Codificado con fuente
Infraestructura, Energía y Medio Ambiente	5	30	7,35%	7,35%
Total	5	30		

Fuente: SIPeIP - SNP. e-SIGEF – MEF- Ejecución Presupuestaria. Corte 30 de junio de 2025.
 Elaboración: Dirección de Seguimiento a la Inversión – SNP.

Para obtener información detallada sobre las entidades, se recomienda revisar el Anexo 2, que contiene la matriz resumen con datos sobre el avance presupuestario y físico.

7.7.2. Avance Físico de la Planificación Institucional

Las 10 entidades que cumplieron con el proceso de registro y sistematización de su planificación institucional y cuentan con indicadores alineados al objetivo 7 sujetos a seguimiento (mensuales, trimestrales y semestrales), registran 29 objetivos institucionales y 75 indicadores estratégicos. De esta manera, se identifica que, el 92,00% presentan un avance esperado, el 4,00% presenta un avance cercano al esperado, el 4,00% presenta un avance menor al esperado, conforme el detalle que se establece a continuación:

Tabla 52. Ejecución Indicadores Institucionales – Objetivo 7

Entidad	Número Indicadores	Avance esperado ●		Avance cercano al esperado ●		Avance menor a lo esperado ●	
		Indicadores	%	Indicadores	%	Indicadores	%
Agencia de Regulación y Control de la Bioseguridad y Cuarentena para Galápagos	2	2	100,00%	0	0,00%	0	0,00%
Agencia de Regulación y Control del Agua	3	2	66,67%	1	33,33%	0	0,00%
Operador Nacional de Electricidad	12	12	100,00%	0	0,00%	0	0,00%
Consejo de Gobierno del Régimen Especial de Galápagos	1	0	0,00%	0	0,00%	1	100,00%
Instituto de Investigación Geológico y Energético	9	9	100,00%	0	0,00%	0	0,00%
Instituto Nacional de Meteorología e Hidrología	10	10	100,00%	0	0,00%	0	0,00%
Instituto Nacional de Biodiversidad	19	19	100,00%	0	0,00%	0	0,00%
Ministerio de Ambiente, Agua y Transición Ecológica	6	4	66,67%	2	33,33%	0	0,00%
Ministerio de Energía y Minas	7	5	71,43%	0	0,00%	2	28,57%
Parque Nacional Galápagos	6	6	100,00%	0	0,00%	0	0,00%
Total	75	69	92,00%	3	4,00%	3	4,00%

Fuente: SNP, SIPeIP corte 30 de junio de 2025. GPR corte 30 de junio de 2025.
 Elaboración: Dirección de Seguimiento a la Planificación y Política Pública – SNP.

Principales Logros

Ministerio de Energía y Minas

- 2´130.714,04 barriles equivalentes de petróleo ahorrados netos acumulados, logrado mediante la optimización del despacho energético y eficiencia operativa.
- Aumento de 7.049,02 MVA a 7.164,90 MVA, resultado de obras de expansión y repotenciación de subestaciones a nivel nacional.

Agencia de Regulación y Control de la Bioseguridad y Cuarentena para Galápagos

- 9,52% del índice de ingreso de especies introducidas a las islas Galápagos alcanzado, mismo que representa un nivel por debajo del porcentaje máximo de riesgo de introducción establecido para el segundo trimestre, siendo un nivel satisfactorio respecto a lo programado.
- 18,03% resultado alcanzado relacionado con el índice de establecimiento y/o propagación de

especies introducidas; controlado mediante acciones de fortalecimiento institucional, incluyendo vigilancia activa en las islas pobladas (Santa Cruz, Isabela, San Cristóbal y Floreana), asesoría técnica a granjas porcinas y avícolas, y aplicación de buenas prácticas de bioseguridad.

Instituto Ecuatoriano de Meteorología e Hidrología.

- 56 estaciones hidrometeorológicas con control de calidad de datos.
- 8 aplicativos creados con software libre.
- Mejora en productos hidrometeorológicos mediante informe de gestión de calidad que alineó los pronósticos a estándares de la Organización Meteorológica Mundial.

Parque Nacional Galápagos

- 2.93 hectáreas fueron reforestadas dentro de áreas protegidas del Parque Nacional Galápagos.
- 426 operativos de control realizados en áreas protegidas de la Reserva Marina de Galápagos y 1.253 patrullajes entre diurnos y nocturnos en zonas identificadas de alta incidencia dentro de las áreas protegidas.
- 2 programas de educación ambiental ejecutados, a fin de fortalecer prácticas ambientales y permitir a la comunidad conocer el entorno en el que viven.

Instituto Nacional de Biodiversidad

- 5 estudios en distintas localidades del país realizados, en los que se recolectaron especímenes plantas, mamíferos e insectos que contribuyen al conocimiento de la biodiversidad de áreas poco estudiadas.
- Reestructuración de puntos de control para el registro de ingreso, egreso y uso de las colecciones científicas del Instituto Nacional de Biodiversidad. Esto incluyó la consolidación de un sistema de repositorio compartido, lo que ha optimizado la trazabilidad de los datos y, crucialmente, ha aumentado la información disponible para la gestión integral de las colecciones biológicas.
- 1 propuesta desarrollada "*Estrategia Binacional de Conservación de la Biodiversidad para las Cuencas de los Ríos Mira - Mataje (Ecuador-Colombia)*" que evalúa el estado de la biodiversidad, las amenazas, prioridades de conservación y las líneas estratégicas, metas y áreas de acción.
- 1 adenda suscrita para del proyecto "*Diagnóstico del estado de conocimiento sobre los valores de conservación y de uso para las cinco (5) Áreas Marino Costeras Protegidas de intervención del Programa de Apoyo al Sistema Nacional de Áreas Protegidas PASNAP II*"
- 47 publicaciones científicas por parte de investigadores tanto del Instituto como de su Programa de Investigadores asociados, destacándose la descripción de 24 nuevas especies entre plantas vasculares, mamíferos, insectos y anfibios, así como aportes al conocimiento de la biología, ecología y comportamiento de especies silvestres.
- 1 proyecto en ejecución "*Construcción de un Banco de Extractos y Cribado de Alto Rendimiento de extractos vegetales a partir de la riqueza botánica de la región amazónica del Ecuador*"
- Implementación del Banco Nacional de Recursos Genéticos mediante la adquisición de reactivos, capacitaciones en técnicas de biología molecular, la compra de un sistema de electroforesis y un UPS de 10 kVA, así como la instalación del cableado eléctrico necesario para la operación del generador de nitrógeno líquido


7.7.3. Avance Físico Proyectos de Inversión

El Objetivo 7 cuenta con 30 proyectos de inversión ejecutados por 5 entidades. El monto codificado total asciende a USD 298,90 millones, con un devengado de USD 21,97 millones, lo que representa una ejecución presupuestaria del 7,35%. No se cuenta con anticipos para este objetivo.

El Ministerio de Energías y Minas concentra el 89,50% del presupuesto codificado (USD 267,50 millones) y ejecuta el 36,67% de los proyectos (11 de 30).

En cuanto al avance físico, este objetivo registra un cumplimiento del 23,65% respecto de las metas anuales programadas, con un nivel promedio de cumplimiento del 80,38% al segundo semestre, lo que indica un “*avance menor al esperado*”. Se destacan las entidades como el Instituto de Investigación Geológico y Energético, Ministerio de Energía y Minas, y Ministerio del Ambiente Agua y Transición Ecológica, quienes registran varios proyectos que alcanzaron el 100,00% de cumplimiento de sus metas físicas programadas.

Ilustración 53. Gasto No Permanente, avance físico promedio y avance presupuestario - Objetivo 7

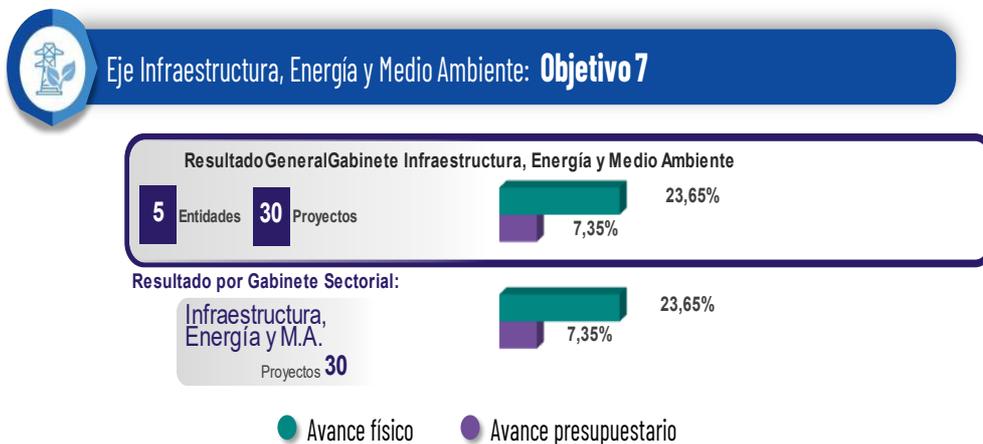

Fuente: SIPeIP, SNP. e-SIGEF, MEF- Ejecución Presupuestaria. Corte 30 de junio 2025.

Elaboración: Dirección de Seguimiento a la Inversión – SNP.

A continuación, se detalla el cumplimiento físico de los proyectos de inversión por gabinetes sectoriales relacionados con el Objetivo 7, lo que permite identificar los niveles de ejecución alcanzados por cada sector en relación con las metas físicas programadas.

Tabla 53. Cumplimiento físico por gabinete – Objetivo 7

Gabinete Sectorial	Número de Entidades	Número de Proyectos	Número de proyectos por nivel de cumplimiento			
			●	●	●	●
Infraestructura, Energía y Medio Ambiente	5	30	11	0	7	12
Total	5	30	11	0	7	12

Nota: ● Avance esperado $\geq 95\%$ y $< 100\%$ / ● Avance cercano al esperado $\geq 85\%$ y $< 95\%$ / ● Avance menor al esperado $< 85\%$ / ● Proyecto sin programación de metas.

Fuente: SIPeIP, SNP. e-SIGEF, MEF- Ejecución Presupuestaria. Corte 30 de junio de 2025.

Elaboración: Dirección de Seguimiento a la Inversión – SNP.

Para conocer más información acerca de las entidades, por favor revisar el Anexo 2, que contiene la matriz resumen con información de avance presupuestario y físico.

A continuación, se presenta la información de ejecución de los principales proyectos de inversión que contribuyen a este objetivo:

Causas y Logros

Ministerio de Energía y Minas

El Ministerio de Energía y Minas registró un monto codificado de inversión de USD 267,50 millones y un devengado de USD 15,99 millones, lo que representa una ejecución presupuestaria del 5,98%. En relación con el cumplimiento físico, la entidad reportó 11 proyectos alineados al Objetivo 7, de los cuales 5 cuentan con programación de metas físicas al segundo trimestre de 2025. Entre estos, 4 alcanzaron el 100,00% de cumplimiento, mientras que 1 no presenta avances.

Adicionalmente, se identificó 2 proyectos alineados al mismo objetivo que, si bien no cuentan con programación ni ejecución física, presentan ejecución presupuestaria.

Tabla 54. Avance Físico de Proyectos de Inversión al Segundo Trimestre Ministerio de Energía y Minas – Objetivo 7

Nombre del proyecto	Programación metas físicas (a)	Ejecución metas físicas (b)	Cumplimiento metas físicas c(b/a)	Codificado (MM USD) (d)	Devengado (MM USD) (e)	Ejecución presupuestaria a 2025 f (d/e)	Devengado + anticipos /codificado con fuente (g)
Electrificación rural y urbano marginal, FERUM Integrado	0,03%	0,03%	● 100,00%	1,67	1,13	67,88%	67,88%
Plan de mejoramiento de los sistemas de distribución de energía eléctrica PMD-2011	0,75%	0,00%	● 0,00%	8,84	4,55	51,47%	51,47%
Programa de adquisición implementación y puesta en servicio de generación adicional emergente para el Sistema Nacional Interconectado	0,00%	0,00%	● 0,00%	167,35	0,00	0,00%	0,00%
Programa de gestión sostenible del sector estratégico de energía y recursos naturales no renovables e infraestructura asociada	0,00%	0,00%	● 0,00%	25,92	2,53	9,76%	9,76%
Programa de modernización y renovación del sistema eléctrico ecuatoriano	18,63%	21,08%	● 100,00%	7,22	0,00	0,02%	0,02%
Programa de reforzamiento de redes de distribución eléctrica para el sector acuícola	0,00%	0,00%	● 0,00%	12,26	0,00	0,00%	0,00%
Programa de reforzamiento del Sistema Nacional de Transmisión para el sector acuícola	0,62%	0,62%	● 100,00%	33,22	1,20	3,60%	3,60%
Programa de reposición y ampliación de instalaciones del Sistema Nacional de Transmisión	0,00%	0,00%	● 0,00%	2,51	0,00	0,00%	0,00%
Programa de transmisión 2012-2022	0,00%	0,00%	● 0,00%	6,65	6,54	98,35%	98,35%
Proyecto Eficiencia Energética Para la Agroindustria en el Ecuador	0,00%	0,00%	● 0,00%	1,19	0,00	0,00%	0,00%
Proyecto para la sustitución de acondicionadores de aire de consumo energético ineficiente en la Provincia de Galápagos	3,34%	3,34%	● 100,00%	0,67	0,03	4,73%	4,73%
Total							5,98%

Nota: ● Avance esperado ≥ 95% y < 100% / ● Avance cercano al esperado ≥ 85% y < 95% / ● Avance menor al esperado < 85% / ● Proyecto sin programación de metas.

Fuente: SIPeIP - SNP. e-SIGEF - MEF- Ejecución Presupuestaria. Corte 30 de junio de 2025.

Elaboración: Dirección de Seguimiento a la Inversión – SNP.

El Ministerio de Energía y Minas reporta las siguientes acciones:

Proyecto Electrificación rural y urbano marginal, FERUM Integrado

Al segundo trimestre de 2025, el proyecto registra un monto codificado de USD 1,67 millones y una ejecución presupuestaria acumulada del 67,88%. Entre los principales logros reportados por la entidad se encuentra: la electrificación de un total de 3.166 viviendas durante el presente año, como resultado del seguimiento a los proyectos incluidos en el programa FERUM.

La entidad reporta como causa de los retrasos en los procesos de contratación y ejecución de los proyectos planificados para el ejercicio fiscal en curso el cambio de autoridades en las Empresas Eléctricas de Distribución y en las Unidades de Negocio de Corporación Nacional de Electricidad EP. Se recomienda establecer mecanismos de transición que garanticen la continuidad de la gestión y minimicen el impacto de estos cambios en la ejecución de los proyectos.

Proyecto Programa de modernización y renovación del sistema eléctrico ecuatoriano

Al segundo trimestre de 2025, el proyecto registra un monto codificado de USD 7,22 millones y una ejecución presupuestaria acumulada del 0,02%. Entre los principales logros reportados por la entidad se encuentra: el levantamiento de Actas de Entrega-Recepción de los proyectos y la actualización del dictamen de prioridad, lo que permitió recalcular los porcentajes de avance y reflejar una mejora significativa en el cumplimiento físico acumulado, que pasó de 68,72% a 89,80%.

La entidad reporta como causa de la postergación de la consultoría para la evaluación intermedia del programa la falta de oferentes desde 2023. Se recomienda fortalecer las estrategias de convocatoria y difusión para ampliar la participación de oferentes y viabilizar la ejecución de la consultoría.

Proyecto Programa de reforzamiento del Sistema Nacional de Transmisión para el sector acuícola

Al segundo trimestre de 2025, el proyecto registra un monto codificado de USD 33,22 millones y una ejecución presupuestaria acumulada del 3,60%. Entre los principales logros reportados por la entidad se encuentra: el avance en el proceso de licitación de cuatro obras.

La entidad reporta que se debe coordinar con las entidades involucradas, Subsecretaría de Distribución y Comercialización de Energía Eléctrica, Corporación Nacional de Electricidad y Corporación Eléctrica del Ecuador. Se recomienda establecer un cronograma conjunto y mecanismos de seguimiento interinstitucional para agilizar esta coordinación y asegurar el inicio oportuno de las actividades previstas.

Proyecto para la sustitución de acondicionadores de aire de consumo energético ineficiente en la Provincia de Galápagos

Al segundo trimestre de 2025, el proyecto registra un monto codificado de USD 0,67 millones y una ejecución presupuestaria acumulada del 4,73%. Entre los principales logros reportados por la entidad se encuentra: en mayo de 2025, el MEF aprobó la continuación del proceso de selección de proveedores para el proyecto, la elaboración del Manual de Gestión, la socialización del modelo con proveedores interesados y la emisión del Acuerdo Ministerial No. MEM-VEER-2024-0002-AM.



7.8. OBJETIVO 8: Impulsar la conectividad como fuente de desarrollo y crecimiento económico y sostenible.


Este Objetivo busca impulsar la conectividad como fuente de desarrollo y crecimiento económico y sostenible. En él se establecen políticas y estrategias encaminadas a aumentar la conectividad digital y mejorar la infraestructura nacional, sobre todo vial.

Con base en la gestión desarrollada por el Estado a través de la implementación de sus planes institucionales, estudios, programas y proyectos durante el segundo trimestre del 2025, a continuación, se detallan los resultados alineados a este Objetivo:

7.8.1. Gestión Presupuestaria

Para el cumplimiento de las metas del Objetivo 8, se devengó un total de USD 195,51 millones en el segundo trimestre del 2025, de los cuales, el 65,18% corresponde a **Gasto Permanente** con un monto devengado de USD 127,43 millones; y, la diferencia corresponde al **Gasto No Permanente** vinculado a estudios, programas y proyectos de inversión, de diferentes entidades, con un monto devengado de USD 68,08 millones.

Ilustración 54. Gasto Permanente y No Permanente en 2025 – Objetivo 8 (millones de dólares)

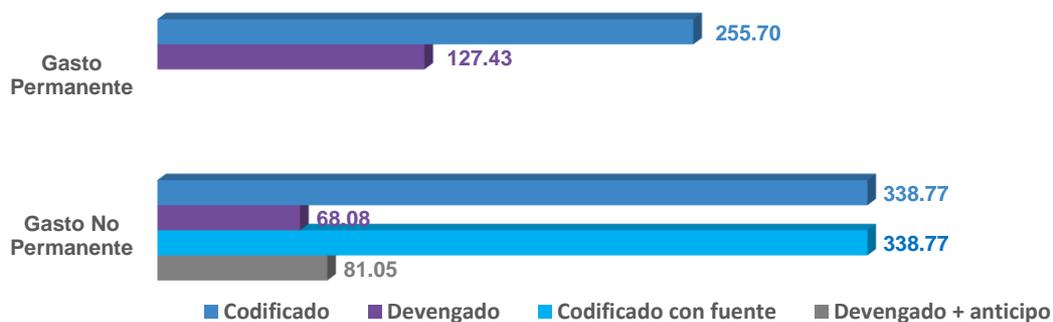

Fuente: SIPeIP, SNP. e-SIGEF, MEF- Ejecución Presupuestaria. Corte 30 de junio de 2025.

Elaboración: Dirección de Seguimiento a la Planificación y Política Pública y Dirección de Seguimiento a la Inversión – SNP.

Por su parte, la ejecución presupuestaria del **Gasto No Permanente** destinado al Objetivo 8, considerando el monto devengado más anticipos entregados en el periodo (USD 81,05 millones), frente al monto codificado con fuente de financiamiento (USD 338,77 millones), alcanza un nivel de ejecución del 23,92%.

Ilustración 55. Ejecución: Devengado más anticipos en relación al codificado con fuente – Objetivo 8 (millones de dólares)




Fuente: SIPeIP -SNP, e-SIGEF - MEF- Ejecución Presupuestaria. Corte 30 de junio de 2025.
Elaboración: Dirección de Seguimiento a la Inversión – SNP.

A continuación, se detallan los montos correspondientes al **Gasto Permanente** y **Gasto No Permanente** que fueron ejecutados, alineados al Objetivo 8, en función de los gabinetes sectoriales establecidos para la gestión institucional.

En **Gasto Permanente**, el Gabinete Sectorial de Infraestructura, Energía y Medio Ambiente ejecutó en este Objetivo, un monto devengado de USD 126,85 millones, conforme la siguiente ilustración:

Ilustración 56. Gasto Permanente por Gabinete Sectorial en 2025 – Objetivo 8 (millones de dólares)



Fuente: Base de datos e-SIGEF, Ejecución Presupuestaria Consolidada –MEF corte al 30 de junio de 2025. Base de alineación al PND segundo trimestre 2025 –SNP, corte 30 de junio de 2025.
Elaboración: Dirección de Seguimiento a la Planificación y Política Pública – SNP.

En relación al **Gasto Permanente** alineado al Objetivo 8, se identifica que se encuentran alineadas 8 entidades con un presupuesto codificado de USD 255,70 millones y un monto devengado de USD 127,43 millones, lo que representa una ejecución presupuestaria del 49,84%. A continuación, se detalla la ejecución presupuestaria correspondiente al segundo trimestre por institución:

Tabla 55. Ejecución presupuestaria de las entidades alineadas al Objetivo 8

Gabinete Sectorial	Entidad	Codificado (MM USD)	Devengado (MM USD)	Ejecución (%)
Gabinete Sectorial de Infraestructura, Energía y Medio Ambiente	Autoridad Portuaria de Esmeraldas	3,35	1,37	40,97%
	Autoridad Portuaria de Manta	1,29	0,63	49,13%
	Autoridad Portuaria de Puerto Bolívar	5,89	1,87	31,65%
	Comisión de Transito del Ecuador	133,11	64,38	48,36%
	Dirección General de Aviación Civil	21,10	8,93	42,31%
	Ministerio de Transporte y Obras Públicas	5,19	2,33	44,99%
	Servicio Público para Pago de Accidentes de Transito	84,50	47,34	56,03%


Gabinete Sectorial	Entidad	Codificado (MM USD)	Devengado (MM USD)	Ejecución (%)
Gabinete Sectorial de lo Social	Ministerio de Telecomunicaciones y de la Sociedad de la Información	1,27	0,58	45,70%
Total		255,70	127,43	49,84%

Fuente: SNP, SIPeIP-Submódulo de planes institucionales corte 30 de junio de 2025. e-SIGEF –MEF- Ejecución Presupuestaria, se excluye el sectorial Tesoro Nacional, que son entidades virtuales manejadas por MEF, corte 30 de junio de 2025.
Elaboración: Dirección de Seguimiento a la Planificación y Política Pública – SNP.

El objetivo 8 relacionado con impulsar la conectividad como fuente de desarrollo económico, presenta a las instituciones Comisión de Transito del Ecuador y Servicio Público para Pago de Accidentes de Tránsito que concentran el 85,10% del codificado del objetivo, cuyos niveles de ejecución presupuestaria son 48,36% y 56,03% respectivamente.

Por su parte, en lo que respecta al **Gasto No Permanente**, las entidades que conforman el Gabinete Sectorial de Infraestructura, Energía y Medio Ambiente ejecutaron USD 58,15 millones, mientras que las entidades del Gabinete Social ejecutaron USD 8,13 millones. Finalmente, las entidades sin Gabinete alineados al Objetivo 8 ejecutaron USD 1,80 millones.

Ilustración 57. Gasto No Permanente por Gabinete Sectorial en 2025 (segundo trimestre) – Objetivo 8 (millones de dólares)

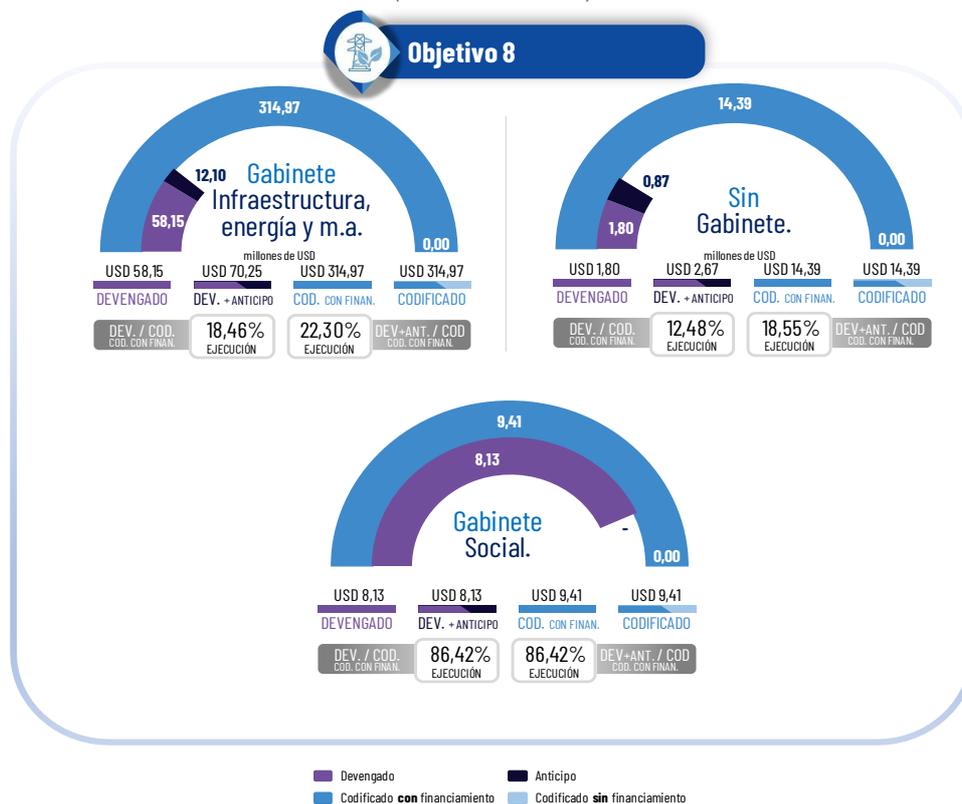

Fuente: SIPeIP, SNP. e-SIGEF, MEF- Ejecución Presupuestaria. Corte 30 de junio de 2025.
Elaboración: Dirección de Seguimiento a la Inversión – SNP.

Así, se evidencia que la entidad del Gabinete Social presenta la mayor ejecución presupuestaria en el Objetivo 8, alcanzando un 86,42%, correspondiente a 1 proyecto de inversión. Mientras que las entidades del Gabinete Sectorial de Infraestructura, Energía y Medio Ambiente alcanzan una ejecución presupuestaria del 22,30%, correspondiente a 36 proyectos de inversión. A continuación, le sigue la entidad sin Gabinete, alcanzando un 18,55%, correspondiente a 1 proyecto de inversión.

Tabla 56. Cumplimiento presupuestario por gabinete sectorial en 2025 – Objetivo 8

Gabinete Sectorial	Número de Entidades	Número de Proyectos	% Ejecución presupuestaria	
			Devengado / Codificado	Devengado más anticipos / Codificado con fuente
Infraestructura, Energía y Medio Ambiente	3	36	18,46%	22,30%
Sin Gabinete	1	1	12,48%	18,55%
Social	1	1	86,42%	86,42%
Total	5	38		

Fuente: SIPeIP - SNP. e-SIGEF, MEF– Ejecución Presupuestaria. Corte 30 de junio de 2025.

Elaboración: Dirección de Seguimiento a la Inversión – SNP.

Para obtener información detallada sobre las entidades, se recomienda revisar el Anexo 2, que contiene la matriz resumen con datos sobre el avance presupuestario y físico.

7.8.2. Avance Físico de la Planificación Institucional

Las 12 entidades que cumplieron con el proceso de registro y sistematización de su planificación institucional y cuentan con indicadores alineados al objetivo 8, sujetos a seguimiento (mensuales y trimestrales), registran 34 objetivos institucionales y 59 indicadores estratégicos. En este sentido, se identifica que, el 83,05% presentan un avance esperado, el 6,78% presenta un avance cercano al esperado, el 10,17% presenta un avance menor al esperado, conforme el detalle que se establece a continuación:

Tabla 57. Ejecución Indicadores Institucionales – Objetivo 8

Entidad	Número Indicadores	Avance esperado 		Avance cercano al esperado 		Avance menor a lo esperado 	
		Indicadores	%	Indicadores	%	Indicadores	%
Agencia Nacional de Tránsito	4	2	50,00%	1	25,00%	1	25,00%
Autoridad Portuaria de Esmeraldas	4	2	50,00%	1	25,00%	1	25,00%
Autoridad Portuaria de Guayaquil	6	4	66,67%	0	0,00%	2	33,33%
Autoridad Portuaria de Manta	3	2	66,67%	0	0,00%	1	33,33%
Autoridad Portuaria de Puerto Bolívar	10	10	100,00%	0	0,00%	0	0,00%
Agencia de Regulación y Control de las Telecomunicaciones	2	2	100,00%	0	0,00%	0	0,00%
Consejo de Gobierno del Régimen Especial de Galápagos	1	1	100,00%	0	0,00%	0	0,00%
Comisión de Tránsito del Ecuador	8	6	75,00%	1	12,50%	1	12,50%
Dirección General de Aviación Civil	6	5	83,33%	1	16,67%	0	0,00%
Ministerio de Telecomunicaciones y de la Sociedad de la Información	6	6	100,00%	0	0,00%	0	0,00%
Ministerio de Transporte y Obras Públicas	7	7	100,00%	0	0,00%	0	0,00%
Servicio Público para pago de Accidentes de Tránsito	2	2	100,00%	0	0,00%	0	0,00%
Total	59	49	83,05%	4	6,78%	6	10,17%

Fuente: SNP, SIPeIP corte 30 de junio de 2025. GPR corte 30 de junio de 2025.

Elaboración: Dirección de Seguimiento a la Planificación y Política Pública – SNP.

Principales Logros

Ministerio de Transporte y Obras Públicas

- 19 visitas técnicas fueron realizadas a proyectos prioritarios que ejecuta el Ministerio a escala nacional entre los cuales constan: Paso Lateral de Guaranda, El Domo-Curipamba en la Provincia de Bolívar; Construcción de vías de acceso hacia el Viaducto Sur en Guayas; Construcción de puentes vehiculares sobre los ríos Shushufindi, La Norte, Quilindaña y Eno en Sucumbíos; Autopista Cuenca-Azogues-Biblián, Cuenca-Molleturo-El Empalme en Azuay y la vía colectora E25-E59 y del Cambio - y de Corralitos-Pasaje en El Oro.
- 4 buques que prestan el servicio de transporte marítimo de carga en la ruta establecidas desde Ecuador Continental hacia la provincia de Galápagos, fueron inspeccionadas por el Ministerio de Transporte y Obras Públicas.
- 7 actas suscritas de Obra Pública que incluyen 9 obras: un Centro de Salud tipo C en Cañar, un Centro de Salud tipo B en El Oro, Edificio Correos Guayaquil en Guayas, 3 Centros Infantil del Buen Vivir en Los Ríos, Catedral de Guaranda en Bolívar, Velódromo en Zamora Chinchipe y Galpón de Correos Quito en Pichincha.

Comisión de Tránsito del Ecuador

- 137,86 fue la tasa acumulada obtenida, por siniestro de tránsito por cada 100 kilómetros de vía, como resultado de los controles operativos de tránsito efectuados, campañas de concientización ciudadana (1.081 capacitaciones y 1.479 activaciones) y la ejecución de 2.413 operativos conjuntos en las vías de las provincias bajo jurisdicción operativa de la Comisión de Tránsito del Ecuador (Guayas, Santa Elena, El Oro, Los Ríos, Azuay, Santo Domingo y Manabí).
- 142,56 fue la tasa acumulada registrada por morbilidad por siniestro de tránsito por cada 100 kilómetros de vía.
- 131,02 fue la tasa acumulada alcanzada en siniestros de tránsito por cada 100.000 habitantes.
- 144,25 fue la tasa acumulada de morbilidad por siniestro de tránsito por cada 100.000 habitantes
- 3.007 causas basales fueron determinadas en siniestros de tránsito investigado por la Oficina de Investigación de Accidentes de Tránsito de enero a junio de 2025, alcanzando el 100,00% del indicador establecido.

Dirección General de Aviación Civil

- 22 peticiones relacionadas con permisos de operación para servicios de trabajos aéreos fueron tramitadas en el periodo abril-junio de 2025.
- 2 enmiendas a las Regulaciones de Aviación Civil 210 y 211 fueron resueltas, mediante la Sesión Ordinaria No. 002/2025 (decisión de no modificar la Regulaciones de Aviación Civil 210) y la resolución DGAC-DGAC-2025-0038-R, a nivel nacional.
- 365 certificaciones emitidas por la Dirección de Seguridad de la Aviación y Facilitación del Transporte Aéreo en abril-junio de 2025, sumando un total acumulado de 3.065 certificaciones del personal Aviation Security de la industria aérea (guardias, agentes, supervisores, jefes e instructores), equivalente al 1,13% del resultado nacional acumulado.
- 99,98% de operación normal promedio en los aeropuertos nacionales durante el periodo de abril-junio de 2025, superando la meta mensual establecida, a pesar de cierres temporales de pistas por mantenimiento en varios aeropuertos.

Agencia Nacional de Tránsito

- 21,50% al 17,06% de inspecciones planificadas fueron cumplidas mediante la ejecución de visitas técnicas, logrando verificar que 89 escuelas cumplen con la normativa legal vigente, a nivel nacional.
- 68% de inspecciones planificadas fueron cumplidas mediante la ejecución de visitas técnicas, con 89 escuelas verificadas que cumplen la normativa legal vigente, a nivel nacional.
- 340 inspecciones fueron realizadas a operadoras de transporte en terminal terrestre y domicilio, donde el 54% de las operadoras verificadas cumplen con la normativa legal vigente, a nivel nacional.

Ministerio de Telecomunicaciones y de la Sociedad de la Información

- 149 empresas autoevaluadas en madurez digital, con datos disponibles en el Dashboard del Observatorio Ecuador Digital. Esta información es proporcionada por la Escuela Superior Politécnica del Litoral, administradora de la herramienta Chequeo Digital. Durante este semestre, se trabajó con Escuela Superior Politécnica del Litoral y el Ministerio de Producción, Comercio Exterior e Inversiones en la elaboración de una hoja de ruta para la socialización nacional de esta herramienta en 2025. Además, se colaboró con el Instituto Nacional de Economía Popular y Solidaria para medir el nivel de madurez digital de sus asociadas y se realizaron intervenciones en territorio en Santo Domingo y Pichincha (Conocoto, Colinas del Norte, San Martín de Porras, Cayambe y Alóag).
- 13.741 personas capacitadas en habilidades digitales en lo que va del año. Solo en el segundo trimestre de 2025 (abril a junio), se capacitó a 7.568 niños, niñas y jóvenes a nivel nacional en Tecnologías de la Información y Comunicación Tecnologías de la Información y Comunicación, mediante cursos y plataformas en línea, fomentando el pensamiento computacional, la programación y el desarrollo de competencias clave del siglo XXI.
- 3.796 personas capacitadas en Tecnologías de la Información y la Comunicación (dato hasta mayo 2025), incluyendo 77 capacitaciones presenciales en Santo Domingo, Quito y Mejía, realizadas por el equipo técnico de la Dirección de Fomento de la Economía Digital. Estas formaciones estuvieron enfocadas en sectores empresariales, emprendimientos, microempresas y MiPymes, con temáticas como transformación digital, industria 4.0, comercio electrónico, ciberseguridad y tecnologías emergentes.
- Cursos básicos de ofimática, navegación web y correo electrónico implementados, beneficiando a usuarios de los Puntos Digitales Gratuitos a nivel nacional, fortaleciendo habilidades digitales básicas para la inclusión y productividad en zonas rurales y urbanas.
- Capacitación en herramientas digitales avanzadas ejecutada, mediante cursos en Inteligencia Artificial, seguridad digital, Search Engine Optimization e Internet of Things, a través de los Puntos Digitales Gratuitos, fortaleciendo la capacidad de operar de forma segura y eficiente en entornos digitales.
- Programas especializados diseñados e implementados en desarrollo de software, Big Data e Internet of Things, orientados a fomentar la innovación, mejorar la empleabilidad y reducir la brecha digital desde los Puntos Digitales Gratuitos en todo el país.

Agencia de Regulación y Control de las Telecomunicaciones

- 127 trámites de otorgamiento de red privada dentro del tiempo establecido fueron atendidos, mediante la gestión oportuna de solicitudes ingresadas por los usuarios a nivel nacional, lo cual promueve el desarrollo del sector e incentiva la inversión en telecomunicaciones.
- 545 trámites de administración de títulos habilitantes fueron gestionados, relacionados con servicios comunales, troncalizados, segmento espacial, redes privadas y radiodifusión de

señal abierta, mediante atención técnica especializada a nivel nacional.

Operador Nacional de Electricidad

- 7 iniciativas desarrolladas sobre sistemas de potencia y redes inteligentes mediante actualización de herramientas especializadas, generando modelos para pronóstico de caudales y curvas QV.
- 99,94% de abastecimiento en el primer semestre 2025 con coordinación de acciones ante 316 fallas en Ecuador y 22 en Colombia, gestionando salidas de bloques de generación desde el centro de control del Sistema Nacional Interconectado.
- 14 requerimientos atendidos con gestión de licencias demo en servidores de Sistema de Monitoreo de Área Amplia y migración a nuevo hardware.
- 5.110,1 MW se alcanzó para abastecer la demanda nacional y se transfirió 489,9 MW en exportaciones. La generación total alcanzó 16.717,7 GWh, con una participación renovable del 82,9% y 82,3% en generación hidroeléctrica, mientras que la generación térmica representó el 15,4%.

Autoridad Portuaria de Puerto Bolívar

- 38 minutos promedio de operación de atraque por buque en junio, desde el inicio hasta el final de atraque. Este indicador refleja la eficiencia operativa en la gestión de muelles del Terminal Marítimo de Puerto Bolívar, bajo coordinación del Gestor Privado.
- 8 horas promedio de disponibilidad por atracadero, lo que evidencia una mejora en la utilización de la infraestructura portuaria de la Autoridad Portuaria de Puerto Bolívar.
- 62 toneladas métricas adicionales manejadas en junio, superando la meta establecida, como resultado del desempeño operativo del Gestor Privado en el manejo de carga en el Terminal Marítimo de Puerto Bolívar.
- 1 hora promedio de espera por buque para atracar, evidenciando un proceso de programación de muelles eficaz y una reducción en los tiempos de espera portuaria.

Autoridad Portuaria de Guayaquil

- 0 retrasos reportados en las maniobras de traslado de capitanes prácticos durante el periodo de enero a junio de 2025, garantizando la operatividad normal dentro de la jurisdicción de la Autoridad Portuaria de Guayaquil.
- 100,00% de los incidentes reportados en el área no concesionada fueron atendidos durante el segundo trimestre de 2025, respaldados por la Orden de Compra No. CE-20240002729889, vigente hasta el 13 de octubre de 2025, en el marco de la prestación del Servicio de Seguridad.

Autoridad Portuaria de Manta


- 440 metros lineales habilitados para las descargas de pesca que se realiza diariamente en el Terminal Pesquero y Cabotaje de Autoridad Portuaria de Manta.
- 96,00% en acciones sobre gestión ambiental realizadas, que incluye actividades de monitoreo y seguimiento en manejo de desechos no peligrosos, así como mitigación de impactos ambientales negativos en el Terminal Pesquero y de Cabotaje de Autoridad Portuaria de Manta.

7.8.3. Avance Físico Proyectos de Inversión

El Objetivo 8 cuenta con 38 proyectos de inversión ejecutados por 5 entidades. El monto codificado total asciende a USD 338,77 millones, con un devengado de USD 68,08 millones, lo que representa una ejecución presupuestaria del 20,10%. Considerando anticipos, la ejecución asciende al 23,92%, con un monto devengado más anticipo de USD 81,05 millones frente al codificado con fuente. Cabe resaltar que el Ministerio de Transporte y Obras Públicas concentra el 90,10% del presupuesto codificado (USD 305,24 millones) y ejecuta el 89,47% de los proyectos (34 de 38).

En cuanto al avance físico, este objetivo registra un cumplimiento del 17,09% respecto de las metas anuales programadas, con un nivel promedio de cumplimiento del 58,78% al segundo semestre, lo que indica un “*avance menor al esperado*”. Se destaca el Ministerio de Telecomunicaciones y de la Sociedad de la Información – MINTEL, quien registra 1 proyecto que alcanzó el 100,00% de cumplimiento de sus metas físicas programadas.

Ilustración 58. Gasto No Permanente, avance físico promedio y avance presupuestario - Objetivo 8

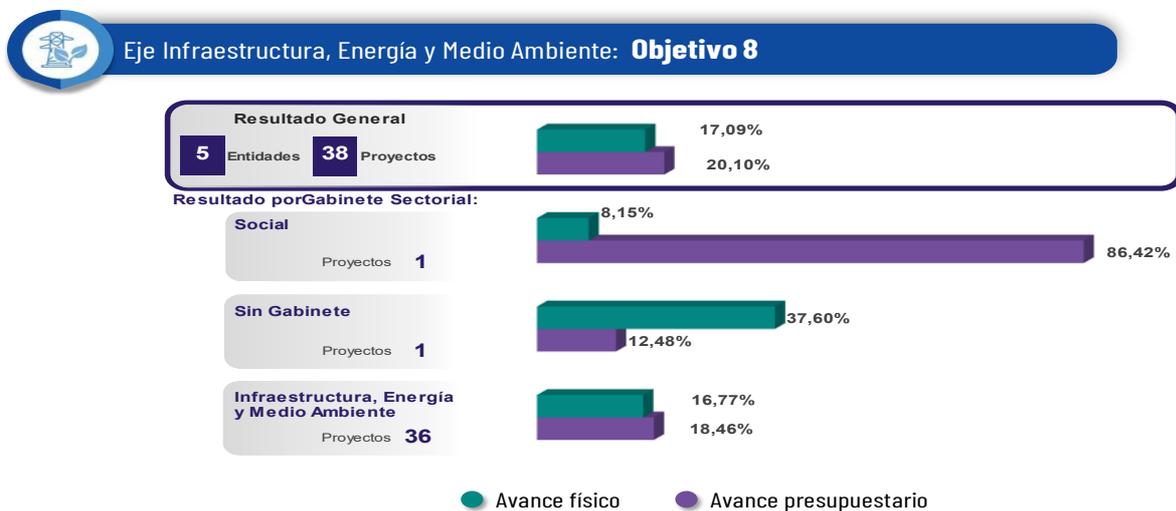

Fuente: SIPeIP, SNP. e-SIGEF, MEF- Ejecución Presupuestaria. Corte 30 de junio 2025.

Elaboración: Dirección de Seguimiento a la Inversión – SNP.

A continuación, se detalla el cumplimiento físico de los proyectos de inversión por gabinetes sectoriales relacionados con el Objetivo 8, lo que permite identificar los niveles de ejecución alcanzados por cada sector en relación con las metas físicas programadas.

Tabla 58. Cumplimiento físico por gabinete – Objetivo 8

Gabinete Sectorial	Número de Entidades	Número de Proyectos	Número de proyectos por nivel de cumplimiento			
			●	●	●	●
Infraestructura, Energía y Medio Ambiente	3	36	8	0	9	19
Sin Gabinete	1	1	0	1	0	0
Social	1	1	1	0	0	0
Total	5	38	9	1	9	19

Nota: ● Avance esperado ≥ 95% y < 100% / ● Avance cercano al esperado ≥ 85% y < 95% / ● Avance menor al esperado < 85% / ● Proyecto sin programación de metas.

Fuente: SIPeIP, SNP. e-SIGEF, MEF- Ejecución Presupuestaria. Corte 30 de junio de 2025.

Elaboración: Dirección de Seguimiento a la Inversión – SNP.

Para conocer más información acerca de las entidades, por favor revisar el Anexo 2, que contiene la matriz resumen con información de avance presupuestario y físico.

A continuación, se presenta la información de ejecución de los principales proyectos de inversión que contribuyen a este objetivo:

Causas y Logros

Ministerio de Transporte y Obras Públicas

El Ministerio de Transporte y Obras Públicas registró un monto codificado de inversión de USD 305,24 millones para el segundo trimestre de 2025, con un monto devengado de USD 58,15 millones, lo que representa una ejecución presupuestaria del 19,05%. Al considerar el devengado más anticipos en relación con el codificado con fuente, la ejecución alcanza el 23,01%.

La entidad presentó 34 proyectos alineados al Objetivo 8, de los cuales 17 cuentan con programación de metas físicas al segundo trimestre. Entre estos, 8 alcanzaron el 100,00% de cumplimiento físico.

Tabla 59. Avance Físico de Proyectos de Inversión al Segundo Trimestre Ministerio de Transporte y Obras Públicas– Objetivo 8

Nombre del proyecto	Programación metas físicas (a)	Ejecución metas físicas (b)	Cumplimiento metas físicas c(b/a)	Codificado (MM USD) (d)	Devengado (MM USD) (e)	Ejecución presupuestaria a 2025 f (d/e)	Devengado + anticipos /codificado con fuente (g)
Adecuación, Logística y Montaje del Puente Prefabricado sobre el Río Blanco	6,61%	0,00%	● 0,00%	0,60	0,60	100,00%	100,00%
Construcción de la Plaza Memorial San Gregorio del Cantón Portoviejo Provincia de Manabí	0,00%	0,00%	● 0,00%	8,75	8,75	100,00%	100,00%
Construcción de Mercado Municipal de Calceta Cantón Bolívar de la Provincia de Manabí	12,00%	0,00%	● 0,00%	3,64	0,00	0,00%	0,00%
Construcción de Obras de Conectividad Vial Sobre el Río Upano Ubicado en la Carretera Troncal Amazónica E45, Tramo Macas a Puyo Provincia de Morona Santiago de 1023,83 M de Longitud, Incluye la Construcción de Tres Puentes y Sus Accesos	6,25%	6,25%	● 100,00%	0,21	0,21	100,00%	100,00%
Construcción de Puentes en la Red Vial Estatal de la Vía Coca-Dayuma Provincia de Orellana: Florida, Condor, Indillama, Jandiyacu, Salado Alto, Salado Bajo (Obra y Fiscalización)	10,00%	0,00%	● 0,00%	9,17	0,00	0,00%	29,70%
Construcción de vías de acceso hacia el Viaducto Sur Provincia del Guayas	0,00%	18,31%	● 0,00%	21,92	0,00	0,00%	0,00%
Construcción del Distribuidor de Tráfico 12 de octubre en la Autopista Cuenca Azogues Biblián, Ubicado en la Provincia del Azuay	0,00%	0,00%	● 0,00%	11,60	0,00	0,00%	0,00%



Nombre del proyecto	Programación metas físicas (a)	Ejecución metas físicas (b)	Cumplimiento metas físicas c(b/a)	Codificado (MM USD) (d)	Devengado (MM USD) (e)	Ejecución presupuestari a 2025 f (d/e)	Devengado + anticipos /codificado con fuente (g)
Construcción del Distribuidor de Tráfico Gapal en la Autopista Cuenca-Azogues-Biblián, Ubicado en la Provincia del Azuay	0,00%	0,00%	● 0,00%	8,32	0,00	0,00%	0,00%
Construcción del Distribuidor de Tráfico Monay-IESS en la Autopista Cuenca-Azogues-Biblián, Ubicado en la Provincia del Azuay	0,00%	0,00%	● 0,00%	14,73	0,00	0,00%	0,00%
Construcción del Nuevo Puente Cornelio Davalos Salsipuedes Ubicado en la Carretera Balbanera - Pallatanga – Cumanda	0,00%	0,00%	● 0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00%
Construcción del paso lateral Babahoyo - Jujan, hasta el límite provincial con Guayas, que incluye puente de 70 m sobre el río Los Amarillos	0,00%	0,00%	● 0,00%	6,90	6,90	100,00%	100,00%
Construcción del puente Lodana en la E-462 B, de la Vía Portoviejo-Santa Ana-Honorato Vásquez, Provincia de Manabí	16,35%	19,23%	● 100,00%	7,49	0,16	2,20%	13,21%
Construcción Del Puente Quimis, Ubicado En El Sector Quimis, De La Carretera Montecristi-Jipijapa, Provincia de Manabí.	23,12%	23,12%	● 100,00%	6,99	0,03	0,36%	11,46%
Construcción y Fiscalización del Paso Lateral de Guaranda y Ambato.	20,35%	15,00%	● 73,71%	9,84	3,02	30,72%	30,72%
La rehabilitación de la vía RVE E 485 Baba - Tres Marías, que incluye el paso lateral de Baba y el acceso occidental, está ubicada en el cantón Baba, provincia de Los Ríos.	0,00%	0,00%	● 0,00%	3,29	0,00	0,00%	0,00%
Mantenimiento y Rehabilitación de la E15 Bolívar de 4.487 Km Ubicada en la Parroquia Bolívar del Cantón Muisne	0,00%	0,00%	● 0,00%	2,72	2,72	100,00%	100,00%
Mejoramiento de 5 carreteras pertenecientes a la Red Vial Provincial del Carchi (Gruta De Fátima - Casa Grande)	20,01%	0,00%	● 0,00%	3,86	3,86	100,00%	100,00%
Mejoramiento del Sistema de agua potable de la ciudad de Muisne	0,00%	0,00%	● 0,00%	5,31	5,31	100,00%	100,00%
Programa de Conservación por Niveles de Servicio	25,79%	25,79%	● 100,00%	38,96	8,34	21,40%	22,34%
Programa Nacional de Conservación de la Red Vial Estatal	11,54%	11,54%	● 100,00%	29,22	8,91	30,50%	42,34%
Proyecto de Atención Resiliente ante Emergencias Viales	14,43%	0,00%	● 0,00%	45,09	0,21	0,46%	0,46%
Proyecto de Reconstrucción de	0,00%	0,00%	● 0,00%	2,48	2,48	100,00%	100,00%



Nombre del proyecto	Programación metas físicas (a)	Ejecución metas físicas (b)	Cumplimiento metas físicas c(b/a)	Codificado (MM USD) (d)	Devengado (MM USD) (e)	Ejecución presupuestari a 2025 f (d/e)	Devengado + anticipos /codificado con fuente (g)
Obras por el Terremoto 2016							
Reconstrucción de la carretera Chontaduro - Chumunde de 17.0 Km de longitud ubicada en el cantón Rioverde Provi	0,00%	0,00%	● 0,00%	6,58	0,00	0,00%	53,81%
Reconstrucción de la Infraestructura Afectada y Desaparecida por el Deslave en el Sector Tambán, Incluyendo la Rehabilitación del Tramo de la Vía Chimbo Cristal En La Abscisa 1+800 y la Estabilidad de los Taludes	0,00%	0,00%	● 0,00%	2,11	0,00	0,00%	0,00%
Rectificación y Apertura de la Vía E29 Tramo las Golondrinas - Saguangal de 62 Km de Longitud Ubicada en la Provincia de Imbabura Incluye la Construcción de 10 Puentes	3,32%	0,00%	● 0,00%	0,85	0,00	0,00%	0,00%
Rehabilitación de la Vía Rve E187, Tramo: Bolívar - el Ángel - Mira - Mascarilla Ubicada en la Provincia del Carchi, Fase I	3,96%	3,96%	● 100,00%	0,08	0,05	62,35%	62,35%
Rehabilitación de la Vía RVE E-484 Palestina-Macul-Vinces, ubicada en los cantones Palestina y Vinces, Provincia del Guayas y Los Ríos	0,00%	0,00%	● 0,00%	8,80	0,00	0,00%	0,00%
Rehabilitación de los sitios críticos de la Red Vial Estatal E20, Tramo Esmeraldas - Quinindé de la Provincia de Esmeraldas	0,00%	0,00%	● 0,00%	3,69	0,00	0,00%	0,00%
Rehabilitación del Corredor Arterial E 15. Tramo la Entrada Manta	23,72%	12,51%	● 52,74%	5,66	1,94	34,36%	34,36%
Rehabilitación del Sistema Hidrosanitario de la Ciudad de Chone Fase 2 - Reconstrucción de colector Magaly Mass	100,00%	100,00%	● 100,00%	1,40	1,40	100,00%	100,00%
Rehabilitación del sistema hidrosanitario de la ciudad de Chone, provincia de Manabí – Fase III, componente agua potable: construcción de la línea de aducción, repotenciación de la planta de tratamiento de agua potable, reconstrucción y ampliación de la red de distribución	0,00%	0,00%	● 0,00%	24,16	0,00	0,00%	0,00%
Rehabilitación en la Vía E15 de Los Tres Sitios Críticos Denominados las Piñas la Resbalosa E Ingreso A Santa Rosa, Ubicado en el Cantón Manta Provincia de Manabí.	0,00%	0,00%	● 0,00%	0,01	0,01	100,00%	100,00%

Nombre del proyecto	Programación metas físicas (a)	Ejecución metas físicas (b)	Cumplimiento metas físicas c(b/a)	Codificado (MM USD) (d)	Devengado (MM USD) (e)	Ejecución presupuestaria a 2025 f (d/e)	Devengado + anticipos /codificado con fuente (g)
Rehabilitación Funcional Del Corredor Vial E25 Buena Fe - Jujan, Construcción De Carriles De Rebasamiento En El Tramo Quevedo - San Juan Y Ampliación A 4 Carriles Del Tramo San Juan - Babahoyo, En La Provincia De Los Ríos	3,97%	14,87%	● 100,00%	10,79	3,25	30,13%	33,84%
Rehabilitación y mejoramiento de la carretera Vilcabamba Yagana Palanda Bellavista Zumba La Balsa Tramo Bellavista Zumba La Balsa	50,00%	0,00%	● 0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00%
Total							23,01%

Nota: ● Avance esperado $\geq 95\%$ y $< 100\%$ / ● Avance cercano al esperado $\geq 85\%$ y $< 95\%$ / ● Avance menor al esperado $< 85\%$ / ● Proyecto sin programación de metas.

Fuente: SIPeIP - SNP. e-SIGEF - MEF- Ejecución Presupuestaria. Corte 30 de junio de 2025.

Elaboración: Dirección de Seguimiento a la Inversión – SNP.

El Ministerio de Transporte y Obras Públicas reporta las siguientes acciones:

Proyecto Construcción de Obras de Conectividad Vial Sobre el Rio Upano Ubicado en la Carretera Troncal Amazónica E45, Tramo Macas a Puyo Provincia de Morona Santiago de 1023,83 M de Longitud, Incluye la Construcción de Tres Puentes y Sus Accesos

Al segundo trimestre de 2025, el proyecto registra un monto codificado de USD 0,21 millones y una ejecución presupuestaria acumulada del 100,00%. Entre los principales logros reportados por la entidad se destaca: la finalización del proyecto y la suscripción del acta de recepción provisional el 27 de junio de 2025.

La entidad reporta como causa de los retrasos en el cierre del proyecto el trámite pendiente de las planillas correspondientes a diciembre de 2024 y a los tres primeros meses de 2025, así como la necesidad de gestionar la asignación de USD 3,9 millones para la liquidación de los contratos de obra y fiscalización. Adicionalmente, para proceder con la recepción definitiva, es preciso subsanar las observaciones señaladas en el acta de recepción provisional. Se recomienda priorizar la tramitación de pagos y asignaciones presupuestarias, así como la atención oportuna a las observaciones, a fin de garantizar el cierre técnico y financiero en los plazos previstos.

Proyecto Construcción del puente Lodana en la E-462 B, de la Vía Portoviejo-Santa Ana-Honorato Vásquez, Provincia de Manabí

Al segundo trimestre de 2025, el proyecto registra un monto codificado de USD 7,49 millones y una ejecución presupuestaria acumulada considerando anticipos del 13,21%. Entre los principales logros reportados por la entidad se encuentran: la culminación de la superestructura del primer tramo del puente aguas arriba, mediante la colocación de seis vigas prefabricadas; así como la ejecución de obras preliminares, como la instalación de campamentos y movimientos de tierra.

La entidad reporta como causa que limita el normal desarrollo de los trabajos la necesidad de liberar varios terrenos afectados, para lo cual se continúa gestionando la respectiva declaratoria de utilidad pública. Se recomienda agilizar las gestiones legales y de coordinación interinstitucional para asegurar la disponibilidad oportuna de los terrenos y avanzar conforme al cronograma previsto, considerando que el proyecto beneficiará a aproximadamente 32.950 personas.

Proyecto Construcción Del Puente Quimis, Ubicado En El Sector Quimis, De La Carretera Montecristi-Jipijapa, Provincia de Manabí

Al segundo trimestre de 2025, el proyecto registra un monto codificado de USD 6,99 millones y una ejecución presupuestaria acumulada considerando anticipos del 11,46%. Entre los principales logros reportados por la entidad se encuentran: la construcción de una variante provisional para garantizar el tránsito vehicular y el inicio de trabajos del primer tramo del puente.

La entidad reporta la necesidad de liberar varios terrenos afectados, motivo por el cual continúa el trámite para la declaratoria de utilidad pública. Se recomienda priorizar las gestiones interinstitucionales y legales necesarias para agilizar este proceso, a fin de asegurar que los beneficios previstos alcancen oportunamente a las aproximadamente 48.306 personas beneficiarias.

Proyecto Programa de Conservación por Niveles de Servicio

Al segundo trimestre de 2025, el proyecto registra un monto codificado de USD 38,96 millones y una ejecución presupuestaria acumulada considerando anticipos del 22,34%. Entre los principales logros reportados por la entidad se encuentran: la suscripción de contratos de obra y fiscalización del tramo Balbanera-Pallatanga-Cumandá (Chimborazo), así como la continuidad en la ejecución de corredores viales en las provincias de Esmeraldas, Chimborazo, Manabí, Cañar, Napo y Orellana.

La entidad reporta como causa de los retrasos la asignación pendiente de recursos para el pago de obra y fiscalización por USD 2,56 millones, así como los USD 11,76 millones requeridos para el anticipo e inicio de obra del tramo Balbanera-Pallatanga (Chimborazo), contratado el 19 de junio de 2025. Se recomienda gestionar de manera prioritaria la liberación de estos recursos, a fin de iniciar la ejecución según lo planificado y garantizar que los beneficios proyectados alcancen oportunamente a las aproximadamente 3.088.135 personas beneficiarias.

Proyecto Programa Nacional de Conservación de la Red Vial Estatal

Al segundo trimestre de 2025, este proyecto cuenta con un monto codificado de USD 29,22 millones y una ejecución presupuestaria acumulada considerando anticipos del 42,34%. Como parte de sus principales logros, la entidad destaca: la atención de emergencias viales en diversas provincias del país (Guayas, Los Ríos, Manabí, El Oro, Esmeraldas, Santa Elena, Loja, Azuay, Pichincha, Chimborazo, Cotopaxi y Bolívar) durante los meses de marzo a junio de 2025.

La entidad reporta como causa la necesidad de gestionar ante las autoridades el incremento del techo presupuestario del Programa, a fin de cubrir los requerimientos de ejecución previstos. Se recomienda priorizar esta gestión para asegurar el cumplimiento de las metas y garantizar que los beneficios proyectados alcancen de manera oportuna a las aproximadamente 18.061.453 personas beneficiarias.

Proyecto Rehabilitación de la Vía RVE E187, Tramo: Bolívar - el Ángel - Mira - Mascarilla Ubicada en la Provincia del Carchi, Fase I

Al segundo trimestre de 2025, este proyecto cuenta con un monto codificado de USD 0,08 millones y una ejecución presupuestaria acumulada del 62,35%. Como parte de sus principales logros, la entidad destaca: este proyecto se encuentra finalizado y ejecutado al 100,00%. Al segundo trimestre de 2025, el contratista presentó, mediante Oficio No. CMM-MTOP-SZ1-1-1280625 de fecha 28 de junio de 2025, la solicitud formal para la suscripción del Acta de Recepción Definitiva. Esta intervención ha mejorado sustancialmente la conectividad en la provincia del Carchi, beneficiando de manera directa a 26.560 personas.

Proyecto Rehabilitación del Sistema Hidrosanitario de la Ciudad de Chone Fase 2 - Reconstrucción de colector Magaly Mass

Al segundo trimestre de 2025, este proyecto cuenta con un monto codificado de USD 1,40 millones y una ejecución presupuestaria acumulada del 100,00%. Como parte de sus principales logros la entidad destaca: El proyecto fue ejecutado al 100,00% tanto en el componente físico como presupuestario, beneficiando directamente a 60.418 habitantes del cantón Chone. Recursos corresponden a transferencia de fondos efectuada de conformidad a la Adenda No. 1 del Convenio Subsidiario de Cooperación Interinstitucional entre el MTOP y el GAD Municipal del cantón Chone, para la ejecución del subproyecto denominado: “*Rehabilitación del sistema hidrosanitario de la ciudad de Chone, provincia de Manabí, Fase 2*”, suscrita el 9 de abril del 2025.

Proyecto Rehabilitación Funcional Del Corredor Vial E25 Buena Fe - Jujan, Construcción De Carriles De Rebasamiento En El Tramo Quevedo - San Juan y Ampliación A 4 Carriles Del Tramo San Juan - Babahoyo, En La Provincia De Los Ríos

Al segundo trimestre de 2025, este proyecto registra un monto codificado de USD 10,79 millones y una ejecución presupuestaria acumulada considerando anticipos del 33,84%. Como parte de sus principales logros, la entidad destaca: avance en la construcción de los carriles de rebasamiento número 4 y número 3 con una longitud total de 4,2 km, y la colocación de carpeta asfáltica en los sectores Ventanas y Puebloviejo. Esta intervención contribuye a mejorar la movilidad y seguridad vial en la provincia de Los Ríos, beneficiando de forma directa a 112.246 personas.

La entidad reporta como causa los retrasos en la distribución y despacho de asfaltos AC-20 y RC-250, originados por problemas en la Refinería de Esmeraldas. Se recomienda fortalecer la coordinación con la planta de producción y explorar fuentes de abastecimiento alternativas para evitar afectaciones en los cronogramas de obra.



Eje Institucional



EJE Institucional

Objetivo 9

7.9. OBJETIVO 9: Propender la construcción de un Estado eficiente, transparente y orientado al bienestar social.


Este Objetivo busca propender la construcción de un Estado eficiente, transparente y orientado al bienestar social. Contribuye a la consolidación de una institucionalidad robusta en el país que dinamice los servicios públicos y mejore los mecanismos de participación ciudadana, rendición de cuentas, gobernabilidad y coordinación interinstitucional. Además, pretende ampliar las oportunidades de cooperación internacional basándose en la cooperación Sur-Sur y la participación activa en foros multilaterales.

Con base en la gestión desarrollada por el Estado a través de la implementación de sus planes institucionales, estudios, programas y proyectos durante el segundo trimestre del 2025, a continuación, se detallan los resultados alineados a este Objetivo:

7.9.1. Gestión Presupuestaria

Para el cumplimiento de las metas del Objetivo 9, se devengó un total de USD 1.112,05 millones en el segundo trimestre del 2025, de los cuales, el 85,70% corresponde a **Gasto Permanente** con un monto devengado de USD 953,05 millones; y, la diferencia corresponde al **Gasto No Permanente** vinculado a estudios, programas y proyectos de inversión, de diferentes entidades, con un monto devengado de USD 159,00 millones.

Ilustración 59. Gasto Permanente y No Permanente en 2025 – Objetivo 9 (millones de dólares)



Fuente: SIPeIP, SNP. e-SIGEF, MEF- Ejecución Presupuestaria. Corte 30 de junio de 2025.

Elaboración: Dirección de Seguimiento a la Planificación y Política Pública y Dirección de Seguimiento a la Inversión –SNP.

Por su parte, la ejecución presupuestaria del **Gasto No Permanente** destinado al Objetivo 9, considerando el monto devengado más anticipos entregados en el periodo (USD 164,61 millones), frente al monto codificado con fuente de financiamiento (USD 327,62 millones), alcanza un nivel de ejecución del 50,24%.

Ilustración 60. Ejecución: Devengado más anticipos en relación al codificado con fuente – Objetivo 9 (millones de dólares)




Fuente: SIPeIP -SNP, e-SIGEF - MEF- Ejecución Presupuestaria. Corte 30 de junio de 2025.
Elaboración: Dirección de Seguimiento a la Inversión – SNP.

A continuación, se detallan los montos correspondientes al **Gasto Permanente** y **Gasto No Permanente** que fueron ejecutados, alineados al Objetivo 9, en función de los gabinetes sectoriales establecidos para la gestión institucional.

En **Gasto Permanente**, las entidades clasificadas en Sin Gabinete son las que más recursos ejecutaron en este Objetivo con un monto devengado de USD 310,70 millones, conforme la siguiente ilustración:

Ilustración 61. Gasto Permanente por Gabinete Sectorial en 2025 – Objetivo 9 (millones de dólares)

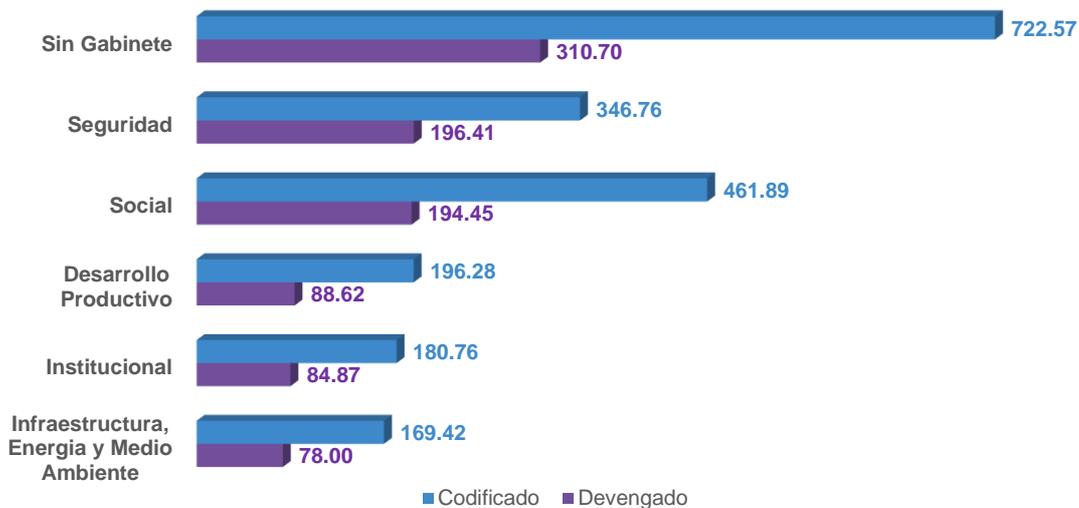

Fuente: Base de datos e-SIGEF, Ejecución Presupuestaria Consolidada –MEF corte al 30 de junio de 2025. Base de alineación al PND segundo trimestre 2025 –SNP, corte 30 de junio de 2025.
Elaboración: Dirección de Seguimiento a la Planificación y Política Pública – SNP.

En relación al **Gasto Permanente** alineado al Objetivo 9, se identifica que se encuentran alineadas 135 entidades, con un presupuesto codificado de USD 2.077,67 millones y un monto devengado de USD 953,05 millones, lo que representa una ejecución presupuestaria del 45,87%. Cabe señalar que, la alineación a este objetivo responde a la directriz de la SNP de homologar la relación del objetivo institucional denominado “*Fortalecer las Capacidades institucionales*” a la meta 9.6.1 del PND²² para todas las entidades pertenecientes al PGE. A continuación, se detalla la ejecución presupuestaria correspondiente al segundo trimestre por institución:

²² Directrices para Planificación Institucional 2025 SIPeIP y GPR, Oficio Nro. SNP-SGP-SPN-2025-0061-OF, Oficio Nro. SNP-SGP-SPN-2025-0062-OF y Oficio Nro. SNP-SGP-SPN-2025-0063-OF, de 3 de febrero de 2025

Tabla 60. Ejecución presupuestaria de las entidades alineadas al Objetivo 9

Gabinete Sectorial	Entidad	Codificado (MM USD)	Devengado (MM USD)	Ejecución (%)
Gabinete Sectorial de Desarrollo Productivo	Instituto Nacional de Investigaciones Agropecuarias	16,07	8,10	50,43%
	Ministerio de Agricultura y Ganadería	23,29	10,56	45,35%
	Ministerio de Producción Comercio Exterior Inversiones y Pesca	9,74	3,98	40,91%
	Ministerio de Turismo	8,76	3,90	44,51%
	Servicio de Acreditación Ecuatoriano	0,52	0,24	45,82%
	Servicio de Rentas Internas	89,19	41,20	46,19%
	Servicio Ecuatoriano de Normalización	2,44	1,18	48,34%
	Servicio Nacional de Aduana del Ecuador	38,71	16,64	42,99%
	Servicio Nacional de Contratación Pública	7,56	2,81	37,20%
Gabinete Sectorial de Infraestructura, Energía y Medio Ambiente	Agencia de Regulación y Control de la Bioseguridad y Cuarentena para Galápagos	1,77	0,79	44,58%
	Agencia de Regulación y Control de las Telecomunicaciones	5,28	2,22	42,03%
	Agencia de Regulación y Control del Agua	1,30	0,54	41,89%
	Agencia de Regulación y Control Fito y Zoonosanitario	13,23	5,99	45,26%
	Agencia Nacional de Regulación y Control del Transporte Terrestre Transito y Seguridad Vial	24,51	10,06	41,07%
	Autoridad Portuaria de Esmeraldas	1,90	0,99	51,85%
	Autoridad Portuaria de Guayaquil	7,39	3,43	46,47%
	Autoridad Portuaria de Manta	1,72	0,95	55,18%
	Autoridad Portuaria de Puerto Bolívar	1,03	0,41	39,49%
	Comisión de Transito del Ecuador	4,67	2,21	47,31%
	Dirección General de Aviación Civil	7,87	3,41	43,29%
	Instituto de Investigación Geológico y Energético	1,70	0,80	46,98%
	Instituto Nacional de Biodiversidad	1,45	0,61	42,26%
	Instituto Nacional de Meteorología e Hidrología	2,05	0,96	46,93%
	Ministerio de Energía y Minas	4,43	2,32	52,42%
	Ministerio de Transporte y Obras Públicas	34,74	16,72	48,14%
	Ministerio del Ambiente Agua y Transición Ecológica	30,44	14,01	46,02%
	Operador Nacional de Electricidad	3,20	0,91	28,42%
	Parque Nacional Galápagos	17,09	9,59	56,09%
	Secretaría Técnica de la Circunscripción Territorial Especial Amazónica	2,19	0,64	29,23%
Servicio Público para pago de Accidentes de Transito	1,46	0,44	29,92%	
Gabinete Sectorial de lo Social	Agencia de Aseguramiento de la Calidad de Servicios de Salud y Medicina Prepagada	1,30	0,58	44,54%
	Agencia Nacional de Regulación Control y Vigilancia Sanitaria	4,72	2,25	47,61%
	Dirección General de Registro Civil Identificación y Cedulación	69,55	21,97	31,58%
	Dirección Nacional de Registros Públicos	7,89	3,94	49,91%
	Instituto Nacional de Donación y Trasplantes de Órganos Tejidos y Células	1,43	0,66	45,83%

Gabinete Sectorial	Entidad	Codificado (MM USD)	Devengado (MM USD)	Ejecución (%)
	Instituto Nacional de Economía Popular y Solidaria	3,52	1,60	45,34%
	Instituto Nacional de Evaluación Educativa	1,04	0,45	42,94%
	Instituto Nacional de Investigación en Salud Pública Dr. Leopoldo Izquieta Pérez	6,80	3,08	45,33%
	Ministerio de Cultura y Patrimonio	7,29	3,04	41,73%
	Ministerio de Desarrollo Urbano y Vivienda	5,34	2,47	46,21%
	Ministerio de Educación	235,55	109,42	46,45%
	Ministerio de Inclusión Económica y Social	47,50	18,43	38,80%
	Ministerio de Salud Pública	32,30	11,29	34,95%
	Ministerio de Telecomunicaciones y de la Sociedad de la Información	6,77	2,65	39,19%
	Ministerio del Deporte	5,61	2,23	39,82%
	Secretaría de Educación Intercultural Bilingüe y la Etnoeducación	3,91	1,77	45,42%
	Secretaría de Educación Superior Ciencia Tecnología e Innovación	14,60	5,57	38,16%
	Secretaría Técnica del Comité de Prevención de Asentamientos Humanos Irregulares	0,48	0,24	48,55%
	Secretaría Técnica Ecuador Crece Sin Desnutrición Infantil	3,56	1,55	43,46%
	Servicio Nacional de Derechos Intelectuales	0,48	0,24	50,97%
	Unidad del Registro Social	1,86	0,84	45,33%
	Unidad Nacional Antidopaje del Ecuador	0,39	0,19	48,07%
	Gabinete Sectorial de Seguridad	Centro de Inteligencia Estratégica	79,58	73,98
Instituto Geográfico Militar		7,43	3,60	48,38%
Ministerio de Defensa Nacional		104,58	54,79	52,39%
Ministerio de Gobierno		50,35	22,78	45,24%
Policía Nacional		67,52	26,63	39,44%
Secretaría Nacional de Gestión de Riesgos		6,42	3,26	50,79%
Servicio Integrado de Seguridad Ecu 911		12,42	5,62	45,27%
Servicio Nacional de Atención Integral a Personas Adultas Privadas de la Libertad y a Adolescentes Infractores		11,67	2,98	25,55%
Servicio Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses		6,80	2,78	40,92%
Gabinete Sectorial Institucional	Instituto Nacional de Estadísticas y Censos	12,22	5,41	44,28%
	Ministerio de Economía y Finanzas	7,63	3,05	39,92%
	Ministerio de Relaciones Exteriores y Movilidad Humana	87,92	41,89	47,65%
	Ministerio del Trabajo	24,65	11,71	47,51%
	Presidencia de la República	34,26	16,41	47,90%
	Secretaría Nacional de Planificación	7,40	3,44	46,44%
	Servicio Ecuatoriano de Capacitación Profesional	6,68	2,97	44,46%
Sin Gabinete	Casa de Montalvo	0,12	0,05	45,59%
	Casa Militar Presidencial	3,50	2,03	57,85%
	Centro Interamericano de Artesanías y Artes Populares	0,38	0,18	47,01%

Gabinete Sectorial	Entidad	Codificado (MM USD)	Devengado (MM USD)	Ejecución (%)
	Consejo de Aseguramiento de la Calidad de la Educación Superior	3,13	1,34	42,70%
	Consejo de Desarrollo y Promoción de la Información y Comunicación	1,74	0,72	41,61%
	Consejo de Educación Superior	3,60	1,31	36,27%
	Consejo de Gobierno del Régimen Especial de Galápagos	14,63	6,96	47,57%
	Consejo de la Judicatura	35,58	15,92	44,74%
	Consejo de Participación Ciudadana y Control Social	8,03	3,54	44,12%
	Consejo Nacional de Competencias	0,97	0,47	47,93%
	Consejo Nacional de Salud	0,27	0,12	44,34%
	Consejo Nacional Electoral	106,59	56,69	53,18%
	Consejo Nacional para la Igualdad de Discapacidades	0,86	0,39	44,74%
	Consejo Nacional para la Igualdad de Género	0,45	0,19	42,87%
	Consejo Nacional para la Igualdad de Movilidad Humana	0,36	0,14	40,37%
	Consejo Nacional para la Igualdad de Pueblos y Nacionalidades	0,52	0,23	44,16%
	Consejo Nacional para la Igualdad Intergeneracional	0,56	0,24	42,98%
	Contraloría General del Estado	77,14	35,48	46,00%
	Corporación del Seguro de Depósitos	1,51	0,70	46,43%
	Corte Constitucional	8,93	4,28	47,95%
	Defensoría del Pueblo	10,97	5,17	47,11%
	Defensoría Pública	6,93	3,24	46,75%
	Escuela Politécnica Nacional	15,98	7,22	45,19%
	Escuela Superior Politécnica Agropecuaria de Manabí Manuel Félix López	5,15	2,01	39,07%
	Escuela Superior Politécnica del Chimborazo	16,68	6,39	38,31%
	Escuela Superior Politécnica del Litoral	9,33	4,07	43,59%
	Fiscalía General del Estado	23,09	11,76	50,92%
	Instituto de Altos Estudios Nacionales	4,41	1,65	37,40%
	Instituto Superior Tecnológico de Artes del Ecuador	0,40	0,17	42,42%
	Junta de Política y Regulación Financiera	0,44	0,20	44,57%
	Junta Nacional de Defensa del Artesano	1,21	0,55	45,56%
	Misión F.A.O. en el Ecuador	0,03	0,01	43,42%
	Parlamento Andino (Oficina Nacional)	1,84	0,81	44,21%
	Procuraduría General del Estado	24,36	10,50	43,09%
	Sección Nacional del Ecuador del Instituto Panamericano de Geografía e Historia	0,35	0,16	45,48%
	Secretaría Técnica de Gestión Inmobiliaria del Sector Público	31,86	14,73	46,24%
	Secretaría Técnica del Comité de Coordinación de La Función de Transparencia y Control Social	0,27	0,12	45,62%
	Superintendencia de Bancos	7,05	2,88	40,81%
	Superintendencia de Compañías Valores y Seguros	9,56	4,39	45,88%

Gabinete Sectorial	Entidad	Codificado (MM USD)	Devengado (MM USD)	Ejecución (%)
	Superintendencia de Competencia Económica	5,27	2,35	44,64%
	Superintendencia de Economía Popular y Solidaria	6,07	2,70	44,44%
	Superintendencia de Ordenamiento Territorial Uso y Gestión del Suelo	2,68	1,26	47,15%
	Tribunal Contencioso Electoral	4,37	1,86	42,42%
	Unidad de Análisis Financiero y Económico	1,37	0,53	38,68%
	Universidad de Cuenca	30,21	6,66	22,04%
	Universidad de Guayaquil	46,63	19,04	40,82%
	Universidad de Investigación de Tecnología Experimental Yachay	4,33	1,98	45,71%
	Universidad de las Artes	5,48	2,10	38,34%
	Universidad de las Fuerzas Armadas	22,63	7,70	34,02%
	Universidad Estatal Amazónica	6,21	1,47	23,72%
	Universidad Estatal de Bolívar	8,50	2,48	29,15%
	Universidad Estatal de Milagro	8,86	4,54	51,17%
	Universidad Estatal Península de Santa Elena	5,87	2,32	39,47%
	Universidad Laica Eloy Alfaro de Manabí	7,33	4,09	55,71%
	Universidad Nacional de Chimborazo	13,26	4,95	37,30%
	Universidad Nacional de Educación	6,93	2,65	38,23%
	Universidad Nacional de Loja	12,90	4,71	36,53%
	Universidad Politécnica Estatal del Carchi	4,85	1,74	35,89%
	Universidad Regional Amazónica Ikiam	3,97	1,36	34,38%
	Universidad Técnica de Ambato	17,22	4,67	27,14%
	Universidad Técnica de Babahoyo	10,18	3,75	36,81%
	Universidad Técnica de Cotopaxi	4,30	1,81	42,18%
	Universidad Técnica de Machala	11,03	5,04	45,68%
	Universidad Técnica de Manabí	10,99	4,61	41,96%
	Universidad Técnica de Quevedo	5,11	1,99	38,96%
	Universidad Técnica del Norte	15,64	4,72	30,17%
	Vicepresidencia de la República	1,55	0,61	39,68%
	Total	2077,67	953,05	45,87%


Fuente: SNP, SIPeIP-Submódulo de planes institucionales corte 30 de junio de 2025. e-SIGEF –MEF- Ejecución Presupuestaria, se excluye el sectorial Tesoro Nacional, que son entidades virtuales manejadas por MEF, corte 30 de junio de 2025.

Elaboración: Dirección de Seguimiento a la Planificación y Política Pública – SNP.

El objetivo 9 relacionado con propender la construcción de un Estado eficiente, presenta a las instituciones Ministerio de Educación y el Consejo Nacional Electoral que concentran el 16,47% del codificado del objetivo, cuyos niveles de ejecución presupuestaria son 46,45% y 53,18% respectivamente.

Por su parte, en lo que respecta al **Gasto No Permanente**, las entidades que conforman el Gabinete Sectorial Institucional ejecutaron USD 96,41 millones, mientras que el Gabinete de Infraestructura, Energía y Medio Ambiente ejecutaron USD 49,38 millones, las entidades sin Gabinete ejecutaron USD 9,61 millones. Finalmente, las entidades del Gabinete Social alineados al Objetivo 9 ejecutaron USD 3,61 millones.

Ilustración 62. Gasto No Permanente por Gabinete Sectorial en 2025 (segundo trimestre) – Objetivo 9 (millones de dólares)

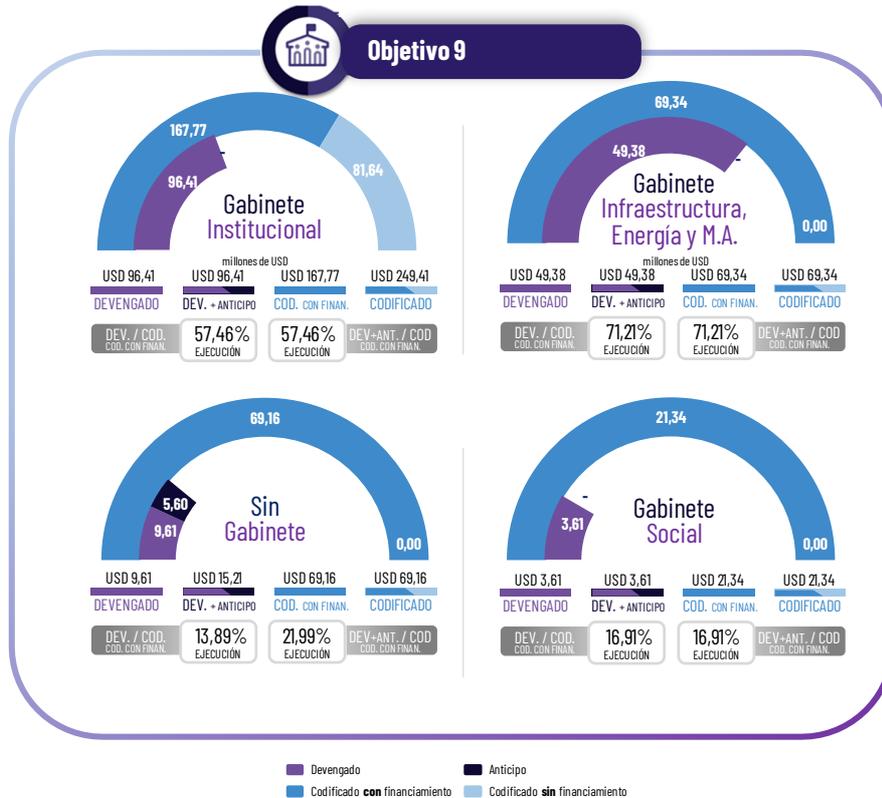

Fuente: SIPeIP, SNP. e-SIGEF, MEF- Ejecución Presupuestaria. Corte 30 de junio de 2025.
 Elaboración: Dirección de Seguimiento a la Inversión – SNP.

Se evidencia que las entidades del Gabinete Sectorial de Infraestructura, Energía y Medio Ambiente presentan la mayor ejecución presupuestaria considerando anticipos en el Objetivo 9, alcanzo un 71,21%, correspondiente a 6 proyectos de inversión. Mientras que las entidades del Gabinete Institucional alcanzan una ejecución presupuestaria del 38,65%, correspondiente a 5 proyectos de inversión. Le siguen, las entidades sin Gabinete con una ejecución presupuestaria de 21,99% correspondiente a 35 proyectos de inversión. Finalmente, la entidad del Gabinete Social con una ejecución del 16,91% correspondiente a 1 proyecto de inversión.

Tabla 61. Cumplimiento presupuestario por gabinete sectorial en 2025 – Objetivo 9

Gabinete Sectorial	Número de Entidades	Número de Proyectos	% Ejecución presupuestaria	
			Devengado / Codificado	Devengado más anticipos / Codificado con fuente
Infraestructura, Energía y Medio Ambiente	3	6	71,21%	71,21%
Institucional	3	5	57,46%	38,65%
Sin Gabinete	19	35	13,89%	21,99%
Social	1	1	16,91%	16,91%
Total	26	47		

Fuente: SIPeIP - SNP. e-SIGEF, MEF– Ejecución Presupuestaria. Corte 30 de junio de 2025.
 Elaboración: Dirección de Seguimiento a la Inversión – SNP.

Para obtener información detallada sobre las entidades, se recomienda revisar el Anexo 2, que contiene la matriz resumen con datos sobre el avance presupuestario y físico.

7.9.2. Avance Físico de la Planificación Institucional

Las 24 entidades que cumplieron con el proceso de registro y sistematización de su planificación institucional y cuentan con indicadores alineados al objetivo 9 sujetos a seguimiento (mensuales, trimestrales y semestrales), registran 52 objetivos institucionales y 108 indicadores estratégicos. En este sentido, se identifica que, el 85,19% presentan un avance esperado, el 1,85% presenta un avance cercano al esperado y el 12,96% avance menor al esperado, conforme el siguiente detalle:

Tabla 62. Ejecución Indicadores Institucionales – Objetivo 9

Entidad	Número Indicadores	Avance esperado		Avance cercano al esperado		Avance menor a lo esperado	
		Indicadores	%	Indicadores	%	Indicadores	%
Consejo de Gobierno del Régimen Especial de Galápagos	1	1	100,00%	0	0,00%	0	0,00%
Consejo de Desarrollo y Promoción de la Información y Comunicación	1	1	100,00%	0	0,00%	0	0,00%
Consejo de Participación Ciudadana y Control Social	8	7	87,50%	0	0,00%	1	12,50%
Consejo Nacional de Competencias	1	1	100,00%	0	0,00%	0	0,00%
Consejo Nacional para La Igualdad De Género	3	3	100,00%	0	0,00%	0	0,00%
Consejo Nacional Para la Igualdad de Movilidad Humana	2	2	100,00%	0	0,00%	0	0,00%
Defensoría Del Pueblo	9	7	77,78%	1	11,11%	1	11,11%
Dirección General de Registro Civil Identificación y Cedulación	11	8	72,73%	0	0,00%	3	27,27%
Dirección Nacional de Registros Públicos	7	7	100,00%	0	0,00%	0	0,00%
Instituto Nacional de Estadística y Censos	8	8	100,00%	0	0,00%	0	0,00%
Ministerio de Trabajo	7	7	100,00%	0	0,00%	0	0,00%
Parlamento Andino (Oficina Nacional)	2	2	100,00%	0	0,00%	0	0,00%
Parque Nacional Galápagos	1	0	0,00%	0	0,00%	1	100,00%
Presidencia de la República	2	2	100,00%	0	0,00%	0	0,00%
Procuraduría General del Estado	15	13	86,67%	0	0,00%	2	13,33%
Sección Nacional del Ecuador del Instituto Panamericano de Geografía e Historia	1	1	100,00%	0	0,00%	0	0,00%
Secretaría Técnica De La Circunscripción Territorial Especial Amazónica	1	1	100,00%	0	0,00%	0	0,00%
Secretaría Técnica del Comité de Coordinación de la Función de Transparencia Y Control Social	2	2	100,00%	0	0,00%	0	0,00%
Servicio Nacional de Contratación Pública	3	3	100,00%	0	0,00%	0	0,00%
Secretaría Técnica de Gestión Inmobiliaria del Sector Público	11	9	81,82%	0	0,00%	2	18,18%
Secretaría Nacional de Planificación	4	3	75,00%	1	25,00%	0	0,00%
Servicio Público para pago de Accidentes de Tránsito	2	0	0,00%	0	0,00%	2	100,00%
Superintendencia de Competencia Económica	4	2	50,00%	0	0,00%	2	50,00%
Superintendencia de Ordenamiento Territorial Uso y Gestión del Suelo	2	2	100,00%	0	0,00%	0	0,00%
Total	108	92	85,19%	2	1,85%	14	12,96%

Fuente: SNP, SIPeIP corte 30 de junio de 2025. GPR corte 30 de junio de 2025.

Elaboración: Dirección de Seguimiento a la Planificación y Política Pública – SNP.

Principales Logros

Ministerio del Trabajo

- 8.652 personas colocadas a nivel nacional mediante la plataforma del Servicio Público de Empleo "*Encuentra Empleo*", considerando un mayor número en las provincias de Zamora Chinchipe 1.692, Orellana 1.597, Sucumbíos 1.515, Pichincha 945, y Morona Santiago 702.

Ministerio de Telecomunicaciones y de la Sociedad de la Información

- 43 trámites simplificados, con acciones de control presencial del cumplimiento al plan de simplificación de trámites en 26 entidades y virtual en 10.
- 18 nuevos conjuntos de datos abiertos incorporados en el Portal Nacional de Datos Abiertos, como resultado de asesorías y acompañamiento técnico a entidades de la Administración Pública Central para la implementación de la Política y Guía de Datos Abiertos. Al mes de junio de 2025, el portal cuenta con un total de 1.498 conjuntos de datos abiertos publicados, promoviendo la transparencia, reutilización de la información pública y fortalecimiento del gobierno abierto.
- 221 cantones del país con cobertura del servicio postal, fortaleciendo el acceso a este servicio a nivel nacional. En el segundo trimestre de 2025, se aprobó el Plan Anual de Control de los Servicios Postales (30 de mayo), lo que permitió el inicio de 109 inspecciones in situ desde junio, en el marco del mejoramiento del sistema postal.
- Reforma del Reglamento de Títulos Habilitantes y de la Gestión Postal, se encuentra en su fase final, que permitirá optimizar los procesos regulatorios del sector.

Dirección Nacional de Registros Públicos

- 100,00% de cumplimiento en relación al tiempo que se dispone para realizar la atención de los requerimientos referentes a integración de instituciones al Sistema Nacional de Registro de Datos Públicos y actividad registral.
- 99,94% de cumplimiento en el servicio Virtual Data Center, evidenciando la no existencia de intermitencias, que brinda el proveedor de cloud (nube virtual), para lo cual se evalúa el tiempo en que dicha infraestructura se encuentra operando dentro de los parámetros ofrecidos en el contrato para el servicio.

Dirección General de Registro Civil, Identificación y Cedulación

- 402.009 niños y niñas menores a 24 meses de edad inscritos en el Registro Civil al mes de junio de 2025, hasta 180 días después de su nacimiento, obteniendo un resultado del 96,98%, lo que permitió sobre cumplir la meta en 3,74 puntos porcentuales.
- 178.313 ciudadanos fueron cedulados por primera vez en el sistema biométrico, en el periodo de abril a junio de 2025, lo cual representa el 99,2% del total de la población a nivel nacional conforme la data estimada por el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos. Se abrieron turnos en la agencia virtual para atender la demanda y permitir a la ciudadanía obtener su documento de identidad.
- 276.368 pasaportes ordinarios fueron emitidos en el segundo trimestre.
- 110.783 inscripciones de nacimientos fueron registradas entre el periodo de abril a junio de 2025, lo que representa el 42,75% de los 259.171 proyectados anualmente por el INEC. La institución implementó brigadas móviles, ofreció servicios en 26 agencias del Registro Civil en centros de salud y gestionó alertas de la Secretaría Técnica Ecuador Crece Sin Desnutrición Infantil.

Instituto Nacional de Estadística y Censos

- 6,25% de avance en el diseño e implementación de instrumentos para la planificación estadística a nivel nacional en el período abril-junio 2025. Se elaboraron matrices de identificación de información para 3 GAD priorizados: Cuenca, Antonio Ante y Riobamba. Además, se prepararon informes sobre la construcción de la Estrategia Nacional de Desarrollo Estadístico y el proceso del Tomo III del Plan de Desarrollo Estadístico alineado a los Objetivos de Desarrollo Sostenible.
- 4 fichas metodológicas desarrolladas, basadas en estadísticas producidas a través de fuentes administrativas nacionales, que incluyen:
 - i) Costo del metro cúbico de agua apta para consumo humano,
 - ii) Volumen promedio de agua por consumidor (conexión),
 - iii) Índice Nacional de Precios Productor de Exportación (IPX),
 - iv) Promedio de días de estadía.
- 2 propuestas de mejora e innovación en operaciones estadísticas desarrolladas en el periodo abril-junio 2025, consistentes en: i) Cuaderno de trabajo la investigación "*Amenidades y migración interna: Caso ecuatoriano*" y ii) Documento de análisis y caracterización de la población ecuatoriana que residió en el extranjero en noviembre de 2017 y regresó para el Censo de Población y Vivienda 2022 (CPV 2022).

Servicio Nacional de Contratación Pública

- 99,73% de disponibilidad del Sistema Oficial de Contratación del Estado, resultado obtenido en función de que hubo una afectación mínima en el Catálogo Electrónico.
- 7.000 usuarios aproximadamente fueron registrados, representando un avance significativo en el fortalecimiento del indicador. En junio del presente año, se desarrolló una jornada de capacitación remota sobre la plataforma "*Contratación Pública en Cifras*", beneficiando a los actores involucrados y promoviendo el uso eficiente de la herramienta a nivel nacional.

Consejo Nacional de Igualdad de Género

- 23 instituciones fueron asistidas técnicamente para la implementación de la Norma Técnica de Transversalización en el Enfoque de Género. Además, se brindó asesoramiento a 6 instituciones y a 12 Gobiernos Autónomos Descentralizados, para asegurar la incorporación del enfoque de Género en todo el ciclo de la política pública, a nivel central y local.
- 332 personas capacitadas a través de la realización de 5 procesos de fortalecimiento de capacidades técnicas, desarrolladas a nivel central y local.
- 4 insumos técnicos fueron elaborados, para asegurar la participación política de las mujeres a nivel central y local.

Consejo Nacional para la Igualdad de Movilidad Humana

- 7 asistencias técnicas brindadas en cantones a nivel nacional para apoyar en la elaboración de ordenanzas de movilidad humana.
- 5 asistencias técnicas fueron ejecutadas para la formulación de agendas locales, ordenanzas y procesos de coordinación con redes cantonales de protección de derechos, fortaleciendo la institucionalización del enfoque de derechos humanos en los gobiernos locales.
- 33 parroquias rurales del Distrito Metropolitano de Quito coordinadas para desarrollar capacitaciones dirigidas a representantes de gobiernos parroquiales, orientadas a fortalecer capacidades en materia de movilidad humana y protección de derechos.

Secretaría Técnica del Comité de Coordinación de la Función de Transparencia y Control Social

- 14 eventos institucionales ejecutados, 2 hitos de proyectos en el marco del Esquema Gubernamental de Seguridad de la Información, 4 transmisiones de sesiones del Comité de Coordinación, 1 campaña comunicacional y 3 reuniones técnicas jurídicas con delegados del Comité, orientadas al fortalecimiento institucional y a la articulación interinstitucional de la Función de Transparencia.
- 40 % de avance en las acciones del Plan Nacional de Integridad Pública y Lucha contra la Corrupción, a través de la creación de 12 mesas técnicas interinstitucionales y la suscripción de 12 cartas de adhesión por parte de diversas entidades del Estado. Además, se lograron 2 hitos del Sistema de Acompañamiento y Monitoreo al Plan 2024–2028, y se realizaron 4 capacitaciones a servidores públicos en las ciudades de Quito, Portoviejo y Latacunga.

Secretaría Nacional de Planificación

- 3 informes de evaluación elaborados sobre instrumentos de planificación, que incluyen: Evaluación a la Estrategia Territorial 2024-2025, Evaluación del Plan Nacional de Desarrollo 2021-2025, corte 2023 y, Evaluación del Plan Nacional de Desarrollo 2024-2025, corte 2024, los mismos que permiten un proceso de retroalimentación a los procesos de planificación venideros.
- 6 informes de seguimiento ejecutados al Plan Anual de Inversiones 2025, periodo enero - marzo de 2025, tanto a nivel de gabinetes sectoriales como institucionales sin gabinete, permitiendo monitorear avances en la ejecución de la inversión pública.
- Informe de Seguimiento al Plan Nacional de Desarrollo y Estrategia Territorial Nacional 2021-2025, con corte a 2024, que incluye el análisis de 70 metas, de las cuales 65 cuentan con información disponible y 5 sin información (con sus respectivos justificativos), identificando alertas para que las instituciones responsables implementen acciones correctivas orientadas a mejorar los resultados y el cumplimiento de los objetivos nacionales.

Secretaría Técnica de Gestión Inmobiliaria del Sector Público

- 478 mantenimientos menores realizados en bienes inmuebles, representando el 100,00% de intervenciones atendidas por el personal institucional a nivel nacional, en el periodo de abril a junio de 2025.
- 480 pronunciamientos jurídicos, autorizaciones y dictámenes emitidos, con un cumplimiento del 100,00% de las solicitudes recibidas por entidades públicas, fortaleciendo la seguridad jurídica de la administración de bienes.
- 238.976,75 m² (23,90 hectáreas) de 3 bienes inmuebles intervenidos mediante levantamientos topográficos de las provincias de Guayas y Pichincha.
- 83 fichas catastrales elaboradas en el Sistema Ficha Predial - Módulo Catastro con asignación de Código GID (Geographic Identificación), en las provincias de Esmeraldas, Los Ríos, Manabí y Pichincha.
- 85,10% de satisfacción de usuarios alcanzado en servicios vinculados a edificios, parques e infraestructuras pesqueras bajo administración institucional.

Consejo de Participación Ciudadana y Control Social

- 33 mecanismos de control social conformados (26 Veedurías Ciudadanas, 5 Comités de Usuarios y 2 Observatorios Ciudadanos), mediante procesos de acompañamiento y capacitación técnica a la ciudadanía.

- 421 procesos de formación, capacitación y acompañamiento técnico implementados en espacios e instancias de participación ciudadana, articulando con ciudadanía, GAD e instituciones públicas a nivel nacional.
- 8 informes concluyentes de investigación elaborados sobre actos u omisiones que afectan la participación ciudadana o atentan contra el interés público, con base en análisis técnico-jurídico conforme a la normativa vigente.
- 238 capacitaciones y talleres desarrollados en temas de transparencia, ética pública y lucha contra la corrupción, promoviendo la cultura de integridad en coordinación con actores sociales y estatales.
- 129 actos administrativos y seguimientos efectuados ante instituciones públicas, en cumplimiento a resoluciones del Pleno del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social vinculadas a investigaciones sobre actos u omisiones de corrupción.

Presidencia de la República

- 3 informes técnicos y comunicacionales elaborados, referentes a la coordinación de los planes, programas y proyectos en el ámbito de Gobierno o Estado Abierto.
- Consolidación del Grupo Núcleo de Estado Abierto Ecuador; Acciones para el cierre del Segundo Plan de Acción de Gobierno Abierto; Avances - consultoría para la definición de un Índice de Estado Abierto.
- Asistencia técnica en Gobierno Abierto realizado a gobiernos locales para implementar el modelo de gobernanza, a través de la Asociación de Municipalidades Ecuatorianas, con el acompañamiento de la sociedad civil.
- 145 solicitudes de aprobación de planes estratégicos de comunicación y 8 solicitudes avaladas de acciones comunicacionales que han sido enviados por las instituciones de la función ejecutiva a nivel nacional.


7.9.3. Avance Físico Proyectos de Inversión

El Objetivo 9 cuenta con 47 proyectos de inversión ejecutados por 26 entidades. El monto codificado total asciende a USD 409,26 millones, con un devengado de USD 159,00 millones, lo que representa una ejecución presupuestaria del 38,85%. Considerando anticipos, la ejecución asciende al 50,24%, con un monto devengado más anticipo de USD 164,61 millones frente al codificado con fuente.

El Ministerio del Trabajo, la Secretaría Técnica de la Circunscripción Territorial Especial Amazónica, el Ministerio de Salud Pública y el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos concentra el 82,62% del presupuesto codificado (USD 338,11 millones) y ejecuta el 19,15% de los proyectos (9 de 47).

En cuanto al avance físico, este objetivo registra un cumplimiento del 26,73% respecto de las metas anuales programadas, con un nivel promedio de cumplimiento del 71,28% al segundo semestre, lo que indica un *“avance menor al esperado”*. Destacan las entidades como la Escuela Politécnica Nacional, la Escuela Superior Politécnica del Chimborazo, la Escuela Superior Politécnica del Litoral, el Ministerio del Ambiente Agua y Transición, la Universidad de Seguridad Ciudadana y Ciencias, y la Universidad Nacional de Educación, quienes la totalidad de sus proyectos alcanzaron el 100,00% de cumplimiento de sus metas físicas programadas.

Ilustración 63. Gasto No Permanente, avance físico promedio y avance presupuestario- Objetivo 9

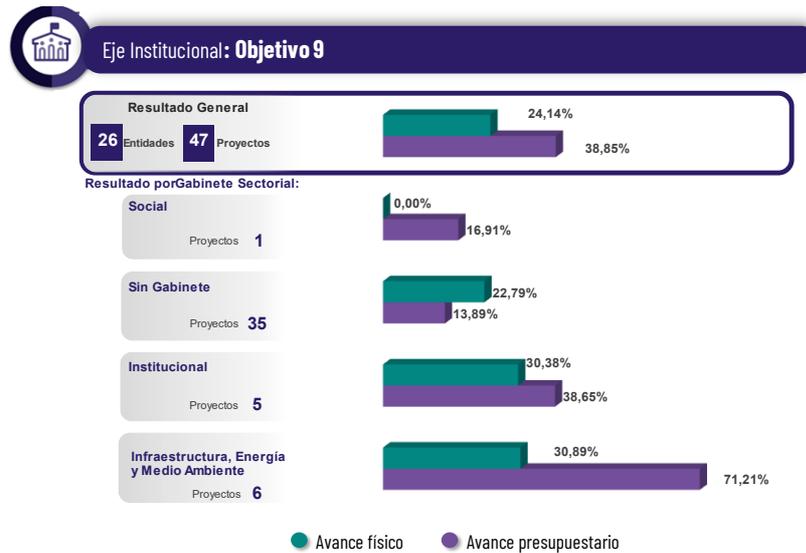

Fuente: SIPeIP, SNP. e-SIGEF, MEF- Ejecución Presupuestaria. Corte 30 de junio 2025
 Elaboración: Dirección de Seguimiento a la Inversión – SNP.

A continuación, se detalla el cumplimiento físico de los proyectos de inversión por gabinetes sectoriales relacionados con el Objetivo 9, lo que permite identificar los niveles de ejecución alcanzados por cada sector en relación con las metas físicas programadas.

Tabla 63. Cumplimiento físico por gabinete – Objetivo 9

Gabinete Sectorial	Número de Entidades	Número de Proyectos	Número de proyectos por nivel de cumplimiento			
			●	●	●	●
Infraestructura, Energía y Medio Ambiente	3	6	3	0	3	0
Institucional	3	5	2	2	0	1
Sin Gabinete	19	35	10	0	10	15
Social	1	1	0	0	0	1
Total	26	47	15	2	13	17

Nota: ● Avance esperado ≥ 95% y < 100% / ● Avance cercano al esperado ≥ 85% y < 95% / ● Avance menor al esperado < 85% / ● Proyecto sin programación de metas.

Fuente: SIPeIP, SNP. e-SIGEF, MEF- Ejecución Presupuestaria. Corte 30 de junio de 2025.
 Elaboración: Dirección de Seguimiento a la Inversión – SNP.

Para conocer más información acerca de las entidades, por favor revisar el Anexo 2, que contiene la matriz resumen con información de avance presupuestario y físico.

A continuación, se presenta la información de ejecución de los principales proyectos de inversión que contribuyen a este objetivo:

Causas y Logros

Ministerio del Trabajo

El Ministerio de Trabajo registró un monto codificado de inversión de USD 230,00 millones y un monto devengado de USD 88,32 millones, lo que representa una ejecución presupuestaria del 38,40%. Al

considerar el devengado con anticipos en relación al codificado con fuente, la ejecución alcanza el 59,53%.

Durante el segundo trimestre de 2025, la entidad reportó 1 proyecto alineado al Objetivo 9, que cuenta con programación de metas físicas, las cuales registran un cumplimiento del 87,61%.

Tabla 64. Avance Físico de Proyectos de Inversión al Segundo Trimestre Ministerio del Trabajo– Objetivo 9

Nombre del proyecto	Programación metas físicas (a)	Ejecución metas físicas (b)	Cumplimiento metas físicas c(b/a)	Codificado (MM USD) (d)	Devengado (MM USD) (e)	Ejecución presupuestaria 2025 f (d/e)	Devengado + anticipos /codificado con fuente (g)
Proyecto de Gestión del Subsistema de Empleo en el Servicio Público	5,65%	4,95%	● 87,61%	230,00	88,32	38,40%	59,53%
Total							59,53%

Nota: ● Avance esperado ≥ 95% y < 100% / ● Avance cercano al esperado ≥ 85% y < 95% / ● Avance menor al esperado < 85% / ● Proyecto sin programación de metas.

Fuente: SIPeIP - SNP. e-SIGEF - MEF- Ejecución Presupuestaria. Corte 30 de junio de 2025.

Elaboración: Dirección de Seguimiento a la Inversión – SNP.

Proyecto de Gestión del Subsistema de Empleo en el Servicio Público

Al segundo trimestre de 2025, este proyecto cuenta con un monto codificado de USD 230,00 millones y una ejecución de 59,53%. Como parte de sus principales logros, se destaca: se gestionaron 1.421 expedientes para avales de pago por USD 69.307.932,17, de los cuales se devengaron 1.370 expedientes por USD 66.905.829,54 (458 en efectivo por USD 20.504.421,39 y 912 en bonos por USD 46.425.064,50). Se desembolsaron USD 23.656,35 en salarios. Además, 83 expedientes por USD 3.949.155,86, validados por el MEF, están programados para pago en julio. Existió renuncia de jubilados del MSP a bonos por USD 2.542.620,50. Al 30 de junio se pagaron 1.830 expedientes por USD 88.279.449,61 y sueldos por USD 40.326,39.

Secretaría Técnica de la Circunscripción Territorial Especial Amazónica

La Secretaría Técnica de la Circunscripción Territorial Especial Amazónica registró un monto codificado de inversión de USD 67,87 millones y un monto devengado de USD 49,02 millones, lo que representa una ejecución presupuestaria del 72,23%. No se cuenta con anticipos.

Durante el segundo trimestre de 2025, la entidad reportó 4 proyectos alineados al Objetivo 9, que cuentan con programación de metas físicas. Entre ellos, 2 proyectos registran un cumplimiento físico del 100,00%.

Tabla 65. Avance Físico de Proyectos de Inversión al Segundo Trimestre Secretaría Técnica de la Circunscripción Territorial Especial Amazónica – Objetivo 9

Nombre del proyecto	Programación metas físicas (a)	Ejecución metas físicas (b)	Cumplimiento metas físicas c(b/a)	Codificado (MM USD) (d)	Devengado (MM USD) (e)	Ejecución presupuestaria a 2025 f (d/e)	Devengado + anticipos /codificado con fuente (g)
Fortalecimiento de la Cobertura Logística para Atención a Pacientes con Enfermedades Catastróficas en la Región Amazónica	16,11%	18,39%	● 100,00%	1,09	0,45	41,32%	41,32%
Fortalecimiento de la Implementación del Plan Integral para la Amazonía 2021-2025	10,33%	7,93%	● 76,77%	0,44	0,12	26,32%	26,32%
Programa de Desarrollo Amazónico Mediante la	11,61%	4,09%	● 35,23%	62,02	48,36	77,99%	77,99%

Nombre del proyecto	Programación metas físicas (a)	Ejecución metas físicas (b)	Cumplimiento metas físicas c(b/a)	Codificado (MM USD) (d)	Devengado (MM USD) (e)	Ejecución presupuestaria a 2025 f (d/e)	Devengado + anticipos /codificado con fuente (g)
Gestión del Fondo Común							
Programa de Desarrollo Integral de la Circunscripción Territorial Especial Amazónica Mediante la Gestión Eficiente del Fondo Común	0,03%	0,04%	● 100,00%	4,32	0,09	2,10%	2,10%
Total							72,23%

Nota: ● Avance esperado $\geq 95\%$ y $< 100\%$ / ● Avance cercano al esperado $\geq 85\%$ y $< 95\%$ / □ Avance menor al esperado $< 85\%$ / ● Proyecto sin programación de metas.

Fuente: SiPeIP - SNP. e-SIGEF - MEF- Ejecución Presupuestaria. Corte 30 de junio de 2025.

Elaboración: Dirección de Seguimiento a la Inversión – SNP.

Proyecto Fortalecimiento de la Cobertura Logística para Atención a Pacientes con Enfermedades Catastróficas en la Región Amazónica

Al segundo trimestre de 2025, este proyecto cuenta con un monto codificado de USD 1,09 millones y una ejecución presupuestaria acumulada del 41,32%. Como parte de sus principales logros, se destaca: en el mes de abril se firmó el Convenio de Cooperación Interinstitucional Nro. STCTEA-DAJ-2025-001 entre la Secretaría Técnica de la Circunscripción Territorial Especial Amazónica y Sumak Kawsay Wasi, Instituto de Atención Social Prioritaria del Gobierno Provincial de Napo, para la ejecución del proyecto denominado “*Fortalecimiento de la cobertura logística para atención a pacientes con enfermedades catastróficas en la región amazónica*”, en la provincia de Napo.

No obstante, se identifica un nudo crítico relacionado con el avance presupuestario menor al esperado, pese al cumplimiento físico conforme a las metas programadas.

Proyecto Programa de Desarrollo Integral de la Circunscripción Territorial Especial Amazónica Mediante la Gestión Eficiente del Fondo Común

Al segundo trimestre de 2025, este proyecto cuenta con un monto codificado de USD 4,32 millones y una ejecución presupuestaria acumulada del 2,10%. Como parte de sus principales logros, se destaca: se cumple con la programación del indicador, registrándose la elaboración de tres informes de avance físico y presupuestario del programa.

No obstante, se identifica un nudo crítico relacionado con un bajo nivel de ejecución presupuestaria frente a lo programado, a pesar de que el cumplimiento físico se encuentra conforme a las metas establecidas.

Ministerio de Salud Pública

El Ministerio de Salud registró un monto codificado de inversión de USD 21,34 millones y un monto devengado de USD 3,61 millones, lo que representa una ejecución presupuestaria del 16,91%. No se cuenta con anticipos.

Durante el segundo trimestre de 2025, la entidad reportó 1 proyecto alineado al Objetivo 9, mismo que no cuenta con programación de metas físicas.

Tabla 66. Avance Físico de Proyectos de Inversión al Segundo Trimestre Ministerio de Salud Pública – Objetivo 9

Nombre del proyecto	Programación metas físicas (a)	Ejecución metas físicas (b)	Cumplimiento metas físicas c(b/a)	Codificado (MM USD) (d)	Devengado (MM USD) (e)	Ejecución presupuestaria a 2025 f (d/e)	Devengado + anticipos /codificado con fuente (g)
Formación del Talento Humano en Salud	0,00%	0,00%	● 0,00%	21,34	3,61	16,91%	16,91%
Total							16,91%

Nota: ● Avance esperado $\geq 95\%$ y $< 100\%$ / ● Avance cercano al esperado $\geq 85\%$ y $< 95\%$ / □ Avance menor al esperado $< 85\%$ / □ Proyecto sin programación de metas.

Fuente: SIPeIP - SNP. e-SIGEF - MEF- Ejecución Presupuestaria. Corte 30 de junio de 2025.

Elaboración: Dirección de Seguimiento a la Inversión – SNP.

Proyecto Formación del Talento Humano en Salud

Al segundo trimestre de 2025, este proyecto cuenta con un monto codificado de USD 21,34 millones y una ejecución presupuestaria acumulada del 16,91%. No se reporta programación de metas físicas ni presupuestarias en el periodo analizado.

Como nudo crítico, se identifican limitaciones en la oferta académica vinculada al proceso de formación del talento humano en salud. Se prevé que los concursos de vinculación académica se desarrollen en el segundo semestre del año, lo que ha condicionado el avance en la ejecución del proyecto.

Instituto Nacional de Estadística y Censos

El Instituto Nacional de Estadísticas y Censos registró un monto codificado de inversión de USD 18,90 millones y un monto devengado de USD 8,09 millones, lo que representa una ejecución presupuestaria del 42,78%. No se cuenta con anticipos.

Durante el segundo trimestre de 2025, la entidad reportó 3 proyectos alineados al Objetivo 9, que cuentan con programación de metas físicas. Entre ellos, 2 proyectos registran un cumplimiento físico del 100,00%.

Tabla 67. Avance Físico de Proyectos de Inversión al Segundo Trimestre Instituto Nacional de Estadística y Censos – Objetivo 9

Nombre del proyecto	Programación metas físicas (a)	Ejecución metas físicas (b)	Cumplimiento metas físicas c(b/a)	Codificado (MM USD) (d)	Devengado (MM USD) (e)	Ejecución presupuestaria 2025 f (d/e)	Devengado + anticipos /codificado con fuente (g)
Consolidación e Implementación de los Instrumentos de Rectoría y Coordinación del Sistema Estadístico Nacional	5,90%	5,10%	● 86,44%	0,20	0,09	46,43%	46,43%
Innovación de la Producción de Estadísticas Económicas- Innova_Ec	12,69%	12,47%	● 98,27%	1,32	0,43	32,30%	32,30%
Robustecimiento de la Producción Estadística del Ecuador	20,01%	20,90%	● 100,00%	17,37	7,56	43,54%	43,54%
Total							42,78%

Nota: ● Avance esperado $\geq 95\%$ y $< 100\%$ / ● Avance cercano al esperado $\geq 85\%$ y $< 95\%$ / ● Avance menor al esperado $< 85\%$ / ● Proyecto sin programación de metas.

Fuente: SIPeIP - SNP. e-SIGEF - MEF- Ejecución Presupuestaria. Corte 30 de junio de 2025.

Elaboración: Dirección de Seguimiento a la Inversión – SNP.



Proyecto Innovación de la Producción de Estadísticas Económicas- Innova Ec

Al segundo trimestre de 2025, este proyecto cuenta con un monto codificado de USD 1,32 millones y una ejecución presupuestaria acumulada del 32,30%. Como parte de sus principales logros la entidad reporta: el desarrollo de un visualizador interactivo para la georreferenciación de empresas y un sistema automatizado para la descarga y validación de datos vehiculares. Además, se investigaron 780 empresas a nivel nacional y se recolectaron 7.499 formularios de permisos de construcción. Se publicaron el Índice de Precios al Productor de Disponibilidad Nacional (IPP-DN) y el Índice Nacional de Precios Productor, así como seis resultados de indicadores de puesto de trabajo. Asimismo, se entregaron cinco plantillas de precios (PCI) a la Comisión Económica para América Latina y el Caribe.

Proyecto Robustecimiento de la Producción Estadística del Ecuador

Al segundo trimestre de 2025, este proyecto cuenta con un monto codificado de USD 17,37 millones y una ejecución presupuestaria acumulada del 43,54%. Entre sus principales logros la entidad destaca: el levantamiento de información de 10.296 viviendas en el Componente 1 (C1), y de 30.912 viviendas con novedades cartográficas en el Componente 2 (C2), con una cobertura efectiva del 80,1%. En los Componentes 3 y 4 (C3 y C4), se logró una cobertura nacional del 10% y una cobertura efectiva del 16,42%, respectivamente. También se actualizaron formularios y manuales del módulo de maquinaria (C5), se realizaron análisis de calidad de registros administrativos (C6), y se elaboró el informe semestral de seguimiento del proyecto 2025 (C7).



Eje Gestión de Riesgos



7.10. OBJETIVO 10: Promover la resiliencia de ciudades y comunidades para enfrentar los riesgos de origen natural y antrópico.


Este Objetivo tiene como prioridad promover la resiliencia de ciudades y comunidades para enfrentar los riesgos de origen natural y antrópico. Dado que Ecuador es un país expuesto a múltiples amenazas, este objetivo desarrolla políticas y estrategias encaminadas a proteger a la población y localidades vulnerables a los riesgos de desastres. En ese sentido, se otorga un mayor protagonismo y relevancia a las acciones que previenen y mitigan las emergencias y riesgos de desastres.

Con base en la gestión desarrollada por el Estado a través de la implementación de sus planes institucionales, estudios, programas y proyectos durante el segundo trimestre del 2025, a continuación, se detallan los resultados alineados a este Objetivo:

7.10.1. Gestión Presupuestaria

Para el cumplimiento de las metas del Objetivo 10, se devengó un total de USD 13,98 millones en el segundo trimestre del 2025, de los cuales, el 17,95% corresponde a **Gasto Permanente** con un monto devengado de USD 2,51 millones; y, la diferencia corresponde al **Gasto No Permanente** vinculado a estudios, programas y proyectos de inversión, de diferentes entidades, con un monto devengado de USD 11,47 millones.

Ilustración 64. Gasto Permanente y No Permanente en 2025 – Objetivo 10 (millones de dólares)

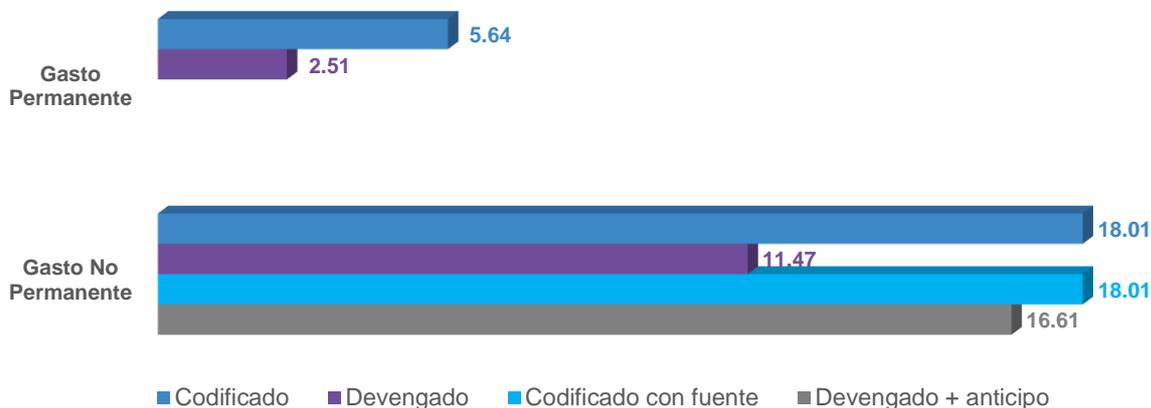

Fuente: SIPeIP, SNP. e-SIGEF, MEF- Ejecución Presupuestaria. Corte 30 de junio de 2025.

Elaboración: Dirección de Seguimiento a la Planificación y Política Pública y Dirección de Seguimiento a la Inversión –SNP.

Por su parte, la ejecución presupuestaria del **Gasto No Permanente** destinado al Objetivo 10, considerando el monto devengado más anticipos entregados en el periodo (USD 16,61 millones), frente al monto codificado con fuente de financiamiento (USD 18,01 millones), alcanza un nivel de ejecución del 92,25%.

Ilustración 65. Ejecución: Devengado más anticipos en relación al codificado con fuente – Objetivo 10 (millones de dólares)




Fuente: SIPeIP -SNP, e-SIGEF - MEF- Ejecución Presupuestaria. Corte 30 de junio de 2025.
Elaboración: Dirección de Seguimiento a la Inversión – SNP.

A continuación, se detallan los montos correspondientes al **Gasto Permanente** y **Gasto No Permanente** que fueron ejecutados, alineados al Objetivo 9, en función de los gabinetes sectoriales establecidos para la gestión institucional.

En **Gasto Permanente**, el Gabinete Sectorial de Seguridad es el que concentra los recursos en este objetivo con un monto devengado de USD 2,51 millones, conforme la siguiente ilustración:

Ilustración 66. Gasto Permanente por Gabinete Sectorial en 2025 – Objetivo 10 (millones de dólares)



Fuente: Base de datos e-SIGEF, Ejecución Presupuestaria Consolidada –MEF corte al 30 de junio de 2025. Base de alineación al PND segundo trimestre 2025 –SNP, corte 30 de junio de 2025.
Elaboración: Dirección de Seguimiento a la Planificación y Política Pública – SNP.

En relación al **Gasto Permanente** alineado al Objetivo 10, se identifica que se encuentran alineadas 1 entidad, con un presupuesto codificado de USD 5,64 millones y un monto devengado de USD 2,51 millones, lo que representa una ejecución presupuestaria del 44,48%. A continuación, se detalla la ejecución presupuestaria correspondiente al segundo trimestre por institución:

Tabla 68. Ejecución presupuestaria de las entidades alineadas al Objetivo 10

Gabinete Sectorial	Entidad	Codificado (MM USD)	Devengado (MM USD)	Ejecución (%)
Gabinete Sectorial de Seguridad	Secretaría Nacional de Gestión de Riesgos	5,64	2,51	44,48%
Total		5,64	2,51	44,48%


Fuente: SNP, SIPeIP-Submódulo de planes institucionales corte 30 de junio de 2025. e-SIGEF –MEF- Ejecución Presupuestaria, se excluye el sectorial Tesoro Nacional, que son entidades virtuales manejadas por MEF, corte 30 de junio de 2025.
Elaboración: Dirección de Seguimiento a la Planificación y Política Pública – SNP.

El objetivo 10 relacionado con la resiliencia de ciudades y comunidades para enfrentar los riesgos de origen natural y antrópico, presenta a la Secretaría Nacional de Gestión de Riesgos que concentran el 100,00% del codificado del objetivo, cuyo nivel de ejecución presupuestaria es del

44,48%.

Por su parte, en lo que respecta al **Gasto No Permanente**, la Secretaría Nacional de Gestión de Riesgos que conforma el Gabinete de Seguridad ejecutó USD 11,47 millones.

Ilustración 67. Gasto No Permanente por Gabinete Sectorial en 2025 (segundo trimestre) – Objetivo 10

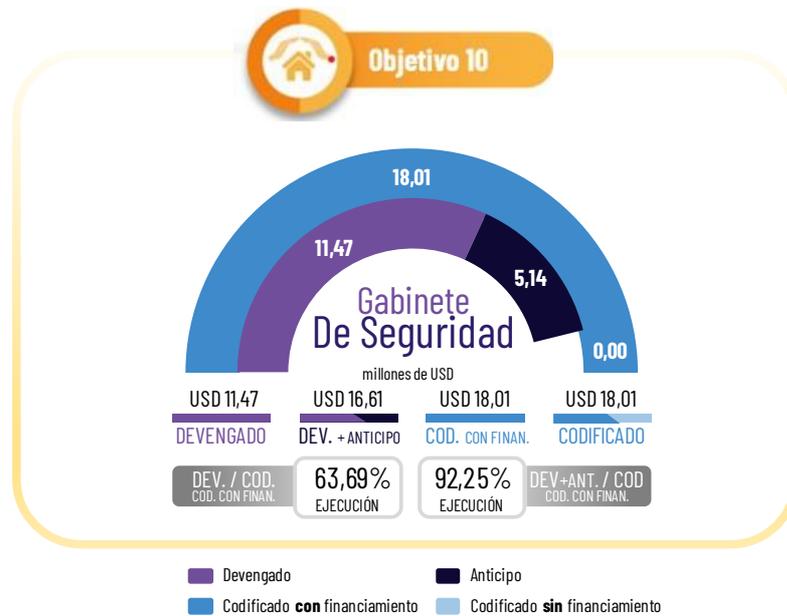

Fuente: SIPeIP, SNP. e-SIGEF, MEF- Ejecución Presupuestaria. Corte 30 de junio de 2025.
Elaboración: Dirección de Seguimiento a la Inversión – SNP.

En este sentido, se evidencia que la Secretaría Nacional de Gestión de Riesgos que conforma el Gabinete de Seguridad presenta una ejecución presupuestaria en el Objetivo 10, de un 92,25%, correspondiente a 4 proyectos de inversión.

Tabla 69. Cumplimiento presupuestario por gabinete sectorial en 2025 – Objetivo 10

Gabinete Sectorial	Número de Entidades	Número de Proyectos	% Ejecución presupuestaria	
			Devengado / Codificado	Devengado más anticipos / Codificado con fuente
Seguridad	1	4	63,69%	92,25%
Total	1	4		

Fuente: SIPeIP - SNP. e-SIGEF, MEF– Ejecución Presupuestaria. Corte 30 de junio de 2025.
Elaboración: Dirección de Seguimiento a la Inversión – SNP.

Para obtener información detallada sobre las entidades, se recomienda revisar el Anexo 2, que contiene la matriz resumen con datos sobre el avance presupuestario y físico.

7.10.2. Avance Físico de la Planificación Institucional

Una entidad que cumplió con el proceso de registro y sistematización de su planificación institucional y cuentan con indicadores alineados al objetivo 10 sujetos a seguimiento (mensuales, trimestrales y semestrales), registra 3 objetivos institucionales y 21 indicadores estratégicos. Así, se identifica que, el 95,24% presentan un avance esperado, el 4,76% presenta un avance cercano al esperado, y no registra indicadores con avance menor al esperado, conforme el detalle que se establece a continuación:

Tabla 70. Ejecución Indicadores Institucionales – Objetivo 10

Entidad	Número Indicadores	Avance esperado 		Avance cercano al esperado 		Avance menor a lo esperado 	
		Períodos Analizados	%	Períodos Analizados	%	Períodos Analizados	%
SNGR - Secretaría Nacional de Gestión de Riesgos	21	20	95,24%	1	4,76%	0	0,00%
Total	21	20	95,24%	1	4,76%	0,00%	0,00%

Fuente: SNP, SIPeIP corte 30 de junio de 2025. GPR corte 30 de junio de 2025.

Elaboración: Dirección de Seguimiento a la Planificación y Política Pública – SNP.

Principales Logros

Secretaría de Gestión de Riesgos

- 2.140 personas fueron fortalecidas en espacios de instrucción que les permitan conocer técnicas para evaluación de factores de riesgo para proyectos, infraestructura y/o planificación territorial.
- 18 estudios de sistemas de alerta generados por la Secretaría Nacional de Gestión de Riesgos para ser entregados a los Gobiernos Autónomos Descentralizados distribuidos a nivel nacional.
- 40,60% de Gobiernos Autónomos Descentralizados cantonales y provinciales fueron beneficiados de procesos de asesoría en metodologías de evaluación de factores de riesgo de desastre para su respectiva circunscripción.
- 51,86% de Gobiernos Autónomos Descentralizados provinciales y cantonales han implementado herramientas construidas o diseñadas por la SGR para conocer el riesgo de desastres en sus circunscripciones territoriales.
- 266.652 total de personas que aprueban los cursos virtuales de gestión de riesgos de desastres que se encuentran disponibles en la plataforma de la Secretaría Nacional de Gestión de Riesgos.
- 747.642 personas fueron sensibilizadas en gestión de riesgos de acuerdo a los procesos metodológicos establecidos que se ejecutan a nivel nacional.
- 92,66% de Unidades de Gestión de Riesgos Cantonales y Provinciales que han mejorado su gestión de información durante emergencias y desastres.
- 32 normas elaboradas o reformadas por la Secretaría Nacional de Gestión de Riesgos para la reducción de riesgos y recuperación post desastre.

7.10.3. Avance Físico Proyectos de Inversión

El Objetivo 10 cuenta con 4 proyectos de inversión, los cuales son ejecutados por 1 entidad. Con la finalidad de tener una visión de avance físico – presupuestario en la gestión de los proyectos de inversión vinculados con este objetivo, se identifica que, el monto total codificado es de USD 18,01 millones y cuenta con un monto devengado de USD 11,47 millones, es decir presenta una ejecución presupuestaria del 63,69%.

Por su parte, este objetivo presenta un avance físico del 25,60% respecto de sus metas anuales programadas, con un nivel de cumplimiento promedio de 36,18% al segundo trimestre, es decir, un “Avance menor al esperado de metas físicas ejecutadas respecto a las metas programadas”, siendo la Secretaría Nacional de Gestión de Riesgos la única entidad ejecutora en este objetivo.

De esta manera, se identifica que, la Secretaría Nacional de Gestión de Riesgos, concentra el 100,00% del presupuesto codificado (USD 18,01 millones de un total de USD 18,01 millones de presupuesto), y una participación en proyectos del 100,00% (4 proyectos de 4).

Ilustración 68. Gasto No Permanente, avance físico promedio y avance presupuestario - Objetivo 10



Fuente: SIPeIP, SNP. e-SIGEF, MEF– Ejecución Presupuestaria. Corte 30 de junio 2025.
 Elaboración: Dirección de Seguimiento a la Inversión – SNP.

A continuación, se detalla el cumplimiento físico de los proyectos de inversión para el gabinete sectorial relacionado con el Objetivo 10, lo que permite identificar los niveles de ejecución alcanzados por cada sector en relación con las metas físicas programadas.

Tabla 71. Cumplimiento físico por gabinete – Objetivo 10

Gabinete Sectorial	Número de Entidades	Número de Proyectos	Número de proyectos por nivel de cumplimiento			
			●	●	●	●
Seguridad	1	4	1	0	3	0
Total	1	4	1	0	3	0

Nota: ● Avance esperado ≥ 95% y < 100% / ● Avance cercano al esperado ≥ 85% y < 95% / ● Avance menor al esperado < 85% / ● Proyecto sin programación de metas.

Fuente: SIPeIP, SNP. e-SIGEF, MEF- Ejecución Presupuestaria. Corte 30 de junio de 2025.
 Elaboración: Dirección de Seguimiento a la Inversión – SNP.

Para conocer más información acerca de las entidades, por favor revisar el Anexo 2, que contiene la matriz resumen con información de avance presupuestario y físico.

A continuación, se presenta la información de ejecución de los principales proyectos de inversión que contribuyen a este objetivo:

Causas y Logros

Secretaría Nacional de Gestión de Riesgos

La Secretaría Nacional de Gestión de Riesgos registró un monto codificado de inversión de USD 18,01 millones y un monto devengado de USD 11,47 millones, lo que representa una ejecución presupuestaria del 63,69%. La ejecución considerando los anticipos es de 92,25%.

Durante el segundo trimestre de 2025, la entidad reportó 4 proyectos alineados al Objetivo 10, que cuentan con programación de metas físicas. Entre ellos, 1 proyecto registra un cumplimiento físico del 100,00%.

Tabla 72. Avance Físico de Proyectos de Inversión al Segundo Trimestre Secretaría Nacional de Gestión de Riesgos – Objetivo 10

Nombre del proyecto	Programación metas físicas (a)	Ejecución metas físicas (b)	Cumplimiento metas físicas c(b/a)	Codificado (MM USD) (d)	Devengado (MM USD) (e)	Ejecución presupuestari a 2025 f (d/e)	Devengado + anticipos /codificado con fuente (g)
Atención a la población afectada por emergencia en época lluviosa	100,00%	100,00%	● 100,00%	11,88	7,62	64,11%	100,00%

Nombre del proyecto	Programación metas físicas (a)	Ejecución metas físicas (b)	Cumplimiento metas físicas c(b/a)	Codificado (MM USD) (d)	Devengado (MM USD) (e)	Ejecución presupuestaria a 2025 f (d/e)	Devengado + anticipos /codificado con fuente (g)
Fortalecimiento de Capacidades de la Población y de los Actores del SNDGR para Prevenir y Reducir los Riesgos de Desastres y dar respuesta oportuna a las Emergencias	2,94%	0,30%	● 10,20%	4,98	3,85	77,23%	79,03%
Fortalecimiento del conocimiento volcánico en el Ecuador para disminuir el Riesgo de desastre en la población	17,83%	0,15%	● 0,84%	0,48	0,00	0,00%	0,00%
Fortalecimiento del Sistema Nacional de Alerta Temprana Ante Múltiples Amenazas	1,99%	0,67%	● 33,67%	0,67	0,00	0,44%	0,44%
Total							92,25%

Nota: ● Avance esperado $\geq 95\%$ y $< 100\%$ / ● Avance cercano al esperado $\geq 85\%$ y $< 95\%$ / ● Avance menor al esperado $< 85\%$ / ● Proyecto sin programación de metas.

Fuente: SIPeIP - SNP. e-SIGEF - MEF- Ejecución Presupuestaria. Corte 30 de junio de 2025.

Elaboración: Dirección de Seguimiento a la Inversión – SNP.

Proyecto Atención a la población afectada por emergencia en época lluviosa

Al segundo trimestre de 2025, este proyecto cuenta con un monto codificado de USD 11,88 millones y presenta una ejecución presupuestaria acumulada del 100,00%. La entidad reporta: los bienes destinados para la atención de emergencias han sido entregados, restando únicamente la consolidación final de la ejecución presupuestaria.

8. Conclusiones

8.1. Gasto Permanente

- Conforme la composición del PGE (sin tesoro nacional), se evidencia que al segundo trimestre 2025, el Gasto Permanente registró un monto codificado de USD 15.152,39 millones y un monto devengado de USD 6.959,13 millones, que representa un porcentaje de ejecución del 45,93%, de avance presupuestario.
- De las 161 entidades que forman parte del Presupuesto General del Estado, 135 entidades cuentan con la alineación de sus planes institucionales hacia los objetivos del PND 2024-2025, al mes de junio 2025, evidenciando que 70 entidades se alinearon al Eje Social, el cual presenta el mayor monto codificado (USD 12.152,67 millones); así como, monto devengado (USD 5.630,65 millones). En este Eje el objetivo 2 cuenta con un mayor monto codificado (USD 4.449,99 millones) seguido del objetivo 1 con un monto de (USD 4.447,40 millones) y el objetivo 3 con un monto de (USD 3.255,28 millones).
- Para el seguimiento de avance físico, se consideró aquellas entidades que, al segundo trimestre de 2025, contaron con el estado registrado, alineación al PND 2024-2025 y programación de metas en su planificación institucional, de manera mensual, trimestral y semestral, se contó con información de 113 entidades de las 161 que forman parte del Presupuesto General del Estado.
- Las 113 entidades, en cuanto a los indicadores analizados durante el segundo trimestre 2025, presentan un 79,44% de “*avance esperado*”, el 5,38% de “*avance cercano a lo esperado*”, y el 15,19% de “*avance menor a lo esperado*”.
- El Eje Social, siendo el más representativo en número de entidades, con un total de 342 indicadores, presenta, el Objetivo 1 con el 77,31% de indicadores en “*avance esperado*”, seguido del Objetivo 3 con el 72,86%; y, el Objetivo 2 con el 67,32%.
- El Eje de Desarrollo Económico, cuenta con un total de 139 indicadores, de los cuales, el Objetivo 4 presenta el 92,50% de indicadores con “*avance esperado*”, seguido del Objetivo 6 que tiene el 76,92%; y, el Objetivo 5 con el 73,97%.
- El Eje de Infraestructura, energía y medio ambiental, cuenta con un total de 134 indicadores, presenta, el Objetivo 7 con el 92,00% de indicadores con “*avance esperado*”, seguido del Objetivo 8 que tiene el 83,05%.

8.2. Gasto No Permanente

- Baja ejecución presupuestaria acumulada (23,27%): excluyendo al Programa de Preservación de Capital periodo 2025 al segundo trimestre de 2025, la ejecución presupuestaria del PAI alcanzó apenas el 23,27% del monto codificado, es decir, se devengaron USD. 503,92 millones de un total codificado de USD. 2.165,99 millones. Esta cifra refleja una ejecución moderadamente baja para la mitad del año fiscal, lo que podría afectar la viabilidad de alcanzar las metas anuales planteadas.
- Avance físico también bajo (25,63%): el promedio de cumplimiento de las metas físicas programadas fue de 25,63%, muy similar al avance presupuestario. Esta baja ejecución física está directamente relacionada con la programación de metas por parte de los ejecutores y refleja dificultades estructurales para implementar efectivamente los proyectos de inversión.
- Alta concentración presupuestaria en pocas instituciones: cinco instituciones públicas concentran el 86,56% del presupuesto codificado de inversión pública. Estas son: Ministerio de Economía y Finanzas (Considerando el Programa de Preservación de Capital 2025), Ministerio de Transporte y Obras Públicas, Ministerio de Energía y Minas, Ministerio de Defensa Nacional y Ministerio del Trabajo. Esta concentración implica que las decisiones y avances de unas pocas entidades tienen un peso determinante sobre el resultado general del PAI.
- Falta de programación física en el año (13,18%): Considerando la especificidad de los proyectos, ya que no todos se gestionan en el primer semestre del año. el informe señala que 56 proyectos que representa 13,18% del total de proyectos no cuentan con programación de metas físicas en el año.
- Concentración del Gasto No Permanente por ejes: el análisis del Gasto No Permanente evidencia que el mayor volumen de recursos se concentra en el Eje de Desarrollo Económico, con un monto codificado de USD. 6.215,27 millones, atribuible en gran parte al “*Programa de preservación de capital periodo 2025*” ejecutado por el Ministerio de Economía y Finanzas, que representa USD. 6.053,51 millones del total codificado y USD. 2.962,86 millones devengados al 30 de junio de 2025. Le siguen en importancia presupuestaria los ejes Social USD. 939,30 millones, Infraestructura, Energía y Medio Ambiente USD. 637,67 millones, Institucional USD. 409,26 millones y Gestión de Riesgos USD. 18,01 millones, reflejando la priorización sectorial de las inversiones públicas en el marco del PND 2024–2025.

9. Anexos

Anexo 1: Bases de datos de reporte de seguimiento a la planificación institucional de los sistemas GPR, SIPeIP y E-sigef.

Anexo 2: Base de datos de reporte de seguimiento del segundo trimestre de estudios, programas y proyectos de inversión.

Firmas

Fecha del informe: 12 de agosto de 2025

ACCIÓN	NOMBRE / CARGO	FIRMA
Elaborado por:	Andrea Viteri Especialista en Seguimiento a la Inversión	
Elaborado por:	Pablo Cárdenas Analista en Seguimiento a la Planificación y Política Pública	
Elaborado por:	Jessica Cifuentes Especialista en Seguimiento a la Planificación y Política Pública	
Revisado por:	Juan José Espín Director de Seguimiento a la Planificación y Política Pública	
Revisado por:	Germán Eduardo Lynch Álvarez Director de Seguimiento a la Inversión	
Aprobado por:	Joselyn Corrales Subsecretaria de Seguimiento	
Aprobado por:	Deysi Cumandá Terán Subsecretaria General de Planificación	
