

INFORME

Ejecución Física del Presupuesto General
del Estado

Periodo: enero - septiembre 2025

Subsecretaría de Seguimiento

Noviembre 2025

Contenidos

Abreviaturas	6
Glosario	7
1. Introducción	8
2. Marco Legal	9
3. Objetivo	13
4. Plan Nacional de Desarrollo 2025-2029	13
5. Metodología de Seguimiento a los Planes Institucionales y a los Proyectos de Inversión.	14
5.1. Metodología de Seguimiento a Planes Institucionales	15
5.2. Metodología de Seguimiento a los Proyectos de Inversión	17
6. Presupuesto General del Estado	20
6.1. Estructura de componentes presupuestarios	20
6.2. Estructura por ejes del PND 2025-2029	21
6.3. Ejecución presupuestaria Gasto Permanente – Planes Institucionales	24
6.4. Ejecución presupuestaria Gasto No Permanente – Plan Anual de Inversiones	27
7. Ejecución física del Presupuesto General del Estado por Objetivos del Plan Nacional de Desarrollo	31
7.1. OBJETIVO 1: Mejorar el bienestar social y la calidad de vida de la población, para garantizar el goce efectivo de los derechos y la reducción de las desigualdades.	37
7.1.1. Gestión Presupuestaria	37
7.1.2. Avance Físico de la Planificación Institucional	40
7.1.3. Avance Físico Proyectos de Inversión	43
7.2. OBJETIVO 2: Potenciar las capacidades de la ciudadanía con acceso universal a una educación inclusiva de calidad, acceso a espacios de intercambio cultural y una vida activa.	48
7.2.1. Gestión Presupuestaria	48
7.2.2. Avance Físico de la Planificación Institucional	51
7.2.3. Avance Físico Proyectos de Inversión	52
7.3. OBJETIVO 3: Garantizar un Estado soberano, seguro, y justo promoviendo la convivencia pacífica y el respeto a los derechos humanos.	57
7.3.1. Gestión Presupuestaria	57
7.3.2. Avance Físico de la Planificación Institucional	60
7.3.3. Avance Físico Proyectos de Inversión	61
7.4. OBJETIVO 4: Impulsar el desarrollo económico que genere empleo de calidad y finanzas públicas, sostenibles, inclusivas y equitativas.	66
7.4.1. Gestión Presupuestaria	66
7.4.2. Avance Físico de la Planificación Institucional	70
7.4.3. Avance Físico Proyectos de Inversión	71

7.5. OBJETIVO 5: Fortalecer la producción nacional y la inversión extranjera en los sectores clave de la economía con innovación tecnológica y prácticas sostenibles.....	75
7.5.1. Gestión Presupuestaria	75
7.5.2. Avance Físico de la Planificación Institucional.....	78
7.5.3. Avance Físico Proyectos de Inversión	81
7.6. OBJETIVO 6: Precautelar el uso sostenible de los recursos naturales, la protección del ambiente, así como la optimización y la eficiencia energética.....	88
7.6.1. Gestión Presupuestaria	88
7.6.2. Avance Físico de la Planificación Institucional.....	90
7.6.3. Avance Físico Proyectos de Inversión	92
7.7. OBJETIVO 7: Impulsar el desarrollo de infraestructuras sostenibles y resilientes; y de la conectividad física y digital, que brinde condiciones de crecimiento y desarrollo económico. ..	97
7.7.1. Gestión Presupuestaria	97
7.7.2. Avance Físico de la Planificación Institucional.....	100
7.7.3. Avance Físico Proyectos de Inversión	102
7.8. OBJETIVO 8: Fortalecer la institucionalidad pública de forma eficiente, transparente y participativa.....	111
7.8.1. Gestión Presupuestaria	111
7.8.2. Avance Físico de la Planificación Institucional.....	118
7.8.3. Avance Físico Proyectos de Inversión	120
7.9. OBJETIVO 9: Fortalecer la capacidad de respuesta y resiliencia de las ciudades y comunidades ante riesgos de origen natural y antrópico.....	124
7.9.1. Gestión Presupuestaria	124
7.9.2. Avance Físico de la Planificación Institucional.....	126
7.9.3. Avance Físico Proyectos de Inversión	127
8. Conclusiones	130
8.1. Gasto Permanente.....	130
8.2. Gasto No Permanente	131
9. Anexos.....	132

Índice de tablas

Tabla 1. Semafización de metas ascendentes del Plan Institucional (PI).....	16
Tabla 2. Semafización de metas descendentes del Plan Institucional (PI).....	16
Tabla 3. Semafización de metas sin tendencia o de mantenimiento del Plan Institucional (PI)	16
Tabla 4. Semafización metas físicas.....	18
Tabla 5. Semafización de ejecución presupuestaria	18
Tabla 6. Componentes presupuestarios del PGE	21
Tabla 7. Gasto permanente por ejes y objetivos del PND	24
Tabla 8. Detalle de presupuesto de entidades con planes institucionales registrados y en proceso de alineación al PND 2025-2029	26
Tabla 9. Detalle de presupuesto de entidades sin planes institucionales registrados.....	26
Tabla 10. Detalle de presupuesto de universidades sin planes institucionales registrados	26
Tabla 11. Detalle de presupuesto sin planes institucionales, de unidades administrativas de otras entidades	27
Tabla 12. Detalle de presupuesto de entidades sin alineación a Objetivos PND 2025-2029.....	27
Tabla 13. Alineación de entidades a Objetivos del PND 2025-2029.....	31
Tabla 14. Promedio de cumplimiento de metas del Plan Anual de Inversiones - PND 2025-2029 ..	32
Tabla 15. Ejecución presupuestaria de las entidades alineadas al Objetivo 1	38
Tabla 16. Cumplimiento presupuestario por gabinete sectorial en 2025 – Objetivo 1	40
Tabla 17. Avance de Indicadores Institucionales – Objetivo 1.....	40
Tabla 18. Cumplimiento físico por gabinete – Objetivo 1	44
Tabla 19. Avance Físico de Proyectos de Inversión al Tercer Trimestre Ministerio de Salud Pública – Objetivo 1	44
Tabla 20. Ejecución presupuestaria de las entidades alineadas al Objetivo 2.....	49
Tabla 21. Cumplimiento presupuestario por gabinete sectorial en 2025 – Objetivo 2	51
Tabla 22. Avance de Indicadores Institucionales – Objetivo 2.....	52
Tabla 23. Cumplimiento físico por gabinete – Objetivo 2	53
Tabla 24. Avance Físico de Proyectos de Inversión al Tercer Trimestre Ministerio de Educación, Deporte y Cultura – Objetivo 2.....	54
Tabla 25. Ejecución presupuestaria de las entidades alineadas al Objetivo 3.....	58
Tabla 26. Cumplimiento presupuestario por gabinete sectorial en 2025 – Objetivo 3	59
Tabla 27. Avance de Indicadores Institucionales – Objetivo 3.....	60
Tabla 28. Cumplimiento físico por gabinete – Objetivo 3	62
Tabla 29. Avance Físico de Proyectos de Inversión al Tercer Trimestre Ministerio de Defensa Nacional – Objetivo 3.....	63
Tabla 30. Ejecución presupuestaria de las entidades alineadas al Objetivo 4.....	67
Tabla 31. Cumplimiento presupuestario por gabinete sectorial en 2025 – Objetivo 4	69
Tabla 32. Avance de Indicadores Institucionales – Objetivo 4.....	70
Tabla 33. Cumplimiento físico por gabinete – Objetivo 4	73
Tabla 34. Avance Físico de Proyectos de Inversión al Tercer Trimestre Ministerio de Economía y Finanzas – Objetivo 4	73
Tabla 35. Ejecución presupuestaria de las entidades alineadas al Objetivo 5.....	76
Tabla 36. Cumplimiento presupuestario por gabinete sectorial en 2025 – Objetivo 5	78
Tabla 37. Avance de Indicadores Institucionales – Objetivo 5.....	78
Tabla 38. Cumplimiento físico por gabinete – Objetivo 5	82
Tabla 39. Avance Físico de Proyectos de Inversión al Tercer Trimestre Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca – Objetivo 5	82
Tabla 40. Avance Físico de Proyectos de Inversión al Tercer Trimestre Ministerio de Producción, Comercio Exterior e Inversiones – Objetivo 5	85
Tabla 41. Ejecución presupuestaria de las entidades alineadas al Objetivo 6.....	89

Tabla 42. Cumplimiento presupuestario por gabinete sectorial en 2025 – Objetivo 6	90
Tabla 43. Avance de Indicadores Institucionales – Objetivo 6.....	91
Tabla 44. Cumplimiento físico por gabinete – Objetivo 6	93
Tabla 45. Avance Físico de Proyectos de Inversión al Tercer Trimestre Ministerio de Ambiente y Energía – Objetivo 6	93
Tabla 46. Ejecución presupuestaria de las entidades alineadas al Objetivo 7	98
Tabla 47. Cumplimiento presupuestario por gabinete sectorial en 2025 – Objetivo 7	99
Tabla 48. Avance de Indicadores Institucionales – Objetivo 7.....	100
Tabla 49. Cumplimiento físico por gabinete – Objetivo 7	103
Tabla 50. Avance Físico de Proyectos de Inversión al Tercer Trimestre Ministerio de Infraestructura y Transporte – Objetivo 7	104
Tabla 51. Ejecución presupuestaria de las entidades alineadas al Objetivo 8.....	112
Tabla 52. Cumplimiento presupuestario por gabinete sectorial en 2025 – Objetivo 8	117
Tabla 53. Avance de Indicadores Institucionales – Objetivo 8.....	118
Tabla 54. Cumplimiento físico por gabinete – Objetivo 8	121
Tabla 55. Avance Físico de Proyectos de Inversión al Tercer Trimestre Ministerio del Trabajo– Objetivo 8	122
Tabla 56. Ejecución presupuestaria de las entidades alineadas al Objetivo 9.....	125
Tabla 57. Cumplimiento presupuestario por gabinete sectorial en 2025 – Objetivo 9	126
Tabla 58. Avance de Indicadores Institucionales – Objetivo 9.....	127
Tabla 59. Cumplimiento físico por gabinete – Objetivo 10	128
Tabla 60. Avance Físico de Proyectos de Inversión al Tercer Trimestre Secretaría Nacional de Gestión de Riesgos – Objetivo 9.....	129

Índice de ilustraciones

Ilustración 1. Estructura del Plan Nacional de Desarrollo “Ecuador no se detiene 2025 – 2029”.....	13
Ilustración 2. Objetivos del Plan Nacional de Desarrollo “Ecuador no se detiene 2025 – 2029”	14
Ilustración 3. Composición del monto devengado del PGE, 2025	20
Ilustración 4. Composición del monto devengado del PGE por ejes del PND 2025-2029	21
Ilustración 5. Ejecución presupuestaria por ejes del PND – Gasto Permanente.....	22
Ilustración 6. Ejecución presupuestaria por ejes del PND – Gasto no Permanente.....	23
Ilustración 7. Ejecución: Devengado más anticipos en relación del codificado con fuente	23
Ilustración 8. Ejecución presupuestaria – Gasto Permanente	24
Ilustración 9. Ejecución presupuestaria por Objetivos PND - Gasto Permanente	25
Ilustración 10. Ejecución Presupuestaria - Gasto No Permanente	28
Ilustración 11. Ejecución presupuestaria por Objetivos PND - Gasto No Permanente	28
Ilustración 12. Variación mensual asignación fuente Gasto No Permanente.....	29
Ilustración 13. Ejecución: Devengado más anticipos en relación al codificado con fuente - Gasto No Permanente	30
Ilustración 14. Variación mensual asignación fuente - Gasto No Permanente	30
Ilustración 15. Porcentaje de cumplimiento por indicadores analizados	32
Ilustración 16. Resumen de cumplimiento general – Gasto No Permanente	34
Ilustración 17. Porcentaje de cumplimiento de proyectos PAI por Objetivos	35
Ilustración 18. Gasto Permanente y No Permanente en 2025 – Objetivo 1	37
Ilustración 19. Gasto Permanente por Gabinete Sectorial en 2025 – Objetivo 1	38
Ilustración 20. Gasto No Permanente por Gabinete Sectorial en 2025 (tercer trimestre) – Objetivo 1	39
Ilustración 21. Gasto No Permanente, avance físico promedio y avance presupuestario-Objetivo 1	43
Ilustración 22. Gasto Permanente y No Permanente en 2025 – Objetivo 2.....	48

Ilustración 23. Gasto Permanente por Gabinete Sectorial en 2025 – Objetivo 2	49
Ilustración 24. Gasto No Permanente por Gabinete Sectorial en 2025 (tercer trimestre) – Objetivo 2	51
Ilustración 25. Gasto No Permanente, avance físico promedio y avance presupuestario- Objetivo 2	53
Ilustración 26. Gasto Permanente y No Permanente en 2025 – Objetivo 3 (millones de dólares) ...	57
Ilustración 27. Gasto Permanente por Gabinete Sectorial en 2025 – Objetivo 3	58
Ilustración 28. Gasto No Permanente por Gabinete Sectorial en 2025 (tercer trimestre) – Objetivo 3	59
Ilustración 29. Gasto No Permanente, avance físico promedio y avance presupuestario- Objetivo 3	62
Ilustración 30. Gasto Permanente y No Permanente en 2025 – Objetivo 4	67
Ilustración 31. Gasto Permanente por Gabinete Sectorial en 2025 – Objetivo 4	67
Ilustración 32. Gasto No Permanente por Gabinete Sectorial en 2025 (tercer trimestre) – Objetivo 4	69
Ilustración 33. Gasto No Permanente, avance físico promedio y avance presupuestario- Objetivo 4	72
Ilustración 34. Gasto Permanente y No Permanente en 2025 – Objetivo 5	75
Ilustración 35. Gasto Permanente por Gabinete Sectorial en 2025 – Objetivo 5	76
Ilustración 36. Gasto No Permanente por Gabinete Sectorial en 2025 (tercer trimestre) – Objetivo 5	77
Ilustración 37. Gasto No Permanente, avance físico promedio y avance presupuestario-Objetivo 5	81
Ilustración 38. Gasto Permanente y No Permanente en 2025 – Objetivo 6	88
Ilustración 39. Gasto Permanente por Gabinete Sectorial en 2025 – Objetivo 6	89
Ilustración 40. Gasto No Permanente por Gabinete Sectorial en 2025 (tercer trimestre) – Objetivo 6	90
Ilustración 41. Gasto No Permanente, avance físico promedio y avance presupuestario- Objetivo 6	92
Ilustración 42. Gasto Permanente y No Permanente en 2025 – Objetivo 7	97
Ilustración 43. Gasto Permanente por Gabinete Sectorial en 2025 – Objetivo 7	98
Ilustración 44. Gasto No Permanente por Gabinete Sectorial en 2025 (tercer trimestre) – Objetivo 7	99
Ilustración 45. Gasto No Permanente, avance físico promedio y avance presupuestario - Objetivo 7	103
Ilustración 46. Gasto Permanente y No Permanente en 2025 – Objetivo 8	111
Ilustración 47. Gasto Permanente por Gabinete Sectorial en 2025 – Objetivo 8	112
Ilustración 48. Gasto No Permanente por Gabinete Sectorial en 2025 (tercer trimestre) – Objetivo 8	117
Ilustración 49. Gasto No Permanente, avance físico promedio y avance presupuestario - Objetivo 8	121
Ilustración 50. Gasto Permanente y No Permanente en 2025 – Objetivo 9	124
Ilustración 51. Gasto Permanente por Gabinete Sectorial en 2025 – Objetivo 9	125
Ilustración 52. Gasto No Permanente por Gabinete Sectorial en 2025 (tercer trimestre) – Objetivo 9	126
Ilustración 53. Gasto No Permanente, avance físico promedio y avance presupuestario - Objetivo 9	128

Abreviaturas

CDH	Crédito de Desarrollo Humano
CDI	Centros de Desarrollo Infantil
COPLAFIP	Código Orgánico de Planificación y Finanzas Públicas
COSEDE	Corporación del Seguro de Depósitos, Fondo de Liquidez y Fondo de Seguros Privados
e-SIGEF	Sistema Integrado de Gestión Financiera
ETN	Estrategia Territorial
GAD	Gobierno Autónomo Descentralizado
GNP	Gasto No Permanente (Inversión)
GP	Gasto Permanente (Corriente)
GPR	Gobierno por Resultados
OEI	Objetivos Estratégicos Institucionales
MEF	Ministerio de Economía y Finanzas
PAI	Plan Anual de Inversiones
PGE	Presupuesto General del Estado
PND	Plan Nacional de Desarrollo
PI	Planes Institucionales
PR	Presidencia de la República
RGCOPLAFIP	Reglamento General del Código Orgánico de Planificación y Finanzas Públicas
SIPeIP	Sistema Integral de Planificación e Inversión Pública
SNP	Secretaría Nacional de Planificación
SNDPP	Sistema Nacional Descentralizado de Planificación Participativa

Glosario

Presupuesto General del Estado: Es el instrumento para la determinación y gestión de los ingresos y egresos del Estado, e incluye todos los ingresos y egresos del sector público, con excepción de los pertenecientes a la seguridad social, la banca pública, las empresas públicas y los gobiernos autónomos descentralizados.¹

Gasto Permanente: Son los egresos de recursos públicos que el Estado a través de sus entidades, instituciones y organismos, efectúan con carácter que requieren repetición permanente y permiten la provisión continua de bienes y servicios públicos a la sociedad. Los egresos permanentes no generan directamente acumulación de capital o activos públicos.²

Gasto No Permanente: Son los egresos de recursos públicos que el Estado a través de sus entidades, instituciones y organismos, efectúan con carácter de temporal, por situación específica, excepcional o extraordinaria que no requiere repetición permanente. Los egresos no permanentes pueden generar directamente acumulación de capital bruto o activos públicos o disminución de pasivos. Por lo que los egresos no permanentes incluyen los gastos de mantenimiento realizados exclusivamente para reponer el desgaste de capital.³

Planes Institucionales: Los planes institucionales son instrumentos de planificación y gestión, a través de los cuales, cada entidad del sector público, en el ámbito de sus competencias, identifica y establece las prioridades institucionales de mediano y corto plazo, que orienten la toma de decisiones y el curso de acción encaminado a la generación y provisión de productos (bienes y/o servicios) a la ciudadanía o usuarios externos, debidamente financiados (recursos permanentes y/o no permanentes), a fin de contribuir al cumplimiento de las prioridades establecidas en los Planes Sectoriales y/o Plan Nacional de Desarrollo.⁴

Plan Anual de Inversiones: Es el instrumento mediante el cual se concretan las inversiones del Plan de Desarrollo, de acuerdo con las formas de financiación contenidas en el Plan Financiero. En este Plan se realiza la anualización para una vigencia fiscal de las inversiones del mediano y corto plazo; es la base sobre la cual las distintas entidades de la administración pública, elabora los planes de acción, el mismo facilita el seguimiento y la evaluación de los programas y proyectos de inversión que se van a ejecutar, y permite observar el nivel de cumplimiento de las metas fijadas en el Plan de Desarrollo en relación con la satisfacción de las necesidades básicas de la población, clasificados por sectores, secretarías, unidades ejecutoras. Este plan guarda concordancia con el Plan Plurianual de Inversiones.⁵

¹Glosario de Términos Presupuestarios – MEF (2020). <https://www.finanzas.gob.ec/wp-content/uploads/downloads/2020/01/Glosario-seguimiento.pdf>.

²Glosario de Términos Presupuestarios – MEF (2020). <https://www.finanzas.gob.ec/wp-content/uploads/downloads/2020/01/Glosario-seguimiento.pdf>.

³Glosario de Términos Presupuestarios – MEF (2020), <https://www.finanzas.gob.ec/wp-content/uploads/downloads/2020/01/Glosario-seguimiento.pdf>.

⁴ Norma Técnica del Sistema Nacional de Planificación Participativa.

⁵ Norma Técnica del Sistema Nacional de Planificación Participativa.

1. Introducción

Las entidades que reciben recursos del Presupuesto General del Estado (PGE), en el ámbito de sus competencias, identifican y establecen la programación de su planificación a corto y mediano plazo, misma que orienta la toma de decisiones y la provisión de productos (bienes y/o servicios) a la ciudadanía, con recursos permanentes y no permanentes, a fin de contribuir a los objetivos del Plan Nacional de Desarrollo (PND).

Mediante Oficios Nro. PR-SSDS-2025-0003-O y Nro. PR-SSDS-2025-0004-O de 14 de octubre de 2025, la Presidencia de la República, informó a las entidades que forman parte del PGE sobre la apertura del Módulo de Seguimiento a la Planificación Institucional del Sistema Integrado de Planificación e Inversión Pública (SIPI), a fin de registrar la programación anual de metas físicas y presupuestarias de los estudios, programas y proyectos que conforman el Plan Anual de Inversiones (PAI) 2025, así como realizar el seguimiento correspondiente al tercer trimestre de 2025.

Adicionalmente, se solicitó a las entidades registrar los resultados del seguimiento a sus planes institucionales de nivel estratégico en las herramientas tecnológicas administradas por el ente rector de la planificación nacional: Gobierno Por Resultados (GPR) y el SIPI, correspondiente al tercer trimestre 2025.

Esta gestión se enmarca en el cumplimiento de la normativa vigente y tiene como objetivo asegurar la calidad, consistencia y oportunidad de la información reportada por las entidades, en el marco del seguimiento a la ejecución de la inversión pública y la planificación institucional.

En este contexto, el seguimiento mide el cumplimiento de las metas programadas, a través del análisis de los resultados alcanzados, permitiendo identificar desviaciones y generar alertas oportunas para la toma de acciones correctivas que coadyuvan al cumplimiento y mejora de la gestión institucional.

Por lo expuesto, el presente informe sustenta su análisis en el reporte de los resultados físicos de la programación de metas del nivel estratégico de los planes institucionales; así como, de los estudios, programas y proyectos de inversión, que conforman el PAI, financiados con gasto permanente y no permanente, correspondiente al periodo fiscal de enero a septiembre de 2025 y su alineación con los objetivos del nuevo Plan Nacional de Desarrollo 2025-2029.

2. Marco Legal

Constitución de la República del Ecuador- 2008

Artículo 280.- *“El Plan Nacional de Desarrollo es el instrumento al que se sujetarán las políticas, programas y proyectos públicos; la programación y ejecución del presupuesto del Estado; y la inversión y la asignación de los recursos públicos; y coordinar las competencias exclusivas entre el Estado central y los gobiernos autónomos descentralizados. Su observancia será de carácter obligatorio para el sector público e indicativo para los demás sectores.”*

Artículo 297.- *“Todo programa financiado con recursos públicos tendrá objetivos, metas y un plazo predeterminado para ser evaluado, en el marco de lo establecido en el Plan Nacional de Desarrollo.”*

Las instituciones y entidades que reciban o transfieran bienes o recursos públicos se someterán a las normas que las regulan y a los principios y procedimientos de transparencia, rendición de cuentas y control público.”

Código Orgánico de Planificación y Finanzas Públicas

Artículo 34.- *“Plan Nacional de Desarrollo. - El Plan Nacional de Desarrollo es la máxima directriz política y administrativa para el diseño y aplicación de la política pública y todos los instrumentos, dentro del ámbito definido en este código. Su observancia es obligatoria para el sector público e indicativa para los demás sectores (...).”*

Artículo 54.- *“Planes institucionales. - Las instituciones sujetas al ámbito de este código, excluyendo los Gobiernos Autónomos Descentralizados, reportarán al ente rector de la planificación nacional sus instrumentos de planificación institucionales, para verificar que las propuestas de acciones, programas y proyectos correspondan a las competencias institucionales y los objetivos del Plan Nacional de Desarrollo.”*

El ente rector de la planificación nacional definirá el instrumento de reporte. Mediante normativa técnica se establecerán las metodologías, procedimientos, plazos e instrumentos necesarios, que serán de obligatorio cumplimiento.”

Artículo 60.- *“Priorización de programas y proyectos de inversión. - Serán prioritarios los programas y proyectos de inversión que el ente rector de la planificación nacional incluya en el plan anual de inversiones del Presupuesto General del Estado, con sujeción al Plan Nacional de Desarrollo. El Plan Anual de Inversiones garantizará el cumplimiento de las reglas fiscales determinadas en este Código, y deberá respetar los techos institucionales y de gasto definidos por el ente rector de las finanzas públicas, de conformidad con este Código y los requisitos y procedimientos que se establezcan en el reglamento al mismo (...)*

2. Para el caso de universidades y escuelas politécnicas, por parte de su máxima autoridad; (...).”

Artículo 77.- *“Presupuesto General del Estado. - El Presupuesto General del Estado es el instrumento para la determinación y gestión de los ingresos y egresos de todas las entidades que constituyen las diferentes funciones del Estado. No se consideran parte del Presupuesto General del Estado, los ingresos y egresos pertenecientes a la Seguridad Social, la banca pública, las empresas públicas y los gobiernos autónomos descentralizados.”*

Artículo 79.- *“Clasificación de egresos. - Los egresos fiscales se clasifican en egresos permanentes*

y no permanentes, y éstos podrán clasificarse en otras categorías con fines de análisis, organización presupuestaria y estadística.”

Artículo (...). - “Programas de preservación de capital del Presupuesto General del Estado. - Se entenderá como programa de preservación de capital el que preserve o aumente la riqueza, el patrimonio o la capacidad financiera del Estado.”

Artículo 119.- “Contenido y finalidad. - Fase del ciclo presupuestario que comprende la medición de los resultados físicos y financieros obtenidos y los efectos producidos, el análisis de las variaciones observadas, con la determinación de sus causas y la recomendación de medidas correctivas.

La evaluación física y financiera de la ejecución de los presupuestos de las entidades contempladas en el presente código, será responsabilidad del titular de cada entidad u organismo y se realizará en forma periódica. Los informes de evaluación serán remitidos al ente rector de las finanzas públicas en coordinación con el ente rector de la planificación nacional y difundidos a la ciudadanía.

El ministro a cargo de finanzas públicas efectuará la evaluación financiera global trimestral del Presupuesto General del Estado y la pondrá en conocimiento del Presidente o Presidenta de la República y de la Asamblea Nacional en el plazo de 45 días de terminado cada trimestre.”

Reglamento al Código Orgánico de Planificación y Finanzas Públicas

Artículo 40.- “Sistema integrado de Planificación e Inversión Pública. - Es la herramienta tecnológica puesta a disposición por parte del ente rector de la planificación, que permitirá realizar transacciones en medios digitales. Las solicitudes realizadas con las claves otorgadas para el uso de dicho sistema y los pronunciamientos emitidos a través del mismo son válidas y tendrán el mismo efecto legal que si se hubieran realizado mediante petición escrita mediante firma ológrafa. Cada una de las entidades deberá mantener debidamente archivados todos los documentos de soporte y serán responsables administrativa, civil y penalmente por las solicitudes realizadas con base en formación imprecisa o falsa suministrada a través del sistema.”

Artículo 59.- “Del seguimiento a la planificación institucional. - La planificación institucional incluirá indicadores de resultado, cuyo seguimiento estará a cargo de la Secretaría Nacional de Planificación y Desarrollo, en coordinación con los entes competentes. Las entidades del sector público deberán remitir de manera oportuna la información sobre el cumplimiento de su planificación.”

Decreto Ejecutivo Nro. 555 de 19 de noviembre de 2011

Artículo 1.- “Se dispone la implementación del Proyecto Gobierno por Resultados-GPR en todas las instituciones de la administración pública central, institucional y dependiente de la Función Ejecutiva, a cargo de la Secretaría Nacional de la Administración Pública”.

Decreto Ejecutivo No. 91 de 26 de diciembre de 2023

La Presidencia de la República del Ecuador, mediante Decreto No. 91, Decreta: La organización y funcionamiento del Gabinete Estratégico, gabinetes sectoriales y otros espacios de coordinación y seguimiento.

Decreto Ejecutivo Nro. 60, de 24 de julio de 2025

Artículo 1.- *“Disponer a la Secretaría General de Administración Pública y Gabinete de la Presidencia de la República que inicie la fase de decisión estratégica para las siguientes reformas institucionales a la Función Ejecutiva”.*

1. *El Ministerio de Desarrollo Urbano y Vivienda se fusiona al Ministerio de Transporte y Obras Públicas.*
2. *El Ministerio de Cultura y Patrimonio se fusiona al Ministerio de Educación.*
3. *El Ministerio del Deporte se fusiona al Ministerio de Educación.*
4. *El Ministerio de la Mujer y Derechos Humanos se fusiona al Ministerio de Gobierno.*
5. *El Ministerio del Ambiente, Agua y Transición Ecológica al Ministerio de Energía y Minas.*
6. *La Secretaría de Educación Superior, Ciencia, Tecnología e Innovación se fusiona al Ministerio de Educación.*
7. *El Ministerio de Turismo se fusiona al Ministerio de la Producción, Comercio Exterior, Inversiones y Pesca.*
8. *La Secretaría Técnica Ecuador Crece sin Desnutrición Infantil se fusiona al Ministerio de Inclusión Económica Social.*
9. *La Secretaría de Inversiones Público Privadas se fusiona al Ministerio de Transporte y Obras Públicas.*
10. *La Secretaría Técnica de Gestión Inmobiliaria del Sector Público se fusiona a la Secretaría General de la Administración Pública y Gabinete.*
11. *La Secretaría Nacional de Planificación se fusiona a la Secretaría General de la Administración Pública y Gabinete.*
12. *La Secretaría Técnica del Comité Interinstitucional de Prevención de Asentamientos Irregulares al Ministerio de Transporte y Obras Públicas.*

Traslado: *El Viceministerio de Acuicultura y Pesca se fusiona al Ministerio de Agricultura y Ganadería.*

1. (...)”

Decreto Ejecutivo No. 95 de 14 de agosto de 2025.

Artículo 1.- *“Fusiónese por absorción la Secretaría Nacional de Planificación a la Presidencia de la República, integrándose dentro de su estructura orgánica como parte de la Secretaría General de la Administración Pública y Gabinete de la Presidencia de la República, para el ejercicio de las competencias, atribuciones y funciones, que le sean asignadas, debiendo garantizarse para ello la desconcentración de los procesos sustantivos, conforme se determine en la fase de implementación de la reforma institucional”.*

Artículo 2.- *“Una vez concluido el proceso de fusión por absorción, modifíquese la denominación de la Secretaría General de la Administración Pública y Gabinete de la Presidencia de la República por Secretaría General de la Administración Pública y Planificación, la cual asumirá todas las rectorías, competencias, atribuciones, funciones, representaciones y delegaciones constantes en la Constitución, leyes, decretos, reglamentos y demás normativa vigente que le correspondían a la Secretaría Nacional de Planificación.”*

Resolución Nro. 011-2025-CNP de 21 de agosto de 2025

Artículo 1.- *Disponer a la Secretaría Nacional de Planificación el cierre de los procesos de seguimiento y evaluación al Plan Nacional de Desarrollo 2024 – 2025.*

Resolución Nro. 012-2025-CNP de 21 de agosto de 2025

Artículo 1.- *Dar por conocido y aprobar el Plan Nacional de Desarrollo “ECUADOR NO SE DETIENE” 2025–2029 y su Estrategia Territorial Nacional.*

Norma Técnica del Sistema Nacional de Planificación Participativa

Artículo 46.- *“Seguimiento a los planes institucionales. - El seguimiento a los planes institucionales de las entidades del sector público previstas en la Constitución de la República, excepto los Gobiernos Autónomos Descentralizados, se hará de acuerdo a las guías metodológicas, directrices y lineamientos que emita el ente rector de la planificación nacional”.*

Artículo 47.- *“Alcance del seguimiento a los planes institucionales. - El seguimiento a la Planificación Institucional se enfocará en la planificación del nivel estratégico de las entidades del sector público previstas en la presente norma”.*

Artículo 102.- *“Seguimiento a la Inversión. - El seguimiento a los estudios, programas y proyectos de inversión que forman parte del Plan Anual de Inversiones se lo realizará de manera trimestral por parte del ente rector de la planificación nacional”.*

Artículo 104.- *“Metodología. - El ente rector de la planificación establecerá los respectivos lineamientos metodológicos para el seguimiento a los estudios, programas y proyectos de inversión pública”.*

Acuerdo Nro. SNP-SNP-2023-0028-A de 28 de marzo de 2023

A través del cual se emite la *“Metodología de seguimiento a planes institucionales”*.

Acuerdo Nro. SNP-SNP-2025-0014-A de 31 de marzo de 2025

A través del cual se emite la *“Metodología de Seguimiento a Estudios, Programas y Proyectos de Inversión”*.

3. Objetivo

Analizar los resultados de la planificación institucional del nivel estratégico; así como, de estudios, programas y proyectos de inversión de las entidades del PGE, y, su relación con la ejecución presupuestaria, alineados a los Objetivos del PND 2025-2029, a fin de levantar alertas oportunas que permitan la toma de decisiones en mejora de la gestión institucional.

4. Plan Nacional de Desarrollo 2025-2029

Mediante Resolución Nro. 012-2025-CNP de 21 de agosto de 2025, el Consejo Nacional de Planificación, dio por conocido y aprobó el *Plan Nacional de Desarrollo “ECUADOR NO SE DETIENE” 2025 – 2029 y su Estrategia Territorial Nacional*.

El Plan Nacional de Desarrollo, es la máxima directriz para el diseño y ejecución de la política pública, a la que se sujetan las acciones, programas y proyectos públicos, el endeudamiento público, la cooperación internacional, la programación, formulación, aprobación y ejecución del PGE, incluidos los presupuestos de la banca pública, empresas públicas a nivel nacional y seguridad social.

Al respecto, el Plan Nacional de Desarrollo 2025-2029, se encuentra estructurado por 5 ejes y 9 objetivos nacionales:

Ilustración 1. Estructura del Plan Nacional de Desarrollo “Ecuador no se detiene 2025 – 2029”



Fuente: PND 2025 – 2029.

Elaboración: Subsecretaría de Seguimiento – Presidencia de la República.

En este sentido, conforme a las directrices emitidas por el ente rector de la planificación nacional, las entidades del sector público, con excepción de los GAD realizaron la alineación de los objetivos estratégicos institucionales al nuevo Plan Nacional de Desarrollo 2025-2029, considerando los siguientes objetivos:

Ilustración 2. Objetivos del Plan Nacional de Desarrollo “Ecuador no se detiene 2025 – 2029”



Eje Social

Objetivo 1

Mejorar el bienestar social y la calidad de vida de la población, para garantizar el goce efectivo de los derechos y la reducción de las desigualdades.

Objetivo 2

Potenciar las capacidades de la ciudadanía con acceso universal a una educación inclusiva de calidad, acceso a espacios de intercambio cultural y una vida activa.

Objetivo 3

Garantizar un Estado soberano, seguro, y justo promoviendo la convivencia pacífica y el respeto a los derechos humanos.



Eje Económico, productivo y empleo

Objetivo 4

Impulsar el desarrollo económico que genere empleo de calidad y finanzas públicas, sostenibles, inclusivas y equitativas.

Objetivo 5

Fortalecer la producción nacional y la inversión extranjera en los sectores clave de la economía con innovación tecnológica y prácticas sostenibles.



Eje Ambiente, agua, energía y conectividad

Objetivo 6

Precautelar el uso sostenible de los recursos naturales, la protección del ambiente, así como la optimización y la eficiencia energética.

Objetivo 7

Impulsar el desarrollo de infraestructuras sostenibles y resilientes; y de la conectividad física y digital, que brinde condiciones de crecimiento y desarrollo económico.



Eje Institucional

Objetivo 8

Fortalecer la institucionalidad pública de forma eficiente, transparente y participativa.



Eje de Riesgos

Objetivo 9

Fortalecer la capacidad de respuesta y resiliencia de las ciudades y comunidades ante riesgos de origen natural y antrópico.

Fuente: PND 2025 – 2029.

Elaboración: Subsecretaría de Seguimiento – Presidencia de la República.

5. Metodología de Seguimiento a los Planes Institucionales y a los Proyectos de Inversión.

El presente capítulo describe las metodologías aplicadas para el seguimiento a los Planes Institucionales y a los Estudios, Programas y Proyectos de Inversión del sector público, en concordancia con la normativa vigente y las disposiciones emitidas por el ente rector de la planificación nacional. Estas metodologías, establecidas mediante los Acuerdos Nro. SNP-SNP-2023-0028-A y Nro. SNP-SNP-2025-0014-A, constituyen el marco técnico de análisis para la identificación de alertas y toma de decisiones institucionales.

Adicionalmente, se definen los parámetros para las categorías de cumplimiento y los umbrales de semaforización, los cuales se incorporan en el presente informe con el fin de evidenciar el desempeño de la gestión institucional. Estos elementos permiten realizar un análisis estandarizado y comparable para todas las entidades del sector público sujetas al proceso de seguimiento correspondiente al tercer trimestre de 2025.

5.1. Metodología de Seguimiento a Planes Institucionales

El seguimiento a los Planes Institucionales se basa en el Acuerdo Nro. SNP-SNP-2023-0028-A del 28 de marzo de 2023, que establece la “*Metodología de Seguimiento a Planes Institucionales*” como obligatoria para todas las entidades del sector público, en concordancia con el artículo 54 del Código Orgánico de Planificación y Finanzas Públicas (COPLAFIP).

Esta metodología permite un análisis estandarizado a partir de los reportes generados por las plataformas GPR y SIPeIP, administradas por la Presidencia de la República. Los resultados sirven de base para la identificación de alertas y la elaboración de informes de seguimiento.

El proceso de seguimiento correspondiente al periodo del tercer trimestre de 2025 se aplica a las entidades que programaron metas con periodicidad mensual y trimestral en su planificación institucional 2025, en el nivel estratégico, y que cumplieron con la normativa vigente y las “*Directrices para la Planificación Institucional 2025 – SIPeIP y GPR*”, emitidas por el ente rector de la planificación nacional.

La consolidación de la información se realizó con base en los resultados de las metas programadas de los Objetivos Estratégicos Institucionales, considerando su alineación con los elementos del nuevo Plan Nacional de Desarrollo (PND) 2025–2029, específicamente: eje, objetivo, política y meta. (ver Anexo 1).

Análisis de Metas e Indicadores

Para calcular el porcentaje de cumplimiento de una meta, se utiliza la siguiente fórmula:

$$\text{Porcentaje de cumplimiento de meta} = \left(\frac{\text{Resultado}}{\text{Meta}} \right) * 100$$

Este cálculo permite analizar el porcentaje de avance en el cumplimiento de las metas y observar su desempeño, de acuerdo con los umbrales de valoración definidos según el comportamiento de la meta. El valor del resultado de la meta corresponde al último periodo de seguimiento (septiembre), tanto para los indicadores discretos como para los continuos. Para este análisis se aplican los siguientes criterios:

Comportamiento de las metas:

- Ascendente: a medida que aumenta la variable independiente (tiempo) también aumenta la variable dependiente (valor del indicador).
- Descendente: a medida que aumenta la variable independiente (tiempo) disminuye la variable dependiente (valor del indicador).
- Sin tendencia: aquel que no se puede identificar si es ascendente o descendente, dado que cambia o se mantiene, en cada uno de los periodos analizados.

Comportamiento de los indicadores:

- Discreto: muestra el valor del indicador de cada periodo independientemente del periodo anterior o posterior.
- Continuo: muestra el valor del indicador de manera acumulada desde el inicio de su medición de acuerdo a su periodicidad. Cabe indicar que, al existir indicadores continuos fraccionales,

configurados en la herramienta de GPR, se ha establecido el siguiente esquema para su análisis:

- Indicadores con numeradores ascendentes o descendentes y denominador constante, se considera el último dato reportado.
 - Indicadores con numeradores distintos o sin una tendencia clara y denominador constante, se considera la suma de numeradores y el denominador constante.
 - Indicadores con numeradores y denominadores distintos, se considera la suma de todos los numeradores dividido para la suma de todos los denominadores.
- Categorías y umbrales de semaforización – Seguimiento PI
 - Las categorías de metas físicas son las siguientes:

Meta ascendente

Tabla 1. Semaforización de metas ascendentes del Plan Institucional (PI)

Categoría de cumplimiento		Umbrales	Descripción
Avance esperado	●	$\geq 95\%$	Si el resultado del nivel de cumplimiento es mayor o igual que 95%.
Avance cercano al esperado	●	$\geq 85\% \text{ y } < 95\%$	Si el resultado del nivel de cumplimiento es mayor o igual que 85% y menor que 95%.
Avance menor al esperado	●	$\geq 0\% \text{ y } < 85\%$	Si el resultado del nivel de cumplimiento es menor que 85%.
Sin Información	●	-	En caso que la entidad responsable del indicador no haya reportado el resultado, o no sea factible calcular el nivel de cumplimiento de las metas programadas.

Fuente y Elaboración: Dirección de Seguimiento a la Planificación y Política Pública - Presidencia de República.

Meta descendente

Tabla 2. Semaforización de metas descendentes del Plan Institucional (PI)

Categoría de cumplimiento		Umbrales	Descripción
Avance esperado	●	$\leq 105\%$	Si el resultado del nivel de cumplimiento es menor o igual que 105%.
Avance cercano al esperado	●	$> 105\% \text{ y } \leq 115\%$	Si el resultado del nivel de cumplimiento está entre 105% y menor o igual 115%.
Avance menor al esperado	●	$> 115\%$	Si el resultado del nivel de cumplimiento es mayor que 115%.
Sin Información	●	-	En caso que la entidad responsable del indicador no haya reportado el resultado, o no sea factible calcular el nivel de cumplimiento de las metas programadas.

Fuente y Elaboración: Dirección de Seguimiento a la Planificación y Política Pública - Presidencia de República.

Meta sin tendencia o de mantenimiento

Tabla 3. Semaforización de metas sin tendencia o de mantenimiento del Plan Institucional (PI)

Categoría de cumplimiento		Umbrales	Descripción
Avance esperado	●	$\geq 95\% \text{ y } \leq 105\%$	Si su resultado de cumplimiento está entre 95% y 105% con respecto a la meta programada.
Avance cercano al esperado	●	$\geq 85\% \text{ y } < 95\%$ $> 105\% \text{ y } \leq 115\%$	Si su resultado de cumplimiento está entre el rango del 85% y el 95% o el rango de 105% y 115%.
Avance menor al esperado	●	$< 85\% \text{ y } \geq 0\%$ $> 115\%$	Si el resultado de cumplimiento es menor al 85% o mayor al 115%.
Sin Información	●	-	En caso de que la entidad responsable del indicador no haya reportado el resultado, u otras situaciones que no permiten calcular el nivel de cumplimiento de las metas programadas.

Fuente y Elaboración: Dirección de Seguimiento a la Planificación y Política Pública - Presidencia de República.

Para la descripción de los principales logros, en el presente informe se incluyen aquellos reportados por las entidades en la “Ficha de Seguimiento del Plan Institucional,” correspondientes únicamente

a los resultados alcanzados de las metas que tienen programación mensual y trimestral, dentro del periodo de seguimiento.

Vinculación Planificación - Presupuesto

La planificación institucional se vincula con el presupuesto conforme a la alineación realizada por las entidades que forman parte del PGE, de los programas presupuestarios a sus OEI y a los Objetivos del PND 2025-2029, proceso efectuado durante la fase de planificación.

En los casos en que una entidad no haya cumplido con la alineación, no es posible vincular su gestión presupuestaria por objetivo del PND. En este sentido, estas entidades se agrupan en la categoría “*En proceso de alineación*”, y se encuentran clasificadas en la sección 6.3 del informe, según el estado de validación de los PI.

La consolidación de la gestión presupuestaria del Gasto Permanente, se efectúa mediante los Grupos de Gasto 5⁶, 8⁷ y 9⁸ (sin proyecto), sin incluir proyectos de inversión, ni entidades del Tesoro Nacional⁹, información que se obtiene a partir de los datos del Sistema Integrado de Gestión Financiera (e-SIGEF) proporcionado por el MEF, con corte al 30 de septiembre de 2025.

Limitaciones de la Metodología

- Algunas entidades registran resultados no acordes con la configuración del indicador, ya sea por el comportamiento de la meta o del indicador (ascendente, descendente, sin tendencia; discreto o continuo), lo cual genera inconsistencias en la aplicación de la fórmula de cumplimiento y en los umbrales de valoración definidos para el análisis de resultados, por lo que son incluidos en la categoría de “*Sin Información*”.

5.2. Metodología de Seguimiento a los Proyectos de Inversión

Las entidades ejecutoras son responsables del seguimiento a la programación física y presupuestaria de los estudios, programas y proyectos que integran el PAI, con base en el Acuerdo Nro. SNP-SNP-2025-0014-A de 31 de marzo de 2025, a través del cual se emite la “*Metodología de Seguimiento a Estudios, Programas y Proyectos de Inversión*”. Las entidades ejecutoras reportan trimestralmente el avance de las metas físicas por componente del marco lógico a través del módulo de seguimiento del SIPeIP.

Dado el vínculo entre planificación y presupuesto, es necesario identificar el presupuesto devengado de cada proyecto de inversión en relación con lo programado¹⁰. Para tal efecto, se dispone de la base de datos del e-SIGEF, que consolida todas las fuentes de financiamiento y la deuda vinculada al Programa de Preservación de Capital 2025, responsabilidad del MEF, excluyendo el capital no asociado a proyectos.

Con la información reportada en el Módulo de Seguimiento del SIPeIP, se consolida una base de datos que incorpora tanto los campos generados por las entidades, como la ejecución presupuestaria del e-SIGEF. Esta base registra la alineación de los proyectos con los objetivos del PND 2025–2029,

⁶ Grupos de Gasto 51, 53, 56, 57 y 58 excluyendo Tesoro Nacional.

⁷ Grupo 84 y 87, gasto de capital no atado a proyectos.

⁸ Grupos de Gasto 96, 97 y 99 atado a gasto corriente excluyendo Tesoro Nacional.

⁹ Tesoro Nacional (entidades virtuales manejadas por el MEF).

¹⁰ El presupuesto programado corresponde a la información remitida de manera oficial por las entidades que ejecutan estudios, programas y proyectos de inversión que conforman el PAI que se financian con recursos de Gasto No Permanente.

lo que permite comparar el avance de metas físicas y el porcentaje de ejecución presupuestaria respecto a dichos objetivos.

El Anexo 2, detalla la alineación de los estudios, programas y proyectos de inversión con las metas del PND. Cabe señalar que, la veracidad y calidad de la información presentada en este informe es responsabilidad exclusiva de las entidades ejecutoras, conforme lo señalado en la base normativa.

Consideraciones de cumplimiento o semaforización

Para analizar el avance físico de los estudios, programas y/o proyectos de inversión, se establecen categorías de cumplimiento o semaforización de metas, basadas en umbrales de valoración, lo que permite a las instituciones contrastar el desempeño observado con relación a lo programado y tomar acciones preventivas o correctivas para mejorar la ejecución de los mismos.

Categorías de cumplimiento de metas físicas

La semaforización del avance físico de los estudios, programas y proyectos de inversión se determina a partir de la relación entre los resultados físicos alcanzados y la programación prevista para el período analizado. Las categorías de cumplimiento de metas físicas son las siguientes:

Tabla 4. Semaforización metas físicas

Categoría	Umbrales	Categorías de cumplimiento
●	$\geq 95\%$ y $\leq 100\%$	Avance esperado de metas ejecutadas respecto a las metas programadas
●	$\geq 85\%$ y $< 95\%$	Avance cercano al esperado de metas ejecutadas respecto a las metas programadas
●	$< 85\%$	Avance menor al esperado de metas ejecutadas respecto a las metas programadas
●	Sin programación	Sin programación de metas físicas

Fuente y Elaboración: SNP-SNP-2025-0014-A, de 31 de marzo de 2025 – Dirección de Seguimiento a la Inversión - Presidencia de la República.

En cuanto a la semaforización del cumplimiento de ejecución presupuestaria de los estudios, programas, y proyectos de inversión, presentará las mismas categorías de la ejecución física, sin embargo, considerando la particularidad de que esta depende del financiamiento asignado a las entidades, conforme la disponibilidad de recursos del ente rector de las finanzas públicas.

Tabla 5. Semaforización de ejecución presupuestaria

Categoría	Umbrales	Categorías de cumplimiento
●	$\geq 95\%$ y $\leq 100\%$	Avance presupuestario esperado
●	$\geq 85\%$ y $< 95\%$	Avance presupuestario cercano al esperado
●	$< 85\%$	Avance presupuestario menor al esperado
●	Sin programación	Sin programación de metas presupuestarias

Fuente y Elaboración: SNP-SNP-2025-0014-A, de 31 de marzo de 2025 – Dirección de Seguimiento a la Inversión - Presidencia de la República.

Consideraciones generales para el análisis

La información sobre la alineación de los estudios, programas y proyectos de inversión con los objetivos del PND 2025-2029 se la tomó de la información registrada por las entidades en el módulo de seguimiento del SIPeIP.


Adicionalmente, este informe incluye un análisis detallado de los estudios, programas y proyectos de inversión por entidad, según su alineación a cada objetivo del PND, aplicando la regla 80/20, que resalta los proyectos que concentran más del 80% del presupuesto codificado.

6. Presupuesto General del Estado

6.1. Estructura de componentes presupuestarios

El Presupuesto General del Estado para el tercer trimestre del 2025, corresponde a USD 36.063,02 millones¹¹ por concepto de asignado inicial; en este sentido, al 30 de septiembre de 2025, se registra un monto codificado de USD 40.994,46 millones y un devengado de USD 25.276,51 millones.

Ilustración 3. Composición del monto devengado del PGE, 2025
(millones de dólares)

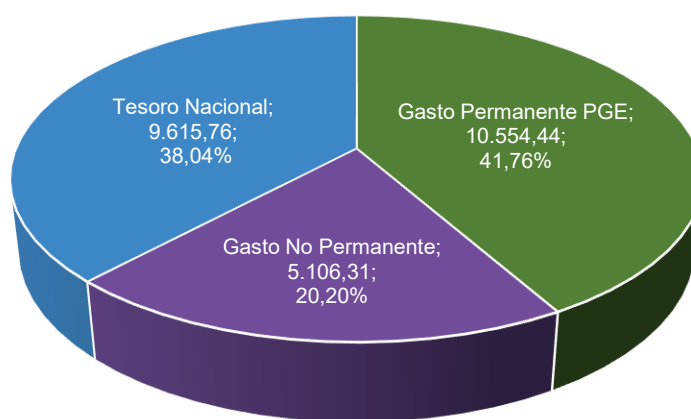

Nota: El devengado del Tesoro Nacional, excluye el monto del “Programa de preservación de capital periodo 2025”, en sus grupos de gasto 96 y 99 (Amortización de Deuda Pública y Otros pasivos), en razón de que este valor se ve reflejado en el devengado del Gasto no permanente, como se observa en la Tabla 7 del presente informe.

Fuente: MEF– Ejecución Presupuestaria consolidada. corte 30 de septiembre de 2025.

Elaboración: Dirección de Seguimiento a la Planificación y Política Pública - Dirección de Seguimiento a la Inversión – Presidencia de la República.

Para el presente informe, se consideran los componentes del gasto permanente, que incluye el gasto corriente, gasto de capital y aplicación del financiamiento, no atado a proyectos; y el gasto no permanente que tiene correlación con el Plan Anual de Inversiones. Estos componentes, no contemplan los rubros del Tesoro Nacional.

En este sentido, a continuación, se detallan los componentes presupuestarios, (Gasto Permanente y No Permanente), que vincula la planificación con el presupuesto, cuyo monto total del Codificado es de USD 27.671,71 millones y Devengado de USD 15.660,75 millones, correspondiente a 162 entidades que forman parte del PGE, de las cuales, 77 entidades están incluidas en el PAI al tercer trimestre 2025.

¹¹ PGE considerando el Sectorial del Tesoro Nacional. Cabe señalar que, el ejercicio fiscal 2025, al ser un año de posesión presidencial, inicia con el presupuesto prorrogado del ejercicio fiscal 2024, conforme lo establecido en la normativa legal: Constitución de la República del Ecuador en el artículo 295 y Código Orgánico de Planificación y Finanzas Públicas (COPLAFIP) en el artículo 107 sobre presupuestos prorrogados. Adicionalmente mediante Registro Oficial Nro. 120 del 9 de septiembre de 2025 se publica la aprobación del Presupuesto General del Estado 2025 y la Programación Cuatrianual 2025-2028.

Tabla 6. Componentes presupuestarios del PGE

Componente	Detalle	Codificado (MM USD)	Devengado (MM USD)
Gasto Permanente	Gasto corriente ¹²	14.880,48	10.359,15
	Gasto de capital ¹³	4.190,96	25,42
	Aplicación del financiamiento ¹⁴	226,99	169,87
Subtotal Gasto Permanente		19.298,43	10.554,44
Gasto No Permanente	Gasto de inversión – PAI	2.233,18	899,56
	Programa de preservación de capital	15,00	6,31
	Grupos 73 ¹⁵	6.125,10	4.206,75
Subtotal Gasto No Permanente		8.373,27	5.106,31
Total		27.671,71	15.660,75


Fuente: e-SIGEF – MEF – Ejecución Presupuestaria consolidada. corte 30 de septiembre de 2025.

Elaboración: Dirección de Seguimiento a la Planificación y Política Pública – Dirección de Seguimiento a la Inversión – Presidencia de la República.

6.2. Estructura por ejes del PND 2025-2029

La ejecución del **Gasto Permanente** y **Gasto No Permanente** correspondiente al Presupuesto General del Estado, permite visualizar el gasto efectuado por las entidades en el marco de los Ejes y Objetivos del PND¹⁷.

Ilustración 4. Composición del monto devengado del PGE por ejes del PND 2025-2029

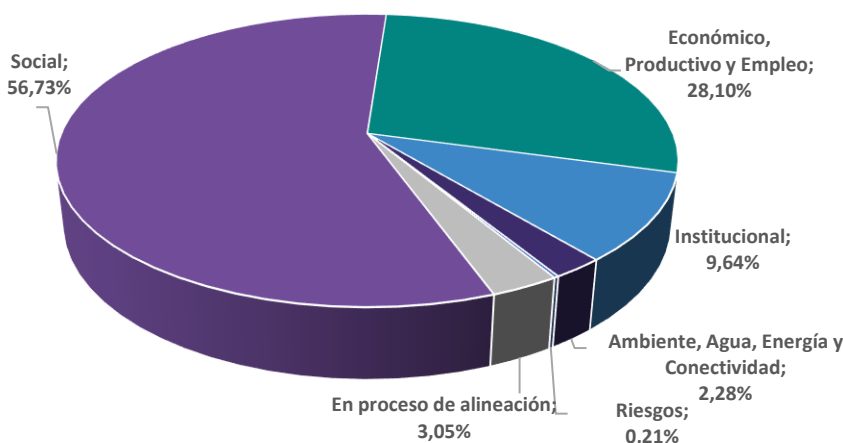

Fuente: e-SIGEF – MEF – Ejecución Presupuestaria consolidada. corte 30 de septiembre de 2025.

Elaboración: Dirección de Seguimiento a la Planificación y Política Pública. Dirección de Seguimiento a la Inversión – Presidencia de la República.

¹² Grupos de Gasto 51, 53, 56, 57 y 58 excluyendo Tesoro Nacional.

¹³ Grupo 84 y 87 gasto de capital no atado a proyectos.

¹⁴ Grupos de Gasto 96, 97 y 99 atado a gasto corriente excluyendo Tesoro Nacional.

¹⁵ Grupos 73 (Bienes y servicios), correspondiente al “Programa de preservación de capital - Periodo 2025”, cuya entidad responsable es el MEF, conforme Oficio de dictamen de prioridad Nro. SNP-SNP-SGP-2025-0005-O de 14 de enero 2025.


¹⁶ Grupos 96 y 99 (Amortización de Deuda Pública; Otros Pasivos, Costos de obligaciones firmes del Estado; Costos y gastos asociados a procedimientos arbitrales o judiciales), del “Programa de preservación de capital - Periodo 2025”, cuya entidad responsable es el MEF.

¹⁷ El Eje Económico, Productivo y Empleo, contempla el “Programa de preservación de capital periodo 2025”. La categoría “En proceso de alineación”, corresponde al presupuesto de las entidades que no han finalizado el registro de la planificación institucional y por ende no cuentan con la alineación a los Objetivos del PND 2025-2029, este grupo de entidades se detallan en la sección 6.3. En esta misma categoría se incluyen las unidades administrativas financieras de otras entidades que por su estructura orgánica no están sujetas a presentar sus planes institucionales siendo estas: (Dirección Nacional de Salud de la Policía Nacional, Dirección Nacional de la Policía Judicial y Hospital de Especialidades Fuerzas Armadas No. 1). Además, se incluyen las entidades que fueron sujetas a fusión (Decreto Ejecutivo Nro. 60, de 24 de julio de 2025) o son de nueva creación, que no tienen alineación a los objetivos del PND 2025-2029.

En referencia al **Gasto Permanente**, la Ilustración 5 muestra la alineación de los Planes Institucionales, por ejes del PND 2025-2029. El Eje Social presenta un mayor monto codificado de USD 15.902,14 millones, seguido por el Eje Institucional con un valor de USD 2.119,41 millones; y, el Eje de Agua, Ambiente, Energía y Conectividad con USD 322,07 millones.

En cuanto a la ejecución presupuestaria del **Gasto Permanente**, se identifica que, el Eje de Riesgos presenta el 69,48% con mayor porcentaje devengado, seguido por el Eje Ambiente, Agua, Energía y Conectividad con el 68,04%; mientras que, el menor en ejecución corresponde al Eje Económico, Productivo y Empleo con el 48,42%.

Ilustración 5. Ejecución presupuestaria por ejes del PND – Gasto Permanente (millones de dólares)¹⁸

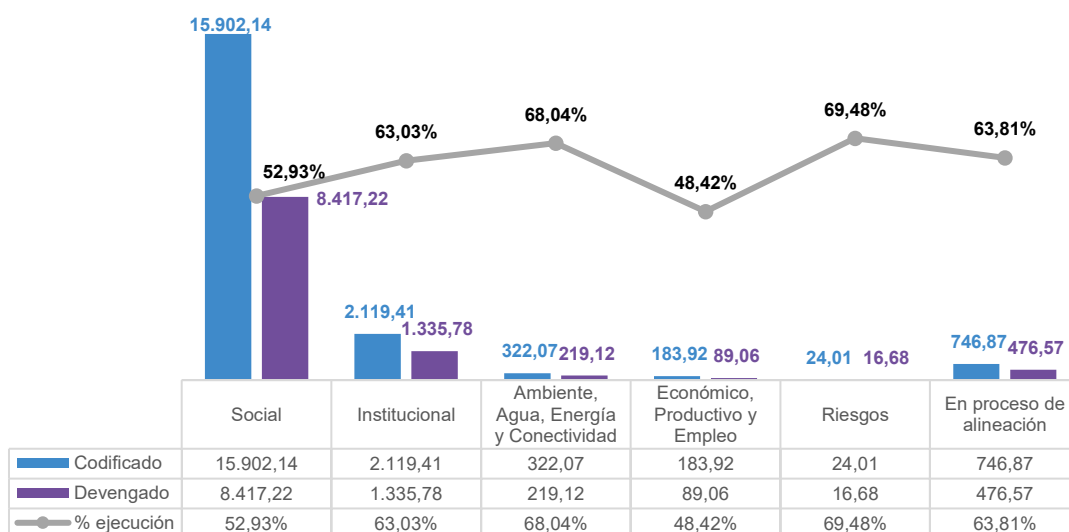

Fuente: SIPeIP - Seguimiento a planes institucionales, Presidencia de la República, corte al 30 de septiembre de 2025. e-SIGEF, MEF – Ejecución Presupuestaria, corte al 30 de septiembre de 2025.

Elaboración: Dirección de Seguimiento a la Planificación y Política Pública – Presidencia de la República.


En lo que se refiere al **Gasto No Permanente**, la ilustración 6 muestra la alineación de los estudios, programas y proyectos de inversión por ejes del PND 2025–2029¹⁹. El mayor monto codificado corresponde al Eje Económico, Productivo y Empleo USD 6.337,44 millones, seguido del Eje Social USD 1.100,52 millones, Eje Ambiente, Agua, Energía y Conectividad USD 579,47 millones, Institucional USD 337,39 millones y Gestión de Riesgos USD 17,63 millones.

Es preciso indicar que, el monto del Eje Económico, Productivo y Empleo incluye el “*Programa de preservación de capital periodo 2025*”, ejecutado por el MEF, con un presupuesto codificado de USD 6.140,09 millones y devengado de USD 4.206,75 millones al 30 de septiembre de 2025.

¹⁸ La categoría “*En proceso de alineación*”, corresponde al presupuesto de las entidades que no han finalizado el registro de la planificación institucional y por ende no cuentan con la alineación a los Objetivos del PND 2025-2029, este grupo de entidades se detallan en la sección 6.3. En esta misma categoría se incluyen las unidades administrativas financieras de otras entidades que por su estructura orgánica no están sujetas a presentar sus planes institucionales siendo estas: (Dirección Nacional de Salud de la Policía Nacional, Dirección Nacional de la Policía Judicial y Hospital de Especialidades Fuerzas Armadas No. 1). Además, se incluyen las entidades que fueron sujetas a fusión (Decreto Ejecutivo Nro. 60, de 24 de julio de 2025) o son de nueva creación, que no tienen alineación a los objetivos del PND 2025-2029.

¹⁹ No se cuenta con la alineación a los objetivos del PND 2025-2029 de cuatro (4) proyectos de la Universidad Estatal del Sur de Manabí, ya que la entidad no cumplió con el reporte de dicha información en el Módulo de Seguimiento del SIPeIP. Adicionalmente, se identificó dos (2) proyectos que no realizaron la alineación a los objetivos del PND 2025-2029, los cuales corresponden a la ex-Secretaría Nacional de Planificación y al ex-Ministerio de Deporte.

Ilustración 6. Ejecución presupuestaria por ejes del PND – Gasto no Permanente
(millones de dólares)

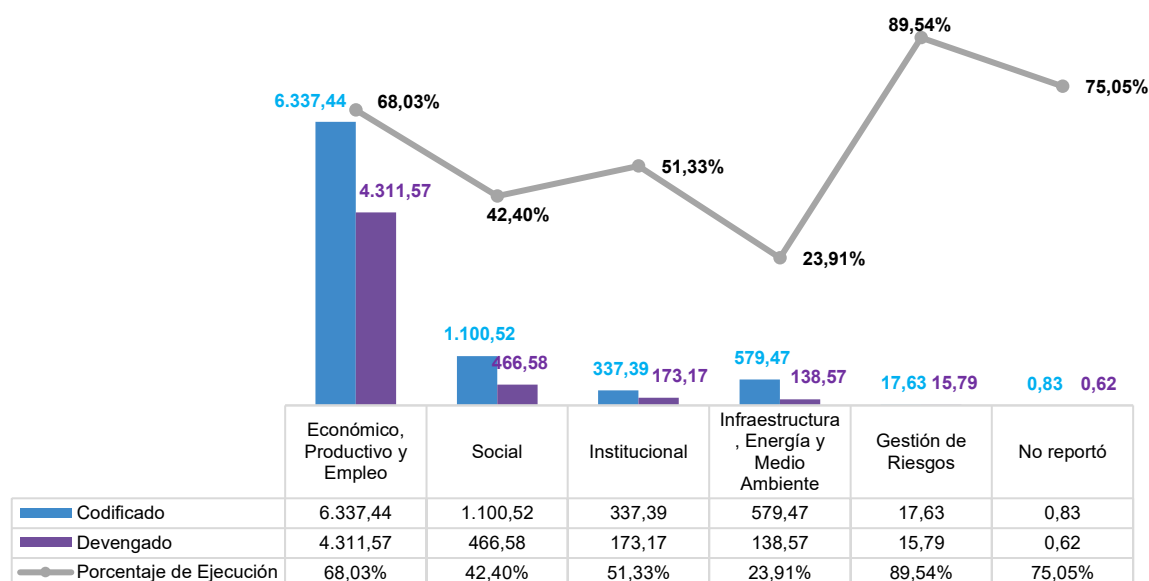


Fuente: e-SIGEF, MEF- Ejecución Presupuestaria, corte al 30 de septiembre de 2025.

Elaboración: Dirección de Seguimiento a la Inversión – Presidencia de la República.

Adicionalmente, con el fin de identificar la gestión realizada en la ejecución del **Gasto No Permanente**, se presenta a continuación la ejecución por ejes del PND, considerando los anticipos y el monto codificado con fuente de financiamiento entregados para el periodo.

Ilustración 7. Ejecución: Devengado más anticipos en relación del codificado con fuente
(millones de dólares)

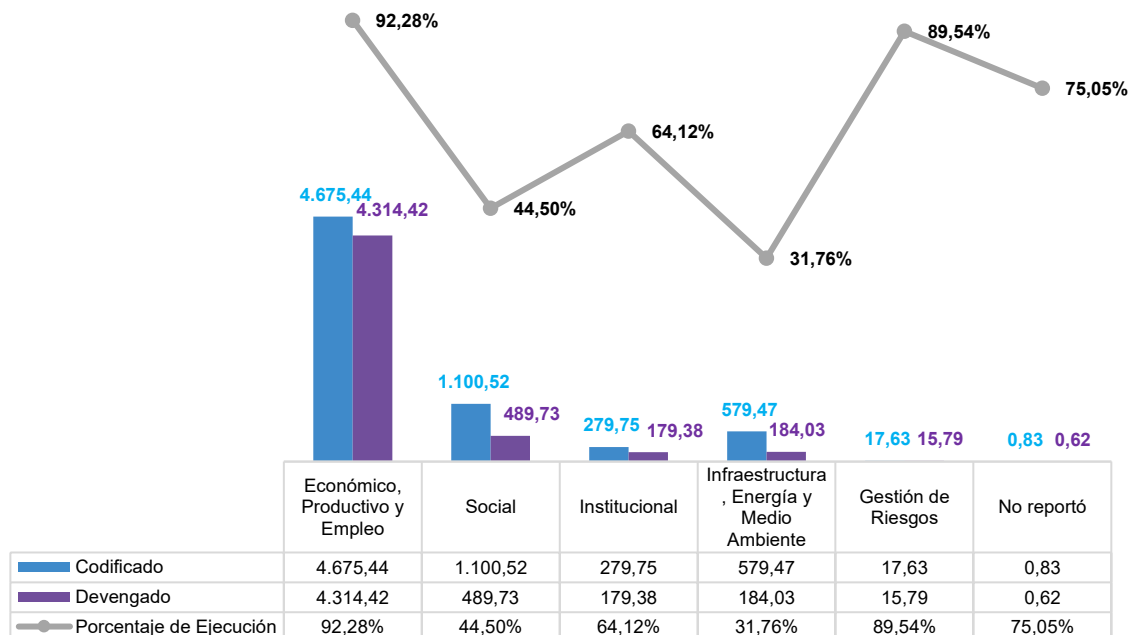

Fuente: e-SIGEF, MEF- Ejecución Presupuestaria, corte al 30 de septiembre de 2025.

Elaboración: Dirección de Seguimiento a la Inversión – Presidencia de la República.


De acuerdo a la Ilustración 7, el mayor monto codificado con fuente corresponde al Eje Económico, Productivo y Empleo USD 4.675,44 millones, seguido del Eje Social USD 1.100,52 millones, Eje de Ambiente, Agua, Energía y Conectividad USD 579,47 millones, Institucional USD 279,75 millones y Gestión de Riesgos USD 17,63 millones. El Eje Económico, Productivo y Empleo registra la mayor ejecución 92,28%, mientras que el Eje de Ambiente, Agua, Energía y Conectividad presenta el nivel más bajo 31,76%.

6.3. Ejecución presupuestaria Gasto Permanente – Planes Institucionales

De acuerdo con la información registrada en la base del e-SIGEF, proporcionada por el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), se contempla el presupuesto de Gasto Permanente de 162 entidades que forman parte del Presupuesto General del Estado (PGE).

Al 30 de septiembre de 2025, se registra un presupuesto codificado de USD 19.298,43 millones y un devengado de USD 10.554,44 millones, lo que representa una ejecución presupuestaria del 54,69%.

Ilustración 8. Ejecución presupuestaria – Gasto Permanente
(millones de dólares)



Fuente: Base de datos e-SIGEF– MEF - Ejecución Presupuestaria, corte 30 de septiembre de 2025.

Elaboración: Dirección de Seguimiento a la Planificación y Política Pública – Presidencia de la República.

Para el análisis del presupuesto del Gasto Permanente que financia los planes institucionales de las entidades que conforman el Presupuesto General del Estado (PGE), se identifica que, de un total de 162 entidades, 131 cumplieron con su planificación institucional en estado “Registrado” y realizaron la vinculación de sus programas presupuestarios con los objetivos del Plan Nacional de Desarrollo (PND) 2025-2029, de acuerdo con las directrices emitidas por la Subsecretaría de Planificación.

Al tercer trimestre de 2025, se registra un presupuesto codificado de USD 18.551,56 millones y un devengado de USD 10.077,87 millones, lo que refleja el grado de articulación entre la planificación y la ejecución presupuestaria de las 131 entidades mencionadas, según se detalla en la siguiente tabla:

Tabla 7. Gasto permanente por ejes y objetivos del PND

Eje	Objetivo PND	Nro. Entidades	Nro. Programas Presupuestarios	Codificado	Devengado	Ejecución (%)
1. Social	1	12	22	6.640,08	3.282,62	49,44%
	2	38	97	5.588,38	2.533,13	45,33%
	3	13	24	3.673,68	2.601,47	70,81%
2. Económico, Productivo y Empleo	4	10	12	82,25	52,14	63,39%
	5	11	21	101,68	36,93	36,32%
3. Ambiente, Agua, Energía y Conectividad	6	8	16	27,63	13,93	50,42%
	7	10	16	294,44	205,19	69,69%

Eje	Objetivo PND	Nro. Entidades	Nro. Programas Presupuestarios	Codificado	Devengado	Ejecución (%)
4. Institucional	8	131	154	2.119,41	1.335,78	63,03%
5. Riesgos	9	2	4	24,01	16,68	69,48%
Total			366	18.551,56	10.077,87	54,32%

Nota: Una entidad puede tener más de un programa presupuestario que se alinean a diferentes objetivos del PND.


Fuente: Base de datos e-SIGEF, Ejecución Presupuestaria Consolidada – MEF corte al 30 de septiembre de 2025. Estado de validación de planes institucionales tercer trimestre 2025, corte 30 de septiembre de 2025.

Elaboración: Dirección de Seguimiento a la Planificación y Política Pública – Presidencia de la República.

En la Ilustración 9, se muestra el presupuesto codificado (USD 18.551,56 millones) y devengado (USD 10.077,87 millones) desagregado por objetivos del PND 2025-2029, en el cual se observa que el Objetivo 1 tiene el mayor monto codificado por un valor de USD 6.640,08 millones, seguido por el Objetivo 2 con un valor de USD 5.588,38 millones, el Objetivo 3 con USD 3.673,68 millones y el Objetivo 8 con USD 2.119,41 millones, entre los principales.

En cuanto a la ejecución presupuestaria, se observa que, el Objetivo 3 presenta el mayor porcentaje con el 70,81%, seguido del Objetivo 7 con el 69,69%, y Objetivo 9 con el 69,48%; mientras que el Objetivo 5 es el que presenta menor ejecución con el 36,32%.

Ilustración 9. Ejecución presupuestaria por Objetivos PND - Gasto Permanente (millones de dólares y porcentaje)

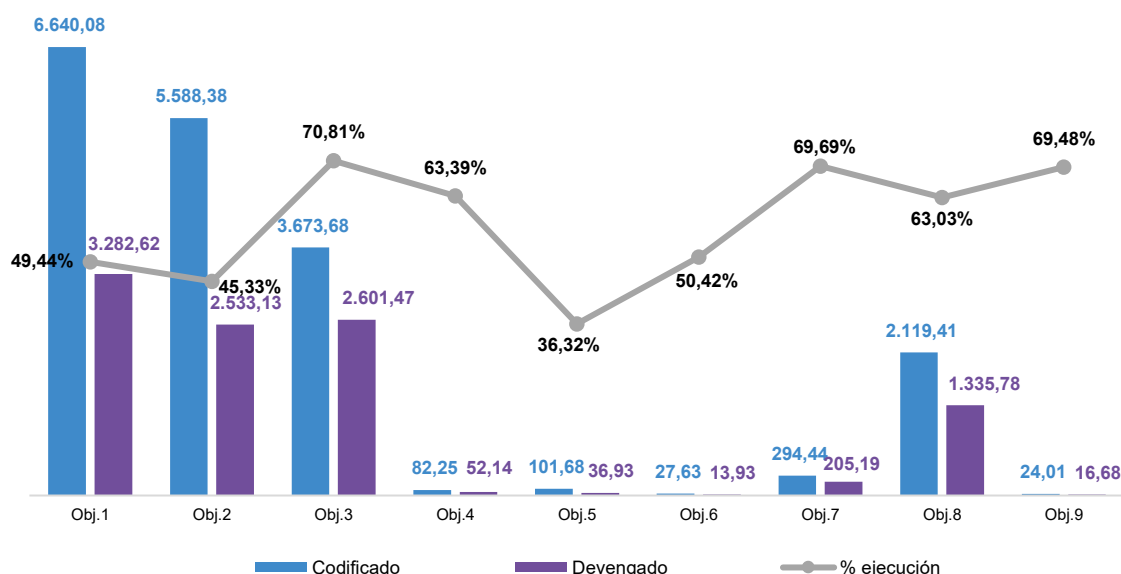

Fuente: Base de datos e-SIGEF, Ejecución Presupuestaria Consolidada – MEF corte al 30 de septiembre de 2025. Estado de validación de planes institucionales tercer trimestre 2025, corte 30 de septiembre de 2025.

Elaboración: Dirección de Seguimiento a la Planificación y Política Pública – Presidencia de la República.

Complementariamente al análisis presupuestario del Gasto Permanente, se identifica que 31 de las 162 entidades del PGE, se encuentran en la categoría “*en proceso de alineación*”, por lo que, de acuerdo a su clasificación y estado de validación de sus planes institucionales, estas entidades aún no presentan alineación a los objetivos del PND; en otros casos, han sido objeto de cambios en su estructura funcional debido a procesos de fusión o eliminación institucional. No obstante, con el propósito de conciliar el total del Gasto Permanente del PGE, se considera necesario incorporar el detalle de las entidades que se encuentran en la categoría mencionada.

En este contexto, se presenta la desagregación presupuestaria correspondiente a este grupo de

entidades, que en total registran un codificado de USD 746,87 millones y un devengado de USD 476,57 millones, conforme al siguiente detalle:

Tabla 8. Detalle de presupuesto de entidades con planes institucionales registrados y en proceso de alineación al PND 2025-2029

Entidad	Codificado (MM USD)	Devengado (MM USD)	Ejecución (%)
Servicio Nacional de Aduana del Ecuador	45,80	31,33	68,40%
Universidad Estatal de Bolívar	22,10	11,07	50,07%
Contraloría General del Estado	77,17	53,91	69,87%
Universidad de Investigación de Tecnología Experimental Yachay	21,53	9,33	43,36%
Total	166,59	105,64	63,41%

Fuente: Base de datos e-SIGEF, Ejecución Presupuestaria Consolidada – MEF corte al 30 de septiembre de 2025. Estado de validación de planes institucionales tercer trimestre 2025 – Presidencia de la República, corte 30 de septiembre de 2025.

Elaboración: Dirección de Seguimiento a la Planificación y Política Pública – Presidencia de la República.

Tabla 9. Detalle de presupuesto de entidades sin planes institucionales registrados
(en estado de validación, observado, no enviado)

Entidad	Codificado (MM USD)	Devengado (MM USD)	Ejecución (%)
Agencia de Regulación y Control de Electricidad	9,64	4,36	45,19%
Agencia de Regulación y Control de Hidrocarburos	10,28	7,57	73,69%
Agencia de Regulación y Control Minero	5,80	3,60	62,04%
Superintendencia de Protección de Datos Personales	1,54	0,97	62,72%
Instituto de Cine y Creación Audiovisual	0,32	0,09	29,14%
Instituto de Promoción del Ecuador	3,06	1,66	54,20%
Instituto de Fomento de las Artes Innovación y Creatividades	4,43	1,42	32,14%
Instituto Oceanográfico y Antártico de la Armada	10,58	5,44	51,39%
Instituto de Fomento a la Creatividad y la Innovación	5,56	5,56	99,98%
Unidad de Gestión y Regularización	2,90	2,07	71,52%
Total	54,11	32,75	60,51%

Fuente: Base de datos e-SIGEF, Ejecución Presupuestaria Consolidada – MEF corte al 30 de septiembre de 2025. Estado de validación de planes institucionales tercer trimestre 2025, corte 30 de septiembre de 2025.

Elaboración: Dirección de Seguimiento a la Planificación y Política Pública – Presidencia de la República.

Tabla 10. Detalle de presupuesto de universidades sin planes institucionales registrados
(en estado de validación, observado, no enviado)

Entidad	Codificado (MM USD)	Devengado (MM USD)	Ejecución (%)
Universidad Agraria del Ecuador	20,38	10,33	50,68%
Universidad Central del Ecuador	151,58	88,18	58,18%
Universidad Técnica Luis Vargas Torres de Esmeraldas	21,80	13,63	62,50%
Total	193,77	112,14	57,87%

Fuente: Base de datos e-SIGEF, Ejecución Presupuestaria Consolidada – MEF corte al 30 de septiembre de 2025. Estado de validación de planes institucionales tercer trimestre 2025, corte 30 de septiembre de 2025.

Elaboración: Dirección de Seguimiento a la Planificación y Política Pública – Presidencia de la República.

Tabla 11. Detalle de presupuesto sin planes institucionales, de unidades administrativas de otras entidades

Entidad	Codificado (MM USD)	Devengado (MM USD)	Ejecución (%)
Hospital de Especialidades Fuerzas Armadas No. 1	50,91	26,93	52,91%
Dirección Nacional de la Policía Judicial	6,52	3,83	58,85%
Dirección Nacional de Salud de la Policía Nacional	36,51	15,44	42,29%
Total	93,94	46,21	49,19%

Fuente: Base de datos e-SIGEF, Ejecución Presupuestaria Consolidada – MEF corte al 30 de septiembre de 2025. Estado de validación de planes institucionales tercer trimestre 2025, corte 30 de septiembre de 2025. Corresponden 3 unidades administrativas que por su estructura orgánica no están sujetas a presentar sus planes institucionales.

Elaboración: Dirección de Seguimiento a la Planificación y Política Pública – Presidencia de la República.

Tabla 12. Detalle de presupuesto de entidades sin alineación a Objetivos PND 2025-2029.
(proceso de absorción por Decreto Ejecutivo No. 60, de 24 de julio de 2025)

Entidad	Codificado (MM USD)	Devengado (MM USD)	Ejecución (%)
Ministerio de Cultura y Patrimonio	15,56	12,19	78,32%
Ministerio de Desarrollo Urbano y Vivienda	5,53	5,50	99,44%
Ministerio de la Mujer y Derechos Humanos	11,06	10,78	97,42%
Ministerio de Turismo	5,79	5,79	100,00%
Ministerio del Deporte	51,89	42,83	82,54%
Secretaría Técnica del Comité de Prevención de Asentamientos Humanos Irregulares	0,40	0,39	99,87%
Secretaría Técnica Ecuador Crece sin Desnutrición Infantil	2,38	2,38	100,00%
Secretaría de Educación Superior Ciencia Tecnología e Innovación	113,76	71,58	62,93%
Secretaría Nacional de Planificación	5,44	5,44	100,00%
Ministerio del Ambiente Agua y Transición Ecológica	23,49	22,04	93,84%
Secretaría de Inversiones Público-Privadas	3,17	0,92	29,01%
Total	238,46	179,84	75,42%

Fuente: Base de datos e-SIGEF, Ejecución Presupuestaria Consolidada – MEF corte al 30 de septiembre de 2025. Estado de validación de planes institucionales tercer trimestre 2025, corte 30 de septiembre de 2025.

Elaboración: Dirección de Seguimiento a la Planificación y Política Pública – Presidencia de la República.

6.4. Ejecución presupuestaria Gasto No Permanente – Plan Anual de Inversiones

El Plan Anual de Inversiones con corte al 30 de septiembre de 2025, consta de 492 estudios, programas y proyectos de inversión, de los cuales 482 proyectos se encuentran en el módulo de seguimiento del SIPeIP porque tuvieron asignación presupuestaria en este año; mientras que 10 proyectos no contaron con monto codificado hasta el 30 de septiembre de 2025 y, por tanto, no son sujetos de seguimiento. Dentro de los 482 proyectos, se contempla el presupuesto de 77 entidades que forman parte del Plan Anual de Inversiones y del Presupuesto General del Estado.

En este sentido, al 30 de septiembre de 2025, se cuenta con un valor codificado de USD 8.373,27 millones y un devengado de USD 5.106,31 millones, lo que representa una ejecución presupuestaria del 60,98% al tercer trimestre del año 2025.

Ilustración 10. Ejecución Presupuestaria - Gasto No Permanente
(millones de dólares)




Fuente: e-SIGEF, MEF- Ejecución Presupuestaria, corte al 30 de septiembre de 2025.

Elaboración: Dirección de Seguimiento a la Inversión – Presidencia de la República.

Es importante señalar que, el “Programa de preservación de capital periodo 2025”, alineado al Objetivo 4 y clasificado en los grupos de gasto: 73 “Bienes y Servicios para inversión”, 96 “Amortización de la deuda pública” y 99 “Otros pasivos”, registró un codificado de USD 6.140,09 millones y un devengado de USD 4.206,75 millones, alcanzando una ejecución del 68,51%.

En la Ilustración 11 que se muestra a continuación, se detalla el presupuesto de Gasto No Permanente por objetivos del Plan Nacional de Desarrollo 2025-2029, excluyendo al “Programa de preservación de capital periodo 2025”.

Ilustración 11. Ejecución presupuestaria por Objetivos PND - Gasto No Permanente
(millones de dólares)

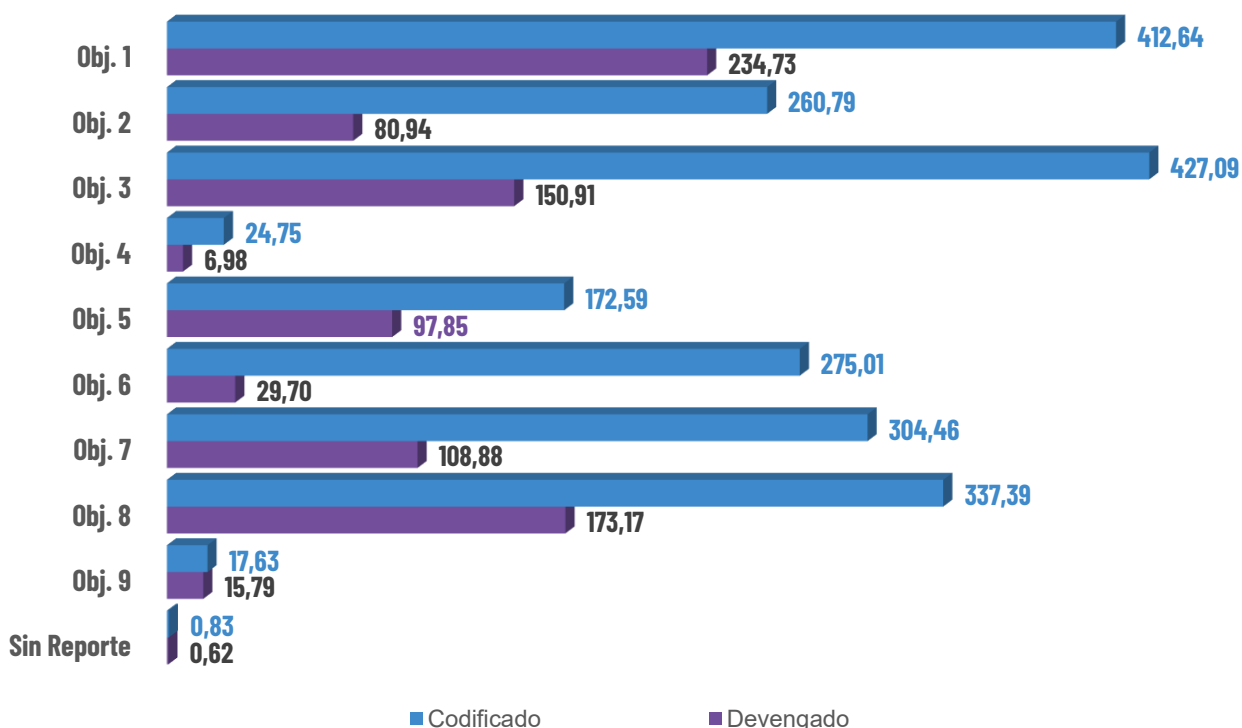

Nota: Para una mejor visualización, se excluye la información del “Programa de preservación de capital periodo 2025”, que se encuentra alineado al Objetivo 4.

Fuente: e-SIGEF, MEF- Ejecución Presupuestaria, corte al 30 de septiembre de 2025.

Elaboración: Dirección de Seguimiento a la Inversión – Presidencia de la República.

Se identifica que, el Objetivo 3, es el que concentra el mayor monto codificado, con 427,09 millones, mientras que el Objetivo 9 muestra el menor monto codificado, con USD 17,63 millones.


Además, se observa que, el Objetivo 1 registra el mayor monto devengado, alcanzando los USD 234,73 millones, mientras que el Objetivo 4 muestra el menor monto devengado, con USD 6,98 millones.

Por su parte, al realizar el análisis considerando el monto de codificado y devengado por objetivo del Plan Nacional de Desarrollo, en la Ilustración 11, se observa que el objetivo con mayor monto codificado es el Objetivo 3 (USD 427,09 millones) y un devengado de USD 150,91 millones. Mientras que el Objetivo con menor presupuesto codificado es el Objetivo 9 (USD 17,63 millones) y un devengado de USD 15,79 millones.

A continuación, se detalla la evolución mensual de la asignación de fuentes de financiamiento por parte del Ente Rector de las Finanzas Públicas durante el 2025, excluyendo el "Programa de preservación de capital periodo 2025".

- **Primer trimestre:** Al 31 de marzo de 2025, del monto codificado de USD 1.934,26 millones, se asignaron fuentes de financiamiento por USD 1.792,51 millones, es decir el 92,67% del total del monto codificado contó con fuente de financiamiento al primer trimestre de 2025.
- **Segundo trimestre:** Al 30 de junio de 2025, el monto total codificado se incrementó a USD 2.165,99 millones y el Ente Rector de las Finanzas Públicas asignó fuente de financiamiento por USD 2.084,35 millones; es decir el 96,23% del total del monto codificado contó con fuente de financiamiento al segundo trimestre de 2025.
- **Tercer trimestre:** Al 30 de septiembre de 2025, el monto total codificado se incrementó a USD 2.233,18 millones y el Ente Rector de las Finanzas Públicas asignó fuente de financiamiento por USD 2.175,54 millones; es decir el 97,42% del total del monto codificado contó con fuente de financiamiento al tercer trimestre de 2025.

Ilustración 12. Variación mensual asignación fuente Gasto No Permanente (millones de dólares y porcentaje de financiamiento)

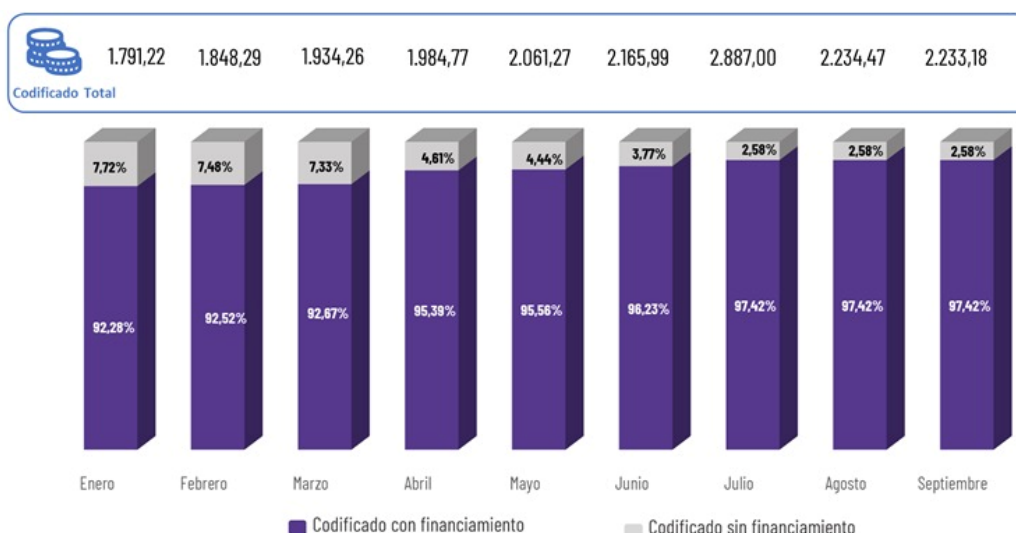

Nota: Para una mejor visualización, se excluye la información del "Programa de preservación de capital periodo 2025", que se encuentra alineado al Objetivo 4.

Fuente: SiPeIP, Presidencia de la República, e-SIGEF, MEF- Ejecución Presupuestaria, corte al 30 de septiembre de 2025.

Elaboración: Dirección de Seguimiento a la Inversión – Presidencia de la República.

Adicionalmente, con la finalidad de identificar la gestión que se ha realizado en la ejecución del **Gasto No Permanente**, a continuación, se presenta la ejecución considerando el monto de anticipos y el monto codificado con fuente entregados en el periodo del tercer trimestre de 2025, por Ejes del Plan Nacional de Desarrollo, observándose un monto devengado con anticipos de USD 5.183,97 millones.


Ilustración 13. Ejecución: Devengado más anticipos en relación al codificado con fuente - Gasto No Permanente (millones de dólares)



Fuente: SIPeIP, Presidencia de la República, e-SIGEF, MEF- Ejecución Presupuestaria, corte al 30 de septiembre de 2025.
Elaboración: Dirección de Seguimiento a la Inversión – Presidencia de la República.

Por su parte, al realizar el análisis considerando el monto de anticipos y el monto codificado con fuente de financiamiento asignada por el ente rector de las finanzas públicas, que fueron entregados en el periodo del tercer trimestre de 2025, en la Ilustración 14, se observa que el objetivo con mayor porcentaje de ejecución es el Objetivo 9 con 89,54%, que corresponde a un monto codificado con fuente de USD 17,63 millones y un devengado con anticipos de USD 15,79 millones.

Ilustración 14. Variación mensual asignación fuente - Gasto No Permanente (millones de dólares y porcentaje de financiamiento)

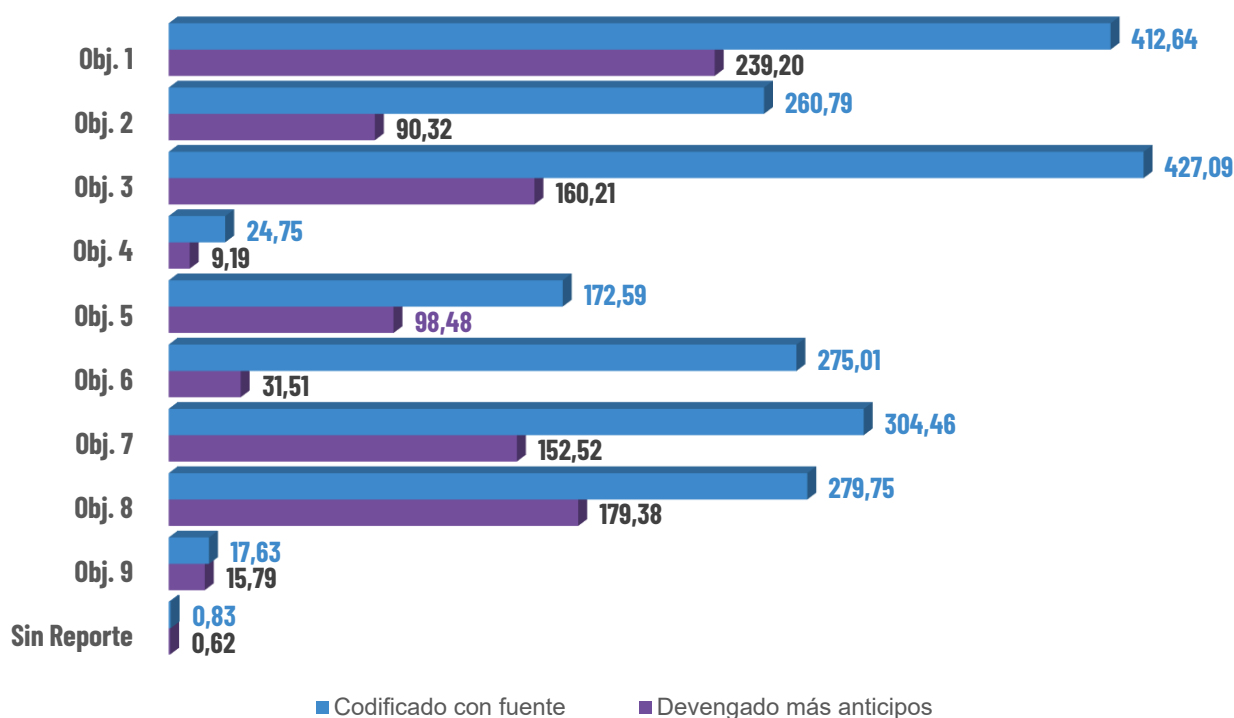

Nota: Para una mejor visualización, se excluye la información del “Programa de preservación de capital periodo 2025”, que se encuentra alineado al Objetivo 4.

Fuente: e-SIGEF, MEF- Ejecución Presupuestaria, corte al 30 de septiembre de 2025.
Elaboración: Dirección de Seguimiento a la Inversión – Presidencia de la República.

7. Ejecución física del Presupuesto General del Estado por Objetivos del Plan Nacional de Desarrollo

Seguimiento a Planes Institucionales - Gasto Permanente

Para el análisis del seguimiento físico del nivel estratégico de los planes institucionales, con corte al 30 de septiembre de 2025, se consolida la información reportada por 50 de las 162 entidades articuladas al Gasto Permanente del Presupuesto General del Estado. Estas entidades presentan programación de metas mensuales y trimestrales en su planificación institucional, correspondiente al periodo fiscal 2025. Además, han cumplido con el proceso de “Registro” de su Planificación Institucional, la alineación a los Objetivos del Plan Nacional de Desarrollo (PND) 2025-2029 y la sistematización de la programación anual de su Plan Institucional 2025²⁰.

A continuación, se presenta la alineación de los objetivos institucionales con los ejes y objetivos del Plan Nacional de Desarrollo 2025-2029, en la cual se reflejan las entidades alineadas, los objetivos institucionales (120) y los indicadores vinculados (263).

Tabla 13. Alineación de entidades a Objetivos del PND 2025-2029

Eje	Eje Objetivos PND 2025-2029	Entidades (No.)	Objetivos Institucionales (No.)	Indicadores (No.)
Social	1. Mejorar el bienestar social y la calidad de vida de la población, garantizando el goce efectivo de los derechos y la reducción de las desigualdades.	8	20	48
	2. Potenciar las capacidades de la ciudadanía con acceso universal a una educación inclusiva de calidad, acceso a espacios de intercambio cultural y una vida activa.	4	6	9
	3. Garantizar un estado soberano, seguro, y justo promoviendo la convivencia pacífica y el respeto a los derechos humanos.	3	6	15
Económico, Productivo y Empleo	4. Impulsar el desarrollo económico que genere empleo de calidad y finanzas públicas, sostenibles, inclusivas y equitativas.	5	10	29
	5. Fortalecer la producción y la inversión extranjera en los sectores clave de la economía con innovación tecnológica y prácticas sostenibles.	9	19	54
Ambiente, Agua, Energía y Conectividad	6. Precautelar el uso sostenible de los recursos naturales, la protección del ambiente, así como la optimización y la eficiencia energética.	6	11	20
	7. Impulsar el desarrollo de infraestructuras sostenibles y resilientes; y de la conectividad física y digital, que brinde condiciones de crecimiento y desarrollo económico.	10	28	44
Institucional	8. Fortalecer la institucionalidad pública de forma eficiente, transparente y participativa.	9	21	38
Riesgos	9. Fortalecer la capacidad de respuesta y resiliencia de las ciudades y comunidades ante riesgos de origen natural y antrópico.	2	2	6
Total			120	263

Nota: Una entidad puede tener sus objetivos institucionales alineados a uno o más objetivos del PND 2025-2029.


Fuente: SIPeIP- GPR corte 30 de septiembre de 2025.

Elaboración: Dirección de Seguimiento a la Planificación y Política Pública – Presidencia de la República.

²⁰ La programación anual de los planes institucionales 2025, mantienen su vigencia hasta que se apruebe su nuevo Plan Estratégico Institucional 2025-2029, considerando los lineamientos emitidos por la Subsecretaría de Planificación.

Con base en el total de indicadores y su configuración, que se consideran para el proceso de seguimiento, se obtiene que el 81,37% cuentan con avance esperado, el 5,70% un avance cercano al esperado y el 12,93% un avance menor a lo esperado; conforme a las categorías y umbrales descritos en la metodología aplicada para este informe.

Ilustración 15. Porcentaje de cumplimiento por indicadores analizados

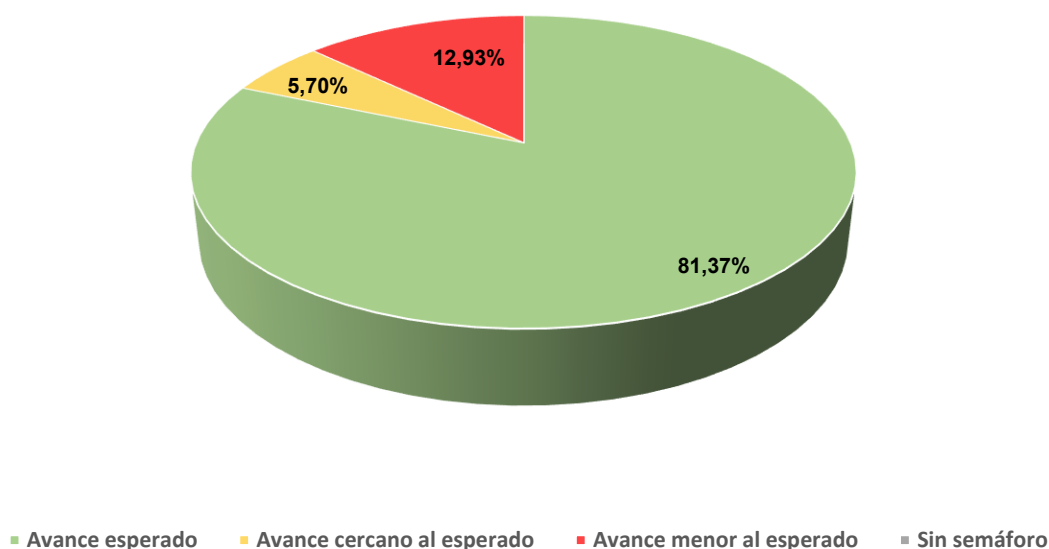

Fuente: SIPeIP- GPR corte 30 de septiembre de 2025.

Elaboración: Dirección de Seguimiento a la Planificación y Política Pública – Presidencia de la República.

Seguimiento a Proyectos de Inversión - Gasto No Permanente

Para el análisis del seguimiento a la ejecución física del **Gasto No Permanente** del Presupuesto General del Estado, con corte al 30 de septiembre de 2025, se consideran 77 entidades que conforman el Plan Anual de Inversiones, cuyas iniciativas se encuentran alineadas a los Ejes y Objetivos del PND 2025–2029.

A continuación, se presenta la Tabla 14 que muestra el número de entidades y proyectos vinculados a cada eje y objetivo del PND, junto con su respectiva programación física y el nivel de cumplimiento, según las categorías de semaforización aplicadas para el seguimiento de proyectos de inversión.

Tabla 14. Promedio de cumplimiento de metas del Plan Anual de Inversiones - PND 2025-2029

Eje	Objetivos PND 2025-2029	Nro. Entidades	Nro. Proyectos	% Promedio cumplimiento físico 2025	Cumplimiento de metas físicas			
					Avance esperado (≥ 100% y < 95%)	Avance cercano al esperado (> 95% y ≤ 85%)	Avance menor al esperado (<85%)	Sin Programación
1. Social	1. Mejorar el bienestar social y la calidad de vida de la población, para garantizar el goce efectivo de los derechos	6	35	74,89%	28,57%	5,71%	37,14%	28,57%

Eje	Objetivos PND 2025-2029	Nro. Entidades	Nro. Proyectos	% Promedio cumplimiento físico 2025	Cumplimiento de metas físicas			
					Avance esperado (≥ 100% y < 95%)	Avance cercano al esperado (> 95% y ≤ 85%)	Avance menor al esperado (<85%)	Sin Programación
	y la reducción de las desigualdades.							
	2. Potenciar las capacidades de la ciudadanía con acceso universal a una educación inclusiva de calidad, acceso a espacios de intercambio cultural y una vida activa.	32	243	71,23%	36,63%	2,06%	30,45%	30,86%
	3. Garantizar un Estado soberano, seguro, y justo promoviendo la convivencia pacífica y el respeto a los derechos humanos.	11	34	60,60%	23,53%	0,00%	47,06%	29,41%
2. Eje Económico, Productivo y Empleo	4. Impulsar el desarrollo económico que genere empleo de calidad y finanzas públicas, sostenibles, inclusivas y equitativas.	6	10	75,97%	50,00%	0,00%	40,00%	10,00%
	5. Fortalecer la producción nacional y la inversión extranjera en los sectores clave de la economía con innovación tecnológica y prácticas sostenibles.	8	37	80,80%	35,14%	5,41%	29,73%	29,73%
3. Eje Ambiente, Agua, Energía y Conectividad	6. Precautelar el uso sostenible de los recursos naturales, la protección del ambiente, así como la optimización y la eficiencia energética.	5	33	80,32%	39,39%	6,06%	18,18%	36,36%
	7. Impulsar el desarrollo de infraestructuras sostenibles y resilientes; y de	4	41	47,82%	21,95%	2,44%	39,02%	36,59%

Eje	Objetivos PND 2025-2029	Nro. Entidades	Nro. Proyectos	% Promedio cumplimiento físico 2025	Cumplimiento de metas físicas			
					Avance esperado (≥ 100% y < 95%)	Avance cercano al esperado (> 95% y ≤ 85%)	Avance menor al esperado (<85%)	Sin Programación
	la conectividad física y digital, que brinde condiciones de crecimiento y desarrollo económico.							
4. Institucional	8. Fortalecer la institucionalidad pública de forma eficiente, transparente y participativa.	25	39	62,85%	35,90%	0,00%	35,90%	28,21%
5. Gestión de Riesgos	9. Fortalecer la capacidad de respuesta y resiliencia de las ciudades y comunidades ante riesgos de origen natural y antrópico.	1	4	33,64%	25,00%	0,00%	75,00%	0,00%
Total general		99	476	69,06%	34,03%	2,52%	32,98%	30,46%


Nota: No se cuenta con la alineación a los objetivos del PND 2025-2029 de cuatro (4) proyectos de la Universidad Estatal del Sur de Manabí, un (1) proyecto de la ex-Secretaría Nacional de Planificación y uno (1) del ex-Ministerio de Deporte.

Fuente: SIPeIP, Presidencia de la República, e-SIGEF, MEF- Ejecución Presupuestaria, corte al 30 de septiembre de 2025.

Elaboración: Dirección de Seguimiento a la Inversión – Presidencia de la República.

A nivel general, el 34,03% de los proyectos del Plan Anual de Inversiones 2025 presentan un avance esperado, mientras que el 32,98% reportan un avance menor al esperado al cierre del tercer trimestre de 2025.

Ilustración 16. Resumen de cumplimiento general – Gasto No Permanente

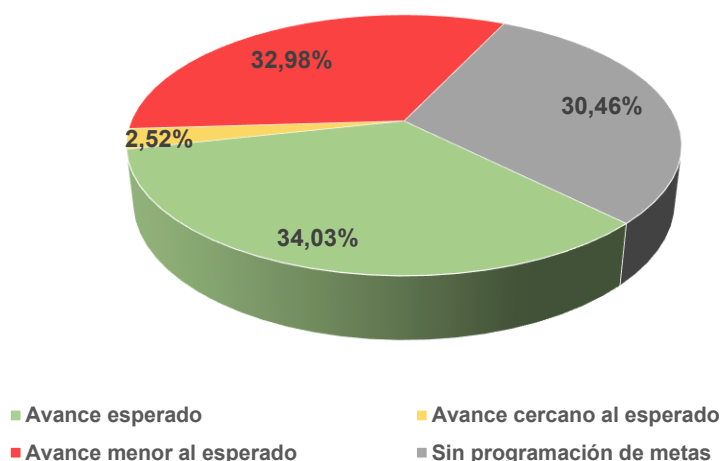


Fuente: SIPeIP, Presidencia de la República, e-SIGEF, MEF- Ejecución Presupuestaria, corte al 30 de septiembre de 2025.

Elaboración: Dirección de Seguimiento a la Inversión – Presidencia de la República.

En cuanto al cumplimiento físico alineado a los Objetivos del Plan Nacional de Desarrollo 2025–2029, se observa que el Objetivo 4 registra el mayor porcentaje de proyectos con un *avance esperado* con 50,00%. En contraste, el Objetivo 9 presenta el mayor porcentaje de proyectos con *avance menor al esperado* con 75%.

Ilustración 17. Porcentaje de cumplimiento de proyectos PAI por Objetivos

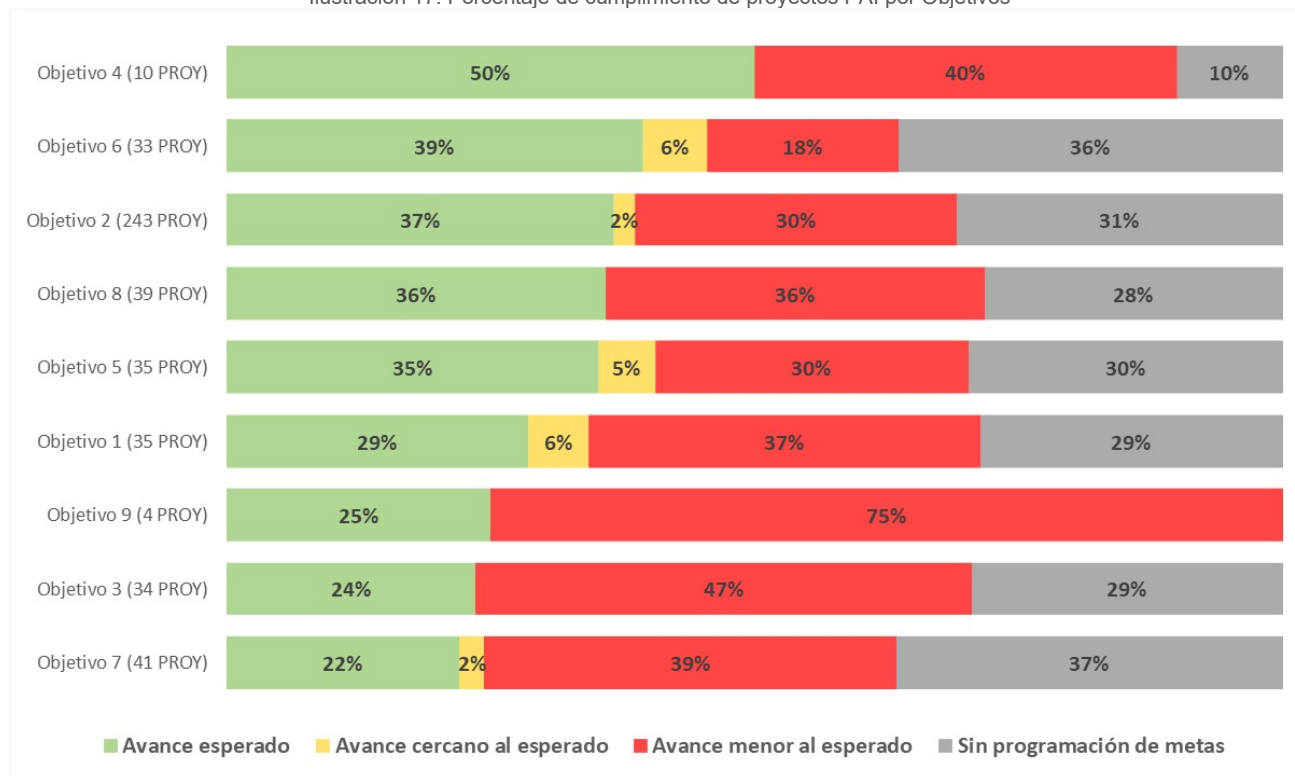

Fuente: SIPeIP, Presidencia de la República, e-SIGEF, MEF- Ejecución Presupuestaria, corte al 30 de septiembre de 2025.

Elaboración: Dirección de Seguimiento a la Inversión – Presidencia de la República.



Eje Social



Eje Social

Objetivo 1

7.1. OBJETIVO 1: Mejorar el bienestar social y la calidad de vida de la población, para garantizar el goce efectivo de los derechos y la reducción de las desigualdades.

Este Objetivo busca atender las causas estructurales de la exclusión y la pobreza, fortaleciendo un modelo de desarrollo centrado en la dignidad humana, la igualdad de oportunidades, la cohesión social y la justicia redistributiva.

Con base en la gestión desarrollada por el Estado a través de la implementación de sus planes institucionales, estudios, programas y proyectos durante el tercer trimestre del 2025, a continuación, se detallan los resultados alineados a este Objetivo:

7.1.1. Gestión Presupuestaria

Para el cumplimiento de las metas de Objetivo 1, se devengó un total de USD 3.517,35 millones en el tercer trimestre del 2025, de los cuales, el 93,33% corresponde a **Gasto Permanente** con un monto devengado de USD 3.282,62 millones; y, la diferencia corresponde al **Gasto No Permanente** vinculado a estudios, programas y proyectos de inversión, de diferentes entidades, con un monto devengado de USD 234,73 millones.

Por su parte, la ejecución presupuestaria del **Gasto No Permanente** destinado al Objetivo 1, considerando el monto devengado más anticipos entregados en el periodo de USD 239,20 millones, frente al monto codificado con fuente de financiamiento de USD 412,64 millones, alcanza un nivel de ejecución del 57,97%.

Ilustración 18. Gasto Permanente y No Permanente en 2025 – Objetivo 1
(millones de dólares)



Fuente: Base de datos e-SIGEF– MEF - Ejecución Presupuestaria, corte 30 de septiembre de 2025.


Elaboración: Dirección de Seguimiento a la Planificación y Política Pública y Dirección de Seguimiento a la Inversión – Presidencia de la República.

A continuación, se detallan los montos correspondientes al **Gasto Permanente** y **Gasto No**

Permanente que fueron ejecutados, alineados al Objetivo 1, en función de los gabinetes sectoriales establecidos para la gestión institucional.

En **Gasto Permanente**, el Gabinete Sectorial de lo Social es el que más recursos ejecutó en este Objetivo, con un monto devengado de USD 3.281,59 millones, conforme la siguiente ilustración:

Ilustración 19. Gasto Permanente por Gabinete Sectorial en 2025 – Objetivo 1
(millones de dólares)



Fuente: Base de datos e-SIGEF, Ejecución Presupuestaria Consolidada – MEF corte al 30 de septiembre de 2025.

Elaboración: Dirección de Seguimiento a la Planificación y Política Pública – Presidencia de la República.

En relación al Gasto Permanente alineado al Objetivo 1 se identifica que se encuentran alineadas 12 entidades, con un presupuesto codificado de USD 6.640,08 millones y un monto devengado de USD 3.282,62 millones, lo que representa una ejecución presupuestaria del 49,44%. A continuación, se detalla la ejecución presupuestaria correspondiente al tercer trimestre por institución:

Tabla 15. Ejecución presupuestaria de las entidades alineadas al Objetivo 1

Gabinete Sectorial	Entidad	Codificado (MM USD)	Devengado (MM USD)	Ejecución (%)
Gabinete Sectorial de lo Social	Instituto Nacional de Donación y Trasplantes de Órganos Tejidos y Células	0,07	0,05	79,80%
	Ministerio de Desarrollo Humano	2.030,38	1.522,70	75,00%
	Secretaría de Gestión y Desarrollo de Pueblos y Nacionalidades	0,03	0,02	72,74%
	Agencia Nacional de Regulación Control y Vigilancia Sanitaria	10,25	7,21	70,32%
	Agencia de Aseguramiento de la Calidad de Servicios de Salud y Medicina Prepagada	3,77	2,63	69,75%
	Unidad del Registro Social	0,03	0,01	41,12%
	Instituto Nacional de Investigación en Salud Pública	0,81	0,31	38,50%
	Ministerio de Salud Pública	4.592,95	1.748,65	38,07%
Sin Gabinete	Consejo Nacional para la Igualdad de Pueblos y Nacionalidades	0,24	0,17	72,33%
	Consejo Nacional para la Igualdad Intergeneracional	1,00	0,70	69,62%
	Consejo Nacional de Salud	0,11	0,06	52,50%
	Universidad de Guayaquil	0,44	0,10	23,13%
Total		6.640,08	3.282,62	49,44%

Fuente: Base de datos e-SIGEF, Ejecución Presupuestaria Consolidada – MEF corte al 30 de septiembre de 2025. Estado de validación de planes institucionales tercer trimestre 2025, corte 30 de septiembre de 2025.


Elaboración: Dirección de Seguimiento a la Planificación y Política Pública – Presidencia de la República.

El objetivo 1 relacionado con mejorar el bienestar social y la calidad de vida de la población, incluye a las instituciones como el Ministerio de Desarrollo Humano y el Ministerio de Salud Pública que

concentran el 99,7% del codificado del objetivo, cuyos niveles de ejecución presupuestaria son 75,00% y 38,07% respectivamente.

Por su parte, en lo que respecta al **Gasto No Permanente**, las entidades que conforman el Gabinete Sectorial de Infraestructura, Energía y Medio Ambiente ejecutaron USD 121,35 millones, mientras que las entidades pertenecientes al Gabinete Sectorial de lo Social ejecutaron USD 109,45 millones y finalmente las entidades sin Gabinete ejecutaron USD 3,93 millones, alineados al Objetivo 1.

Ilustración 20. Gasto No Permanente por Gabinete Sectorial en 2025 (tercer trimestre) – Objetivo 1
(millones de dólares)

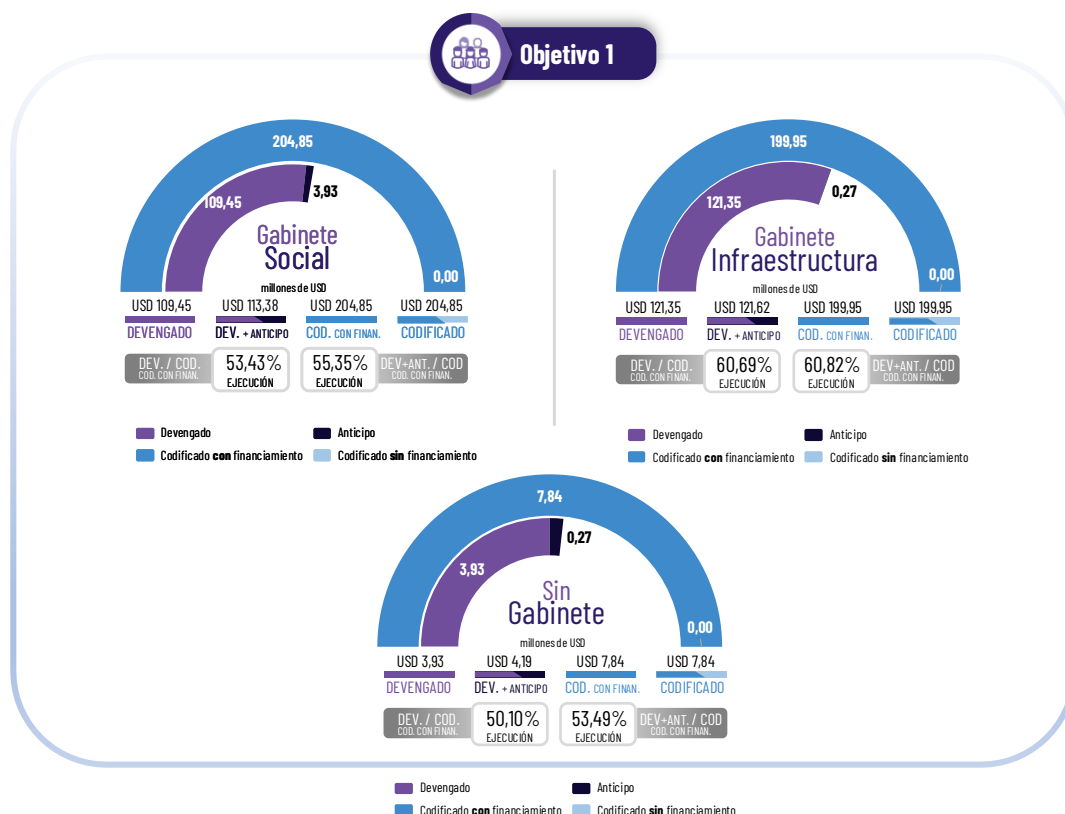

Fuente: SIPEIP, Presidencia de la República. e-SIGEF, MEF- Ejecución Presupuestaria. Corte 30 de septiembre de 2025.

Elaboración: Dirección de Seguimiento a la Inversión – Presidencia de la República.

Considerando el monto devengado más anticipos y el monto codificado con fuente entregados en el periodo, se observa que en el Objetivo 1, las entidades que conforman el Gabinete Sectorial de Infraestructura, Energía y Medio Ambiente presentan una ejecución presupuestaria de 60,82%, correspondiente a 7 proyectos de inversión, mientras que las entidades pertenecientes al Gabinete Sectorial de lo Social alcanzan una ejecución presupuestaria del 55,35%, correspondiente a 27 proyectos de inversión. Finalmente, la entidad sin Gabinete con una ejecución presupuestaria de 53,49% correspondiente a 1 proyecto de inversión.

Tabla 16. Cumplimiento presupuestario por gabinete sectorial en 2025 – Objetivo 1

Gabinete Sectorial	Número de Entidades	Número de Proyectos	% Ejecución presupuestaria	
			Devengado / Codificado	Devengado más anticipos / Codificado con fuente
Infraestructura, Energía y Medio Ambiente	2	7	60,69%	60,82%
Social	3	27	53,43%	55,35%
Sin Gabinete	1	1	50,10%	53,49%
Total	6	35		

Fuente: SIPeLP – Presidencia de la República. e-SIGEF – MEF– Ejecución Presupuestaria. Corte 30 de septiembre de 2025.




Elaboración: Dirección de Seguimiento a la Inversión – Presidencia de la República.

Para obtener información detallada sobre las entidades, se recomienda revisar el Anexo 2, que contiene la matriz resumen con datos sobre el avance presupuestario y físico.

7.1.2. Avance Físico de la Planificación Institucional

Las 8 entidades que cumplieron con el proceso de registro y la sistematización de su planificación institucional cuentan con indicadores alineados al Objetivo 1, el cual comprende un total de 20 objetivos institucionales y 48 indicadores estratégicos sujetos a seguimiento. De acuerdo con los resultados obtenidos, se identifica que el 85,42 % de los indicadores presentan un avance esperado; el 10,42 %, un avance cercano al esperado; y el 4,17 %, un avance menor al esperado, conforme al detalle que se presenta a continuación:

Tabla 17. Avance de Indicadores Institucionales – Objetivo 1

Entidad	Número Indicadores	Avance esperado 		Avance cercano al esperado 		Avance menor a lo esperado 	
		Indicadores	%	Indicadores	%	Indicadores	%
Agencia de Aseguramiento de la Calidad de los Servicios de Salud y Medicina Prepagada	12	11	91,67%	1	8,33%	0	0,00%
Agencia Nacional de Regulación, Control y Vigilancia Sanitaria	7	6	85,71%	0	0,00%	1	14,29%
Consejo Nacional de Salud	3	2	66,67%	1	33,33%	0	0,00%
Instituto Nacional de Donación y Trasplante de Órganos, Tejidos y Células	6	6	100,00%	0	0,00%	0	0,00%
Instituto Nacional de Investigación en Salud Pública Dr. Leopoldo Izquieta Pérez	3	3	100,00%	0	0,00%	0	0,00%
Ministerio de Desarrollo Humano	6	5	83,33%	1	16,67%	0	0,00%
Ministerio de Salud Pública	9	6	66,67%	2	22,22%	1	11,11%
Unidad del Registro Social	2	2	100,00%	0	0,00%	0	0,00%
Total	48	41	85,42%	5	10,42%	2	4,17%

Fuente: SIPeLP- GPR corte 30 de septiembre de 2025.

Elaboración: Dirección de Seguimiento a la Planificación y Política Pública – Presidencia de la República.

Principales Logros

Ministerio de Desarrollo Humano

- El 90,47 % de niñas y niños de 0 a 3 años y gestantes, es decir, 253.607 usuarios/as, asistieron a los Servicios de Desarrollo Infantil Integral que se brindan a través de los Centros de Desarrollo Infantil (CDI) y Creciendo con Nuestros Hijos (CNH) a nivel nacional.
- El 93% de usuarios/as, es decir 34.438 personas fueron atendidos a través de la Prestación de Servicios para personas con Discapacidad en sus tres modalidades a nivel nacional: Atención en el Hogar y la Comunidad, Centros Diurnos y Centros de Referencia y Acogida a escala nacional a través de convenios de cooperación técnico - económica y centros de administración directa del Ministerio de Desarrollo Humano.
- 14 adopciones de niñas, niños y adolescentes a nivel nacional e internacional fueron concretadas, desde julio a septiembre 2025.
- 1.703 emprendimientos fueron vinculados entre el periodo de julio a septiembre de 2025, al Sistema Nacional de Comercialización Inclusiva, que visibiliza y totaliza la participación de los emprendedores Crédito de Desarrollo Humano (CDH), usuarios de los servicios del Ministerio y actores de la Economía Popular y Solidaria (EPS), que cuentan con un emprendimiento funcional, activo y han sido articulados a espacios de comercialización.
- 18.970 Créditos de Desarrollo Humano fueron entregados por un monto total de USD 18,33 millones a nivel nacional.
- 1.462.782 usuarios habilitados al pago de las transferencias monetarias no contributivas: Bono de Desarrollo Humano, Bono de Desarrollo Humano con Componente Variable, Bono 1000 Días, Pensión Mis Mejores Años y Pensión Toda Una Vida, con un porcentaje de cumplimiento sobre la meta planteada al mes de septiembre 2025 del 104.09%.
- 47.860 usuarios/as fueron habilitados al Bono Joaquín Gallegos Lara a nivel nacional.
- 103.794 usuarios/as a los Servicios de Atención para Personas Adultas Mayores y centros gerontológicos a nivel nacional.

Instituto Nacional de Economía Popular y Solidaria

- 12.985 actores participan en el proceso de fortalecimiento organizativo, administrativo y/o técnico que alcanzan resultados satisfactorios en su evaluación de conocimientos adquiridos, correspondiente al periodo de enero a septiembre 2025.
- 185 organizaciones de la Economía Popular y Solidaria articuladas al financiamiento y/o cofinanciamiento mediante coordinación permanente con la banca pública, ejecutados en las 8 direcciones zonales del Instituto, incluido el Distrito Metropolitano de Quito, correspondiente al periodo de enero a septiembre 2025.
- USD 385,10 millones en ventas han sido alcanzados como resultado de la articulación en mercados nacionales e internacionales desde el año 2022 hasta septiembre de 2025. De este total, USD 87,30 millones corresponden al período de enero a septiembre de 2025. Estas ventas fueron realizadas por las Organizaciones de la Economía Popular y Solidaria (OEPS) y las Unidades Económicas Populares (UEP), con el apoyo del Instituto de Economía Popular y Solidaria (IEPS), a través de sus ocho direcciones zonales, incluyendo el Distrito Metropolitano de Quito.
- 125 planes de negocio solidario fueron asesorados a las OEPS/UEP, al tercer trimestre 2025, mediante una gestión coordinada con las organizaciones de la EPS, ejecutados en las 8 direcciones zonales del Instituto, incluido el Distrito Metropolitano de Quito.

Ministerio de Salud Pública

- 806.595 (hombres y mujeres en edad fértil de 20 a 49 años), en el periodo de enero a septiembre, fueron asesorados en planificación familiar en los establecimientos del primer, segundo y tercer nivel, lo que corresponde a un porcentaje de cumplimiento acumulado de 112,64%.
- 169 Entidades Operativas Desconcentradas del Ministerio de Salud Pública, fueron monitoreadas, de las cuales 128, cuentan con un stock mayor o igual al 70% de medicamentos contenidos en el Cuadro Nacional de Medicamentos Básicos a nivel nacional.
- 89.921 primeras consultas por control prenatal en el primer trimestre del embarazo, fueron realizadas mediante la atención a gestantes, sobre una proyección de 246.545 gestantes a nivel nacional.

Unidad del Registro Social

- 86 reportes generados en el trimestre, con información estadística y bases de datos elaborados y/o actualizados de información, a partir de la información del Registro Social, con el objetivo de brindar información a las autoridades, instituciones y ciudadanía en general para la toma de decisiones.
- 198 requerimientos de información de la base de datos del Registro Social fueron generados sobre requerimientos específicos de usuarios internos y externos. Información entregada oportunamente a los delegados institucionales a través de mecanismos establecidos, mediante archivos en diferentes formatos y estructuras.

Consejo Nacional de Salud

- 2 documentos normativos de los Consejos Cantonales y Provinciales de Salud, emitidos: 1) Normativa de conformación y funcionamiento y 2) Norma de elaboración del plan de salud terminada.
- 100 % de eventos de diálogo, análisis y aportes de documentos normativos en relación a la Promoción de la Salud consensuados a través de la Comisión Nacional de Medicamentos que promocionó el Cuadro Nacional de Medicamentos en los eventos realizados con el Colegio Médico de Pichincha, Hospital Carlos Andrade Marín, Hospital Quito Sur y la Facultad de Ciencias Químicas de la Universidad Central del Ecuador con un total de asistentes de 200 profesionales en salud.

Agencia de Aseguramiento de la Calidad de los Servicios de Salud y Medicina Prepagada

- 6.114 solicitudes atendidas de registro de títulos de Profesionales de la salud a nivel nacional.

Instituto Nacional de Donación y Trasplantes de Órganos Tejidos y Células

- 352 córneas provistas para trasplante, de las cuales 216 corresponden a donantes nacionales y 136 fueron importadas, beneficiando directamente a la población ecuatoriana que requiere este tipo de intervenciones.

Instituto Nacional de Investigación en Salud Pública

- 64.124 pruebas especializadas de laboratorio realizadas: 26.560 en julio, 16.939 en agosto y 20.625 en septiembre, en respuesta a las solicitudes de diagnóstico emitidas por los laboratorios de la Red Nacional de Salud, a través de los Centros de Referencia Nacional, en todo el país.
- Se alcanzó el 100% de eficiencia en la ejecución de las pruebas especializadas solicitadas por la Red Pública de Salud, cumpliendo con la capacidad operativa y de respuesta de los laboratorios de los 10 Centros de Referencia Nacional a nivel nacional.

7.1.3. Avance Físico Proyectos de Inversión


El Objetivo 1 cuenta con 35 proyectos de inversión ejecutados por 6 entidades. El monto codificado total asciende a USD 412,64 millones, con un devengado de USD 234,73 millones, lo que representa una ejecución presupuestaria del 56,89%. Considerando anticipos, la ejecución asciende al 57,97%, con un monto devengado más anticipo de USD 239,20 millones frente al codificado con fuente.

Las entidades que concentran el 78,54% del presupuesto codificado son el Ministerio de Salud Pública (124,13 millones en 16 proyectos), la Secretaría Técnica de la Circunscripción Territorial Especial Amazónica (113,91 millones en 3 proyectos) y el Ministerio de Infraestructura y Transporte (86,05 millones en 4 proyectos).

En cuanto al avance físico, este objetivo registra un Avance Físico promedio en el año del 38,70% respecto de las metas anuales programadas, con un nivel promedio de cumplimiento del 74,89% al tercer trimestre, lo que indica un “*avance menor al esperado*”.

Cabe destacar que la Unidad del Registro Social alcanzó el 100,00% de cumplimiento de sus metas físicas programadas de todos sus proyectos al tercer trimestre, en este objetivo. El Ministerio de Salud Pública registra 5 proyectos de 16 que alcanzaron el 100% de cumplimiento de sus metas físicas programadas. Por su parte, el Ministerio de Desarrollo Humano reporta 2 de 10 proyectos con dicho nivel de cumplimiento, mientras que el Secretaría Técnica de la Circunscripción Territorial Especial Amazónica (STCA) alcanzó el 100% en 2 de sus 3 proyectos.

Ilustración 21. Gasto No Permanente, avance físico promedio y avance presupuestario-Objetivo 1

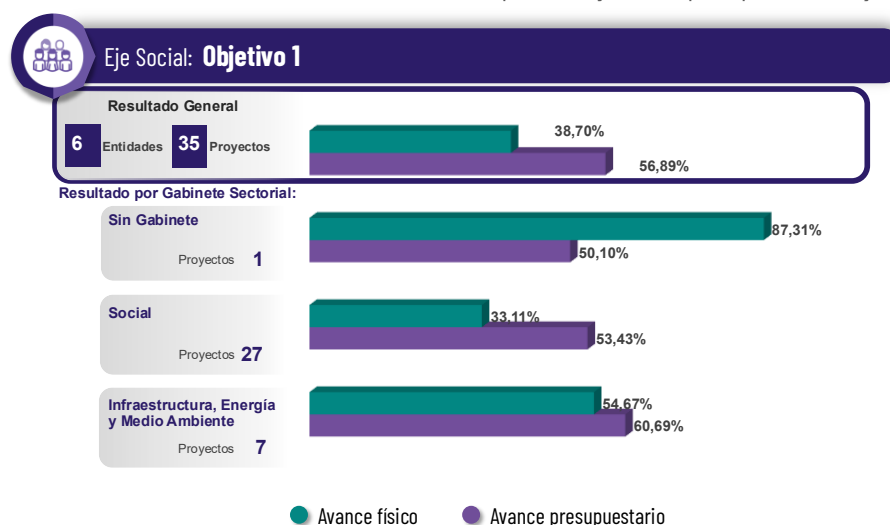

Fuente: SIPeIP, Presidencia de la República. e-SIGEF, MEF– Ejecución Presupuestaria. Corte 30 de septiembre 2025.
Elaboración: Dirección de Seguimiento a la Inversión – Presidencia de la República.

A continuación, se detalla el cumplimiento físico de los proyectos de inversión por gabinetes sectoriales relacionados con el Objetivo 1, lo que permite identificar los niveles de ejecución alcanzados por cada sector en relación con las metas físicas programadas.

Tabla 18. Cumplimiento físico por gabinete – Objetivo 1

Gabinete Sectorial	Número de Entidades	Número de Proyectos	Número de proyectos por nivel de cumplimiento			
Infraestructura, Energía y Medio Ambiente	2	7	● 2	● 0	● 3	● 2
Social	3	27	● 7	● 2	● 10	● 8
Sin Gabinete	1	1	● 1	● 0	● 0	● 0
Total	6	35	10	2	13	10

Nota: ● Avance esperado $\geq 100\%$ y $\leq 95\%$ / ● Avance cercano al esperado $> 95\%$ y $\leq 85\%$ / ● Avance menor al esperado $< 85\%$ / ● Proyecto sin programación de metas.

Fuente: SIPeIP, Presidencia de la República. e-SIGEF, MEF- Ejecución Presupuestaria. Corte 30 de septiembre de 2025.

Elaboración: Dirección de Seguimiento a la Inversión – Presidencia de la República.

Para conocer más información acerca de las entidades, por favor revisar el Anexo 2, que contiene la matriz resumen con información de avance presupuestario y físico.

A continuación, se presenta la información de causas y logros de los principales proyectos de inversión que contribuyen a este objetivo:

Causas y Logros

Ministerio de Salud Pública

El Ministerio de Salud Pública contó, dentro del Objetivo 1, con un monto codificado de USD 124,13 millones y un monto devengado de USD 62,81 millones, lo que representa una ejecución presupuestaria del 50,60%. Al considerar el devengado más anticipos en relación con el codificado con fuente, se registra una ejecución del 53,74%.

En relación con el cumplimiento físico, la entidad reportó 16 proyectos alineados al Objetivo 1, de los cuales 11 cuentan con programación de metas físicas al tercer trimestre de 2025. Entre estos, 5 alcanzaron el 100,00% de cumplimiento.

Adicionalmente, se identificó 2 proyectos alineados al mismo objetivo que, si bien no cuentan con programación ni ejecución de metas físicas al tercer trimestre de 2025, registran ejecución presupuestaria (0,08 millones) durante el período analizado.

Tabla 19. Avance Físico de Proyectos de Inversión al Tercer Trimestre Ministerio de Salud Pública – Objetivo 1

Nombre del proyecto	Programación metas físicas (a)	Ejecución metas físicas (b)	Cumplimiento metas físicas c (b/a)	Codificado (MM USD) (d)	Devengado (MM USD) (e)	Ejecución presupuestaria 2025 f(e/d)	Devengado + anticipos / codificado con fuente (g)
Fortalecimiento de la calidad de infraestructura, equipamiento y sistemas conexos de comunicación del primer nivel de atención en salud	2,07%	2,78%	● 100,00%	19,98	8,01	40,08%	49,22%

Nombre del proyecto	Programación metas físicas (a)	Ejecución metas físicas (b)	Cumplimiento metas físicas c (b/a)	Codificado (MM USD) (d)	Devengado (MM USD) (e)	Ejecución presupuestaria 2025 f(e/d)	Devengado + anticipos / codificado con fuente (g)
Apoyo a la Transformación Digital y Fortalecimiento de los Servicios Integrales de Salud	10,00%	10,00%	● 100,00%	3,36	2,66	79,35%	79,35%
Desarrollo de la estrategia para el abordaje integral del fenómeno socio económico de las drogas y fortalecimiento de la salud mental	2,28%	2,28%	● 100,00%	4,26	2,25	52,73%	52,73%
Reducción de las enfermedades crónico-transmisibles de mayor impacto en el Ecuador: VIH/Sida, ITS, Tuberculosis y Hepatitis Viral B y C	2,77%	2,77%	● 100,00%	9,14	3,60	39,41%	39,41%
Fortalecimiento de la salud intercultural en el Ecuador	9,53%	9,53%	● 100,00%	5,17	2,64	51,08%	51,08%
Eliminación de la malaria en Ecuador y prevención del restablecimiento	12,35%	11,51%	● 93,20%	1,82	0,47	25,84%	25,84%
Fortalecimiento de la atención integral, detección, prevención, rehabilitación y habilitación de personas con discapacidades, a nivel nacional	9,83%	8,78%	● 89,32%	11,39	4,89	42,92%	42,92%
Reingeniería de la infraestructura y equipamiento hospitalario para los servicios de salud del segundo y tercer nivel de atención	45,93%	36,14%	● 78,68%	27,18	17,82	65,57%	73,20%
Proyecto para el abordaje integral de la salud sexual y salud reproductiva en adolescentes	10,73%	7,02%	● 65,42%	3,12	0,75	24,07%	24,07%
Ecuador Libre de Desnutrición Infantil	23,07%	7,63%	● 33,07%	13,87	6,35	45,77%	45,77%
Fortalecimiento a la atención integral en salud en el primer nivel de atención como apoyo a la estrategia Ecuador Crece Sin Desnutrición	6,67%	1,67%	● 25,04%	20,23	13,29	65,70%	65,70%

Nombre del proyecto	Programación metas físicas (a)	Ejecución metas físicas (b)	Cumplimiento metas físicas c (b/a)	Codificado (MM USD) (d)	Devengado (MM USD) (e)	Ejecución presupuestaria 2025 f(e/d)	Devengado + anticipos / codificado con fuente (g)
Apoyo para el diagnóstico temprano, calificación y entrega de ayudas técnicas para personas con discapacidad en Ecuador	0,00%	0,00%	● -	0,03	0,03	100,00%	100,00%
Apoyo al fortalecimiento de los establecimientos de salud del MSP por situación de movilidad humana	0,00%	0,00%	● -	0,15	0,05	35,53%	35,53%
Fortalecimiento del sector materno infantil de la red de salud pública de la Coordinación Zonal No 6	0,00%	0,00%	● -	3,77	-	0,00%	-
Nutrición en el ciclo de vida - Desnutrición cero	0,00%	0,00%	● -	0,01	-	0,00%	-
Infraestructura física, equipamiento, mantenimiento, estudios y fiscalización en salud	0,00%	0,00%	● -	0,66	-	0,00%	-
							53,74%

Nota: ● Avance esperado $\geq 100\%$ y $\leq 95\%$ / ● Avance cercano al esperado $> 95\%$ y $\leq 85\%$ / ● Avance menor al esperado $< 85\%$ / ● Proyecto sin programación de metas.

Fuente: SIPeIP – Presidencia de la República. e-SIGEF - MEF- Ejecución Presupuestaria. Corte 30 de septiembre de 2025.

Elaboración: Dirección de Seguimiento a la Inversión – Presidencia de la República.

El Ministerio de Salud Pública reporta las siguientes acciones:

Proyecto Reingeniería de la Infraestructura y Equipamiento Hospitalario para los Servicios de Salud del Segundo y Tercer Nivel de Atención

Al tercer trimestre de 2025, el proyecto registró una inversión total de USD 15,51 millones, destinados al equipamiento de 27 establecimientos de salud pertenecientes a todas las Coordinaciones Zonales del Ministerio de Salud Pública, así como a la ejecución de obras de repotenciación en curso, orientadas a mejorar la infraestructura y capacidad operativa del sistema nacional de salud.

No obstante, se identifica como causa de la no ejecución total del presupuesto un déficit de USD 2,03 millones, correspondiente a procesos pendientes de asignación presupuestaria en los Hospitales Vicente Corral Moscoso, Monte Sinaí y General Universitario, debido principalmente a la falta de acreditación de pagos.

Fortalecimiento de la atención integral, detección, prevención, rehabilitación y habilitación de personas con discapacidades, a nivel nacional

En el tercer trimestre del 2025 se realizó la entrega de 314 ayudas técnicas de especialidad y 13.973 ayudas técnicas de movilidad.

Ecuador Libre de Desnutrición Infantil

La entidad informa que durante el período del tercer trimestre 2025, se brindó atención a 66.461 niños y 13.973 menores de dos años que acuden a los establecimientos de salud de primer nivel del Ministerio de Salud Pública (MSP). Asimismo, se registró la atención de 39.833 mujeres embarazadas en dichos establecimientos.

En cuanto a la organización comunitaria, se encuentran 12 grupos de apoyo y cuidadores de menores de dos años debidamente conformados y en funcionamiento, así como 51 grupos de trabajo comunitario a nivel parroquial, los cuales también mantienen sus actividades operativas.

Proyecto para el abordaje integral de la salud sexual y salud reproductiva en adolescentes

La entidad informa que, al 30 de septiembre de 2025, se cuenta con 5.498 profesionales de la salud certificados en atención integral amigable para adolescentes. Del total mencionado, 1.405 profesionales obtuvieron su certificación durante el tercer trimestre del presente año.

Asimismo, se han capacitado 10.078 adolescentes, quienes han adquirido los conocimientos, habilidades y actitudes necesarias para el ejercicio pleno de sus derechos sexuales y reproductivos.

Este avance evidencia el cumplimiento progresivo del indicador del proyecto desde su inicio hasta la fecha del reporte.



Eje Social

Objetivo 2

7.2. OBJETIVO 2: Potenciar las capacidades de la ciudadanía con acceso universal a una educación inclusiva de calidad, acceso a espacios de intercambio cultural y una vida activa.

Este Objetivo orienta la construcción de un entorno que permita a todas las personas, sin discriminación, desplegar sus potencialidades, fortalecer su identidad cultural y participar activamente en la vida económica, social y política del país.


Con base en la gestión desarrollada por el Estado a través de la implementación de sus planes institucionales, estudios, programas y proyectos durante el tercer trimestre del 2025, a continuación, se detallan los resultados alineados a este Objetivo:

7.2.1. Gestión Presupuestaria

Para el cumplimiento de las metas del Objetivo 2, se devengó un total de USD 2.614,07 millones en el tercer trimestre del 2025, de los cuales, el 96,90% corresponde a Gasto Permanente con un monto devengado de USD 2.533,13 millones; y, la diferencia corresponde al **Gasto No Permanente** vinculado a estudios, programas y proyectos de inversión, de diferentes entidades, con un monto devengado de USD 80,94 millones.

Por su parte, la ejecución presupuestaria del **Gasto No Permanente** destinado al Objetivo 2, considerando el monto devengado más anticipos entregados en el periodo (USD 90,32 millones), frente al monto codificado con fuente de financiamiento (USD 260,79 millones), alcanza un nivel de ejecución del 34,63%.

Ilustración 22. Gasto Permanente y No Permanente en 2025 – Objetivo 2
(millones de dólares)

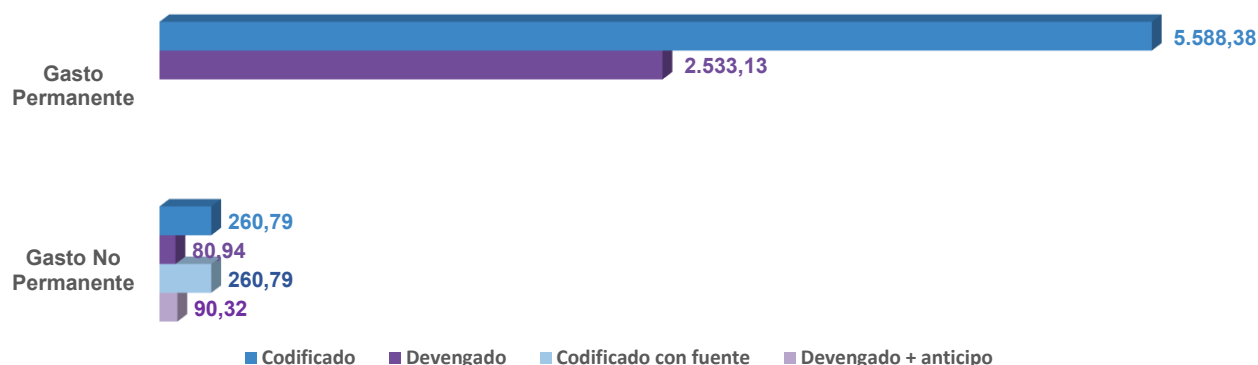


Fuente: Base de datos e-SIGEF– MEF - Ejecución Presupuestaria, corte 30 de septiembre de 2025.

Elaboración: Dirección de Seguimiento a la Planificación y Política Pública y Dirección de Seguimiento a la Inversión – Presidencia de la República.

A continuación, se detallan los montos correspondientes al **Gasto Permanente** y **Gasto No Permanente** que fueron ejecutados, alineados al Objetivo 2, en función de los gabinetes sectoriales establecidos para la gestión institucional.

En **Gasto Permanente**, el Gabinete Sectorial de lo Social es el que más recursos ejecutó en este Objetivo, con un monto devengado de USD 2.070,59 millones, conforme la siguiente ilustración:

Ilustración 23. Gasto Permanente por Gabinete Sectorial en 2025 – Objetivo 2
(millones de dólares)



Fuente: Base de datos e-SIGEF, Ejecución Presupuestaria Consolidada – MEF corte al 30 de septiembre de 2025.

Elaboración: Dirección de Seguimiento a la Planificación y Política Pública – Presidencia de la República.

En relación al **Gasto Permanente** alineado al Objetivo 2, se identifica que se encuentran alineadas 38 entidades, con un presupuesto codificado de USD 5.588,38 millones y un monto devengado de USD 2.533,13 millones, lo que representa una ejecución presupuestaria del 45,33%. A continuación, se detalla la ejecución presupuestaria correspondiente al tercer trimestre por institución:

Tabla 20. Ejecución presupuestaria de las entidades alineadas al Objetivo 2

Gabinete Sectorial	Entidad	Codificado (MM USD)	Devengado (MM USD)	Ejecución (%)
Gabinete Sectorial de lo Social	Instituto Nacional de Investigación En Salud Publica Inspi Dr Leopoldo Izquieta Pérez	0,07	0,05	76,20%
	Servicio Nacional de Derechos Intelectuales	3,16	2,35	74,61%
	Casa de la Cultura Ecuatoriana Benjamín Carrión	3,39	2,42	71,39%
	Instituto Nacional de Evaluación Educativa	1,32	0,93	70,78%
	Instituto Nacional de Patrimonio Cultural	2,62	1,85	70,46%
	Secretaría de Educación Intercultural Bilingüe y la Etnoeducación	1,03	0,53	51,37%
	Ministerio de Educación, Deporte y Cultura	4.842,87	2.062,45	42,59%
Sin Gabinete	Universidad laica Eloy Alfaro de Manabí	52,37	37,04	70,73%
	Universidad Técnica del Norte	23,79	16,79	70,57%
	Universidad Técnica de Quevedo	21,82	15,26	69,96%
	Centro Interamericano de Artesanías y Artes Populares	0,05	0,04	69,49%
	Escuela Politécnica Nacional	42,55	29,10	68,39%
	Consejo de Educación Superior	2,34	1,60	68,22%
	Escuela Superior Politécnica del Chimborazo	47,27	31,74	67,16%
	Universidad de Guayaquil	85,00	56,51	66,49%
	Universidad Técnica de Machala	20,28	13,48	66,46%
	Universidad Estatal del Sur de Manabí	16,27	10,76	66,15%

Gabinete Sectorial	Entidad	Codificado (MM USD)	Devengado (MM USD)	Ejecución (%)
	Universidad Intercultural de las Nacionalidades y Pueblos Indígenas Amawtay Wasi	1,63	1,07	65,87%
	Universidad de Cuenca	58,00	37,48	64,62%
	Universidad de las Fuerzas Armadas	48,09	31,02	64,51%
	Universidad Nacional de Chimborazo	26,11	16,78	64,25%
	Casa de Montalvo	0,08	0,05	63,59%
	Universidad Estatal Península de Santa Elena	15,52	9,78	63,01%
	Universidad Técnica de Manabí	37,75	23,70	62,78%
	Consejo de Aseguramiento de la Calidad de la Educación Superior	2,47	1,55	62,59%
	Universidad Técnica de Babahoyo	17,93	10,76	60,03%
	Escuela Superior Politécnica del Litoral	5,91	3,52	59,57%
	Universidad Nacional de Educación	13,40	7,91	59,05%
	Universidad Nacional de Loja	30,77	18,14	58,94%
	Universidad de las Artes	9,30	5,46	58,64%
	Universidad Estatal de Milagro	31,32	18,05	57,63%
	Universidad Técnica de Ambato	45,93	25,03	54,50%
	Universidad Estatal Amazónica	14,43	7,80	54,06%
	Universidad Regional Amazónica Ikiam	8,07	4,36	54,02%
	Universidad Politécnica Estatal del Carchi	10,77	5,65	52,49%
	Instituto de Altos Estudios Nacionales	3,50	1,83	52,30%
	Universidad Técnica de Cotopaxi	24,90	12,44	49,94%
	Escuela Superior Politécnica Agropecuaria de Manabí Manuel Félix López	16,30	7,83	48,05%
Total		5.588,38	2.533,13	45,33%


Fuente: Base de datos e-SIGEF, Ejecución Presupuestaria Consolidada – MEF corte al 30 de septiembre de 2025. Estado de validación de planes institucionales tercer trimestre 2025, corte 30 de septiembre de 2025.

Elaboración: Dirección de Seguimiento a la Planificación y Política Pública – Presidencia de la República.

El objetivo 2 relacionado con potenciar las capacidades de la ciudadanía con acceso universal a una educación inclusiva de calidad, incluye al Ministerio de Educación, Deporte y Cultura que concentra el 86,7% del codificado del objetivo, cuyo nivel de ejecución presupuestaria es 42,59%.

Por su parte, en lo que respecta al **Gasto No Permanente**, las entidades que conforman el Gabinete Sectorial de lo Social ejecutaron USD 40,00 millones, mientras que las entidades sin Gabinete ejecutaron USD 40,95 millones, alineados al Objetivo 2.

Ilustración 24. Gasto No Permanente por Gabinete Sectorial en 2025 (tercer trimestre) – Objetivo 2
(millones de dólares)

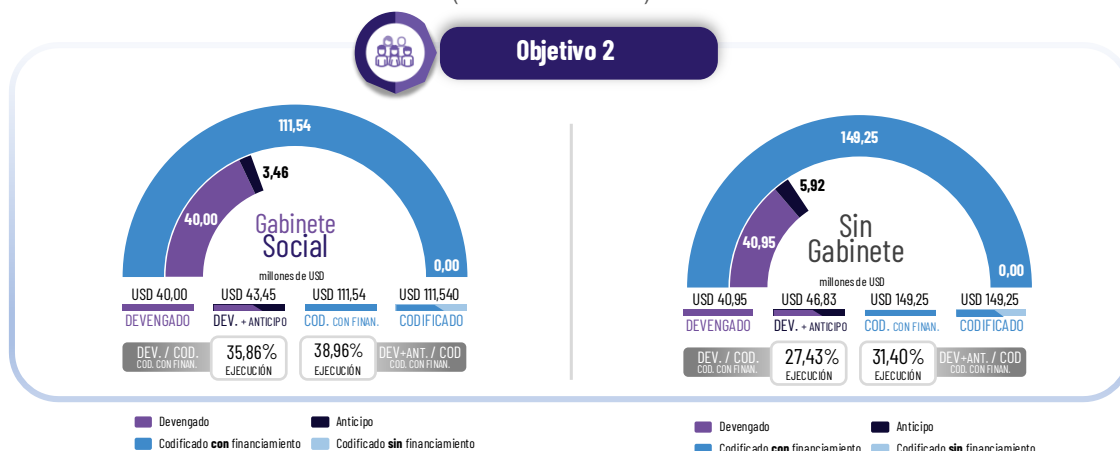

Fuente: SIPeIP, Presidencia de la República. e-SIGEF, MEF- Ejecución Presupuestaria. Corte 30 de septiembre de 2025.
Elaboración: Dirección de Seguimiento a la Inversión – Presidencia de la República.

Considerando el monto devengado más anticipos y el monto codificado con fuente entregados en el periodo, se observa que en el Objetivo 2, las entidades que conforman el Gabinete Sectorial de lo Social presentan una ejecución presupuestaria de 38,96%, correspondiente a 30 proyectos de inversión, mientras que las entidades que no pertenecen a ningún Gabinete Sectorial alcanzan una ejecución presupuestaria del 31,40%, correspondiente a 213 proyectos de inversión.

Tabla 21. Cumplimiento presupuestario por gabinete sectorial en 2025 – Objetivo 2

Gabinete Sectorial	Número de Entidades	Número de Proyectos	% Ejecución presupuestaria	
			Devengado / Codificado	Devengado más anticipos / Codificado con fuente
Social	3	30	35,86%	38,96%
Sin Gabinete	29	213	27,43%	31,40%
Total	32	243		

Fuente: SIPeIP – Presidencia de la República. e-SIGEF – MEF- Ejecución Presupuestaria. Corte 30 de septiembre de 2025.
Elaboración: Dirección de Seguimiento a la Inversión – Presidencia de la República.

Para obtener información detallada sobre las entidades, se recomienda revisar el Anexo 2, que contiene la matriz resumen con datos sobre el avance presupuestario y físico.

7.2.2. Avance Físico de la Planificación Institucional

Las 4 entidades que cumplieron con el proceso de registro y la sistematización de su planificación institucional cuentan con indicadores alineados al Objetivo 2, el cual comprende un total de 6 objetivos institucionales y 9 indicadores estratégicos sujetos a seguimiento. De acuerdo con los resultados obtenidos, se identifica que el 100,00 % de los indicadores presentan un avance esperado.

Tabla 22. Avance de Indicadores Institucionales – Objetivo 2

Entidad	Número Indicadores	Avance esperado 		Avance cercano al esperado 		Avance menor a lo esperado 	
		Indicadores	%	Indicadores	%	Indicadores	%
Consejo de Desarrollo y Promoción de la Información y Comunicación	2	2	100,00%	0	0,00%	0	0,00%
Instituto Nacional de Investigación en Salud Pública Dr. Leopoldo Izquieta Pérez	1	1	100,00%	0	0,00%	0	0,00%
Instituto Nacional de Biodiversidad	1	1	100,00%	0	0,00%	0	0,00%
Universidad Técnica De Ambato	5	5	100,00%	0	0,00%	0	0,00%
Total	9	9	100,00%	0	0,00%	0	0,00%

Fuente: SIPeIP- GPR corte 30 de septiembre de 2025.

Elaboración: Dirección de Seguimiento a la Planificación y Política Pública – Presidencia de la República.

Principales Logros

Instituto Nacional de Biodiversidad

- 684 visitantes en las salas de exhibición permanente, con un nivel de aprobación del 88,5% en las encuestas de satisfacción aplicadas sobre la atención brindada a los visitantes, en las salas de exhibición del Instituto Nacional de Biodiversidad.

7.2.3. Avance Físico Proyectos de Inversión

El Objetivo 2 cuenta con 243 proyectos de inversión ejecutados por 32 entidades. El monto codificado total asciende a USD 260,79 millones, con un devengado de USD 80,94 millones, lo que representa una ejecución presupuestaria del 31,04%. Considerando anticipos, la ejecución asciende al 34,63%, con un monto devengado más anticipo de USD 90,32 millones frente al codificado con fuente.


Las entidades que concentran el 80,77% del presupuesto codificado son el Ministerio de Educación, Deporte y Cultura (USD. 108,41 millones en 27 proyectos) y el siguiente grupo de universidades: Escuela Superior Politécnica del Chimborazo, Universidad Estatal Amazónica, Universidad de las Fuerzas Armadas, Universidad Técnica Estatal de Quevedo, Universidad Técnica de Machala, Universidad Nacional de Chimborazo, Universidad Nacional de Loja, Universidad Laica Eloy Alfaro de Manabí y la Universidad Técnica de Cotopaxi.

En cuanto al avance físico, este objetivo registra un Avance Físico promedio en el año del 43,13% respecto de las metas anuales programadas, con un nivel promedio de cumplimiento del 71,23% al tercer trimestre, lo que indica un “*avance menor al esperado*”.

Destacan las entidades como la Universidad Nacional de Chimborazo, Universidad Técnica de Cotopaxi, Universidad Intercultural de las Nacionalidades y Pueblos Indígenas Amawtay Wasi, Escuela Politécnica Nacional, Instituto Nacional de Evaluación Educativa y Universidad Estatal de Milagro, quienes registran la totalidad de sus proyectos que alcanzaron el 100,00% de cumplimiento de sus metas físicas programadas en este objetivo.

Así mismo, el Ministerio de Educación, Deporte y Cultura, registra 4 proyectos de 27 que alcanzaron el 100,00% de cumplimiento de sus metas físicas programadas.

Ilustración 25. Gasto No Permanente, avance físico promedio y avance presupuestario- Objetivo 2

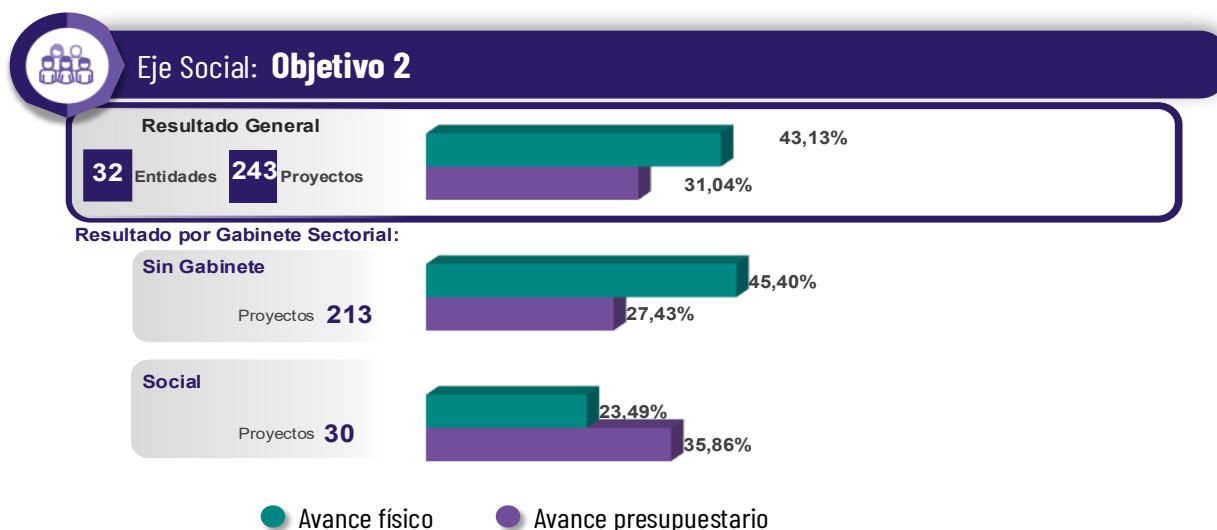

Fuente: SIPeIP, Presidencia de la República. e-SIGEF, MEF- Ejecución Presupuestaria. Corte 30 de septiembre 2025.

Elaboración: Dirección de Seguimiento a la Inversión – Presidencia de la República.

A continuación, se detalla el cumplimiento físico de los proyectos de inversión por gabinetes sectoriales relacionados con el Objetivo 2, lo que permite identificar los niveles de ejecución alcanzados por cada sector en relación con las metas físicas programadas.

Tabla 23. Cumplimiento físico por gabinete – Objetivo 2

Gabinete Sectorial	Número de Entidades	Número de Proyectos	Número de proyectos por nivel de cumplimiento			
Social	3	30	● 5	● 0	● 8	● 17
Sin Gabinete	29	213	● 84	● 5	● 66	● 58
Total	32	243	89	5	74	75

Nota: ● Avance esperado $\geq 100\%$ y $\leq 95\%$ / ● Avance cercano al esperado $> 95\%$ y $\leq 85\%$ / ● Avance menor al esperado $< 85\%$ / ● Proyecto sin programación de metas.

Fuente: SIPeIP – Presidencia de la República. e-SIGEF - MEF- Ejecución Presupuestaria. Corte 30 de septiembre de 2025.

Elaboración: Dirección de Seguimiento a la Inversión – Presidencia de la República.

Para conocer más información acerca de las entidades, por favor revisar el Anexo 2, que contiene la matriz resumen con información de avance presupuestario y físico.

A continuación, se presenta la información de ejecución de los principales proyectos de inversión que contribuyen a este objetivo:

Causas y Logros

Ministerio de Educación, Deporte y Cultura

El Ministerio de Educación, Deporte y Cultura registró, en el marco del Objetivo 2, un monto codificado de inversión de USD 108,41 millones y un devengado de USD 38,24 millones, lo que representa una ejecución presupuestaria del 35,27%. Al considerar el devengado más anticipos en relación con el codificado con fuente, la ejecución alcanza el 38,32%.

En relación con el cumplimiento físico, la entidad reportó 27 proyectos alineados al Objetivo 2, de los cuales 12 cuentan con programación de metas físicas al tercer trimestre de 2025. Entre estos, 4 alcanzaron el 100,00% de cumplimiento, mientras que 2 no presenta avance físico.

Adicionalmente, se identificó 12 proyectos alineados al mismo objetivo que, si bien no cuentan con programación ni ejecución de metas físicas al tercer trimestre de 2025, registran ejecución presupuestaria (USD 12,04 millones) durante el período analizado.

Tabla 24. Avance Físico de Proyectos de Inversión al Tercer Trimestre Ministerio de Educación, Deporte y Cultura – Objetivo 2

Nombre del proyecto	Programación metas físicas (a)	Ejecución metas físicas (b)	Cumplimiento metas físicas c(b/a)	Codificado (MM USD) (d)	Devengado (MM USD) (e)	Ejecución presupuestaria 2025 f (d/e)	Devengado + anticipos /codificado con fuente (g)
Reconversión de la educación técnica y tecnológica superior pública del Ecuador	9,88%	9,88%	● 100,00%	6,99	0,56	8,05%	8,05%
Proyecto de Oportunidades para el Desarrollo y Fortalecimiento del Talento Humano	1,98%	3,76%	● 100,00%	13,84	5,12	37,01%	37,01%
Reducción de la brecha digital en el Sistema Nacional de Educación	14,24%	14,24%	● 100,00%	8,42	5,82	69,14%	69,14%
Fortalecimiento de capacidades de procesos artísticos y culturales sostenibles en territorio - Teatro del Barrio	10,39%	15,30%	● 100,00%	0,97	0,65	67,20%	67,20%
Proyecto de Inversión para el Desarrollo de Actividades de Ciencia, Tecnología e Innovación	36,67%	30,00%	● 81,81%	1,60	1,55	96,88%	96,88%
Formar para transformar	19,44%	11,67%	● 60,03%	3,46	0,34	9,93%	9,93%
Encuentro activo del deporte para el desarrollo 2022-2025	31,25%	14,58%	● 46,66%	4,07	2,93	72,03%	72,03%
Fortalecimiento de los repositorios de memoria social del Ministerio de Cultura y Patrimonio	70,00%	25,00%	● 35,71%	0,75	0,27	35,65%	41,54%
Inclusión universal para el aprendizaje	44,00%	15,00%	● 34,09%	0,61	0,17	27,84%	27,84%
Implementación del Sistema Integral de Información Cultural SIIC	8,84%	1,78%	● 20,14%	0,05	0,03	56,99%	56,99%
Plan Alto Rendimiento Los Angeles	6,85%	0,00%	● 0,00%	12,80	8,75	68,34%	68,34%
Nuevo modelo arquitectónico de infraestructura educativa	4,56%	0,00%	● 0,00%	0,22	-	0,00%	-
Sistema Nacional de Nivelación y Admisión	0,00%	0,00%	● -	0,01	0,01	76,81%	76,81%
Fortalecimiento del conocimiento y talento humano	0,00%	0,00%	● -	3,89	1,25	32,10%	32,10%
Fortalecimiento de la educación superior universitaria, técnica y tecnológica en la	0,00%	0,00%	● -	1,80	0,31	17,34%	17,34%

Nombre del proyecto	Programación metas físicas (a)	Ejecución metas físicas (b)	Cumplimiento metas físicas c(b/a)	Codificado (MM USD) (d)	Devengado (MM USD) (e)	Ejecución presupuestaria 2025 f (d/e)	Devengado + anticipos /codificado con fuente (g)
Región Amazónica con criterios de inclusión, calidad y pertinencia							
Sistema Ecuatoriano de Acceso a la Educación Superior	0,00%	0,00%	● -	0,03	0,02	92,43%	92,43%
Proyecto Ciudad del Conocimiento	0,00%	0,00%	● -	0,24	0,17	69,64%	69,64%
Reestructuración integral de infraestructura educativa	0,00%	0,00%	● -	30,03	5,08	16,90%	26,04%
Reforma integral al bachillerato	0,00%	0,00%	● -	3,45	0,11	3,24%	18,34%
Red de ambientes de lectura en instituciones educativas rurales	0,00%	0,00%	● -	0,03	0,02	57,65%	57,65%
Culminación y construcción de infraestructura educativa - Fase I	0,00%	0,00%	● -	7,72	4,53	58,75%	58,75%
Infraestructura Educativa recuperada	0,00%	0,00%	● -	0,08	0,01	8,57%	8,57%
Adecuaciones emergentes en instituciones educativas	0,00%	0,00%	● -	0,14	0,09	65,12%	65,12%
Transformación educativa de Educación Inicial	0,00%	0,00%	● -	0,00	-	0,00%	-
Proyecto emergente de las Unidades Educativas del Milenio y establecimientos anexos	0,00%	0,00%	● -	2,56	-	0,00%	-
Nueva infraestructura educativa	0,00%	0,00%	● -	1,70	0,44	26,02%	26,02%
Construcción del edificio del Museo Nacional del Ecuador	0,00%	0,00%	● -	2,95	-	0,00%	-
							38,32%

Nota: ● Avance esperado $\geq 100\%$ y $\leq 95\%$ / ● Avance cercano al esperado $> 95\%$ y $\leq 85\%$ / ● Avance menor al esperado $< 85\%$ / ● Proyecto sin programación de metas.

Fuente: SIPeIP – Presidencia de la República. e-SIGEF - MEF- Ejecución Presupuestaria. Corte 30 de septiembre de 2025.

Elaboración: Dirección de Seguimiento a la Inversión – Presidencia de la República.

El Ministerio de Educación, Deporte y Cultura reporta las siguientes acciones:

Proyecto de Inversión para el Desarrollo de Actividades de Ciencia, Tecnología e Innovación

La entidad informó que brindó acompañamiento en actividades orientadas al fortalecimiento de la divulgación científica, mediante la ejecución del concurso de monólogos científicos “Solo de Ciencia Ecuador”.

Asimismo, se llevó a cabo la acreditación de actores del Sistema Nacional de Ciencia, Tecnología, Innovación y Saberes Ancestrales, en las categorías de espacios de innovación y espacios de

transferencia de tecnología, logrando la acreditación de una incubadora, una oficina de transferencia de tecnología y un espacio de trabajo colaborativo (coworking).

Red de ambientes de lectura en instituciones educativas rurales

La entidad informó que se efectuó el seguimiento a las 65 instituciones educativas pertenecientes a la Coordinación Zonal de Educación 1, las cuales cuentan con ambientes de lectura en funcionamiento.

Asimismo, se inició el desarrollo del visualizador de la Red de Ambientes de Lectura, herramienta destinada a fortalecer el monitoreo y la gestión de dichos espacios.

De igual manera, se dio inicio a la fase preparatoria para la contratación prevista en 2026, correspondiente a consultorías para la selección del fondo bibliográfico y la dotación de ambientes de lectura, proceso sustentado en el diagnóstico del uso de los ambientes de lectura actualmente implementados.

Inclusión universal para el aprendizaje

La entidad informó que 110 instituciones educativas especializadas y centros de recursos psicopedagógicos han recibido la socialización correspondiente para la implementación de los ocho insumos técnicos destinados a la atención de estudiantes con discapacidad.

En relación con el Componente 1, Indicador 1.5, referente a la consultoría para la actualización del Modelo Pedagógico Bilingüe Bicultural para Personas Sordas y la elaboración de la guía metodológica para su implementación a nivel nacional en lengua de señas, se identificó un nudo crítico, ya que la ejecución de esta actividad se encuentra a la espera de la actualización del currículo nacional, por lo cual se ha reprogramado su realización para el 2026.



Eje Social

Objetivo 3

7.3. OBJETIVO 3: Garantizar un Estado soberano, seguro, y justo promoviendo la convivencia pacífica y el respeto a los derechos humanos.

Este Objetivo abarca la seguridad ciudadana, la cual requiere un enfoque integral que contemple tanto la prevención como la reacción frente a fenómenos como la violencia, los delitos y el crimen organizado. La lucha contra la inseguridad, el tráfico ilegal de armas y drogas, y el terrorismo en todas sus formas, constituye una prioridad para garantizar un entorno en el que los ciudadanos puedan vivir sin temor.


Con base en la gestión desarrollada por el Estado a través de la implementación de sus planes institucionales, estudios, programas y proyectos durante el tercer trimestre del 2025, a continuación, se detallan los resultados alineados a este Objetivo:

7.3.1. Gestión Presupuestaria

Para el cumplimiento de las metas del Objetivo 3, se devengó un total de USD 2.752,38 millones en el tercer trimestre del 2025, de los cuales, el 94,52% corresponde a **Gasto Permanente** con un monto devengado de USD 2.601,47 millones; y, la diferencia corresponde al **Gasto No Permanente** vinculado a estudios, programas y proyectos de inversión, de diferentes entidades, con un monto devengado de USD 150,91 millones.

Por su parte, la ejecución presupuestaria del **Gasto No Permanente** destinado al Objetivo 3, considerando el monto devengado más anticipos entregados en el periodo (USD 160,21 millones), frente al monto codificado con fuente de financiamiento (USD 427,09 millones), alcanza un nivel de ejecución del 37,51%.

Ilustración 26. Gasto Permanente y No Permanente en 2025 – Objetivo 3 (millones de dólares)

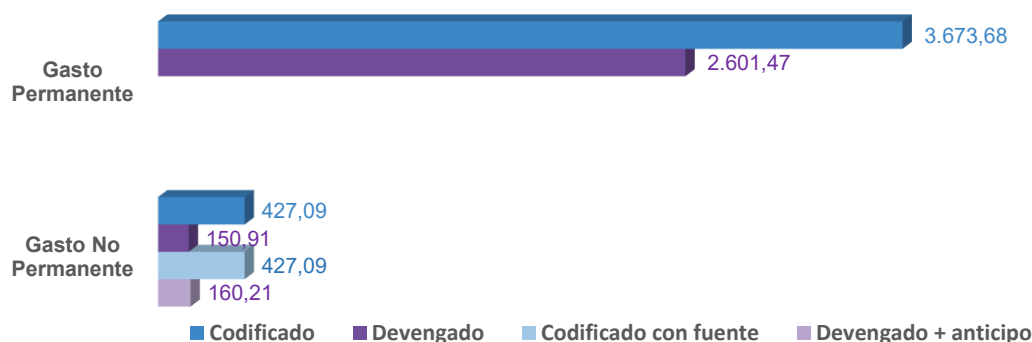

Fuente: Base de datos e-SIGEF, Ejecución Presupuestaria Consolidada – MEF corte al 30 de septiembre de 2025.

Elaboración: Dirección de Seguimiento a la Planificación y Política Pública y Dirección de Seguimiento a la Inversión – Presidencia de la República.

A continuación, se detallan los montos correspondientes al **Gasto Permanente** y **Gasto No Permanente** que fueron ejecutados, alineados al Objetivo 3, en función de los gabinetes sectoriales establecidos para la gestión institucional.

En **Gasto Permanente**, el Gabinete Sectorial de Seguridad es el que más recursos ejecutó en este Objetivo con un monto devengado de USD 2.270,49 millones, conforme la siguiente ilustración:

Ilustración 27. Gasto Permanente por Gabinete Sectorial en 2025 – Objetivo 3
(millones de dólares)



Fuente: Base de datos e-SIGEF, Ejecución Presupuestaria Consolidada – MEF corte al 30 de septiembre de 2025.

Elaboración: Dirección de Seguimiento a la Planificación y Política Pública – Presidencia de la República.

En relación al **Gasto Permanente** alineado al Objetivo 3, se identifica que se encuentran alineadas 13 entidades, con un presupuesto codificado de USD 3.673,68 millones y un monto devengado de USD 2.601,47 millones, lo que representa una ejecución presupuestaria del 70,81%. A continuación, se detalla la ejecución presupuestaria correspondiente al tercer trimestre por institución:

Tabla 25. Ejecución presupuestaria de las entidades alineadas al Objetivo 3

Gabinete Sectorial	Entidad	Codificado	Devengado	Ejecución (%)
		(MM USD)	(MM USD)	
Gabinete Sectorial de Seguridad	Instituto Geográfico Militar	1.503,20	1.105,43	73,54%
	Ministerio de Defensa Nacional	1.515,43	1.055,85	69,67%
	Ministerio de Gobierno	38,67	26,28	67,97%
	Ministerio del Interior	101,93	64,83	63,60%
	Policía Nacional	40,08	16,97	42,35%
	Servicio Nacional de Atención Integral a Personas Adultas Privadas de la Libertad y a Adolescentes Infractores	8,18	1,13	13,82%
Sin Gabinete	Casa Militar Presidencial	11,44	9,25	80,89%
	Unidad de Análisis Financiero y Económico	1,84	1,36	73,72%
	Consejo de la Judicatura	308,94	218,84	70,84%
	Fiscalía General del Estado	115,01	81,12	70,53%
	Defensoría Pública	27,93	19,69	70,50%
	Consejo Nacional para la Igualdad de Género	0,25	0,18	69,32%
	Consejo Nacional para la Igualdad de Discapacidades	0,78	0,54	69,26%
Total		3.673,68	2.601,47	70,81%

Fuente: Base de datos e-SIGEF, Ejecución Presupuestaria Consolidada – MEF corte al 30 de septiembre de 2025. Estado de validación de planes institucionales tercer trimestre 2025, corte 30 de septiembre de 2025.


Elaboración: Dirección de Seguimiento a la Planificación y Política Pública – Presidencia de la República.

El objetivo 3 relacionado con garantizar un Estado soberano, seguro, y justo, incluye a las

instituciones Instituto Geográfico Militar y Ministerio de Defensa Nacional, las cuales concentran el 82,2% del presupuesto codificado de este objetivo, cuyos niveles de ejecución presupuestaria son 73,54% y 69,67%, respectivamente.

Por su parte, en lo que respecta al **Gasto No Permanente**, las entidades que conforman el Gabinete Sectorial de Seguridad ejecutaron USD 148,18 millones, mientras que las entidades pertenecientes al Gabinete Sectorial de lo Social ejecutaron USD 0,12 millones y finalmente las entidades sin Gabinete ejecutaron USD 2,61 millones, alineados al Objetivo 3.

Ilustración 28. Gasto No Permanente por Gabinete Sectorial en 2025 (tercer trimestre) – Objetivo 3 (millones de dólares)

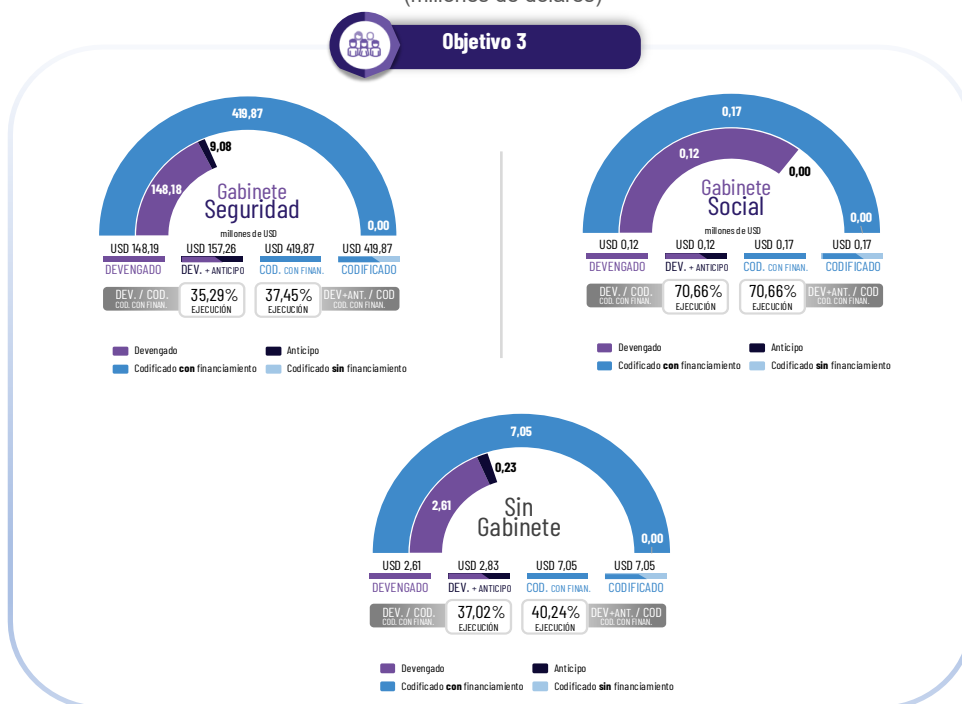

Fuente: SIPeIP, Presidencia de la República. e-SIGEF, MEF- Ejecución Presupuestaria. Corte 30 de septiembre de 2025.

Elaboración: Dirección de Seguimiento a la Inversión – Presidencia de la República.

Considerando el monto devengado más anticipos y el monto codificado con fuente entregados en el periodo, se observa que en el Objetivo 3, la entidad que conforma el Gabinete Sectorial de lo Social presenta una ejecución presupuestaria de 70,66%, correspondiente a 1 proyecto de inversión. Le siguen las entidades sin Gabinete Sectorial con una ejecución presupuestaria de 40,24% correspondiente a 7 proyectos de inversión. Finalmente, las entidades del Gabinete Sectorial de Seguridad con una ejecución presupuestaria del 37,45% correspondiente a 26 proyectos de inversión.

Tabla 26. Cumplimiento presupuestario por gabinete sectorial en 2025 – Objetivo 3

Gabinete Sectorial	Número de Entidades	Número de Proyectos	% Ejecución presupuestaria	
			Devengado / Codificado	Devengado más anticipos / Codificado con fuente
Social	1	1	70,66%	70,66%
Sin Gabinete	3	7	37,02%	40,24%
Seguridad	7	26	35,29%	37,45%
Total	11	34		

Fuente: SIPeIP – Presidencia de la República. e-SIGEF – MEF– Ejecución Presupuestaria. Corte 30 de septiembre de 2025.

Elaboración: Dirección de Seguimiento a la Inversión – Presidencia de la República.

Para obtener información detallada sobre las entidades, se recomienda revisar el Anexo 2, que contiene la matriz resumen con datos sobre el avance presupuestario y físico.

7.3.2. Avance Físico de la Planificación Institucional

Las 3 entidades que cumplieron con el proceso de registro y la sistematización de su planificación institucional cuentan con indicadores alineados al Objetivo 3, el cual comprende un total de 6 objetivos institucionales y 15 indicadores estratégicos sujetos a seguimiento. De acuerdo con los resultados obtenidos, se identifica que el 60,00 % de los indicadores presentan un avance esperado; el 6,67 %, un avance cercano al esperado; y el 33,33 %, un avance menor al esperado, conforme al detalle que se presenta a continuación:

Tabla 27. Avance de Indicadores Institucionales – Objetivo 3

Entidad	Número Indicadores	Avance esperado		Avance cercano al esperado		Avance menor a lo esperado	
		Indicadores	%	Indicadores	%	Indicadores	%
Servicio Integrado de Seguridad ECU 911	3	2	66,67%	1	33,33%	0	0,00%
Instituto Geográfico Militar	4	4	100,00%	0	0,00%	0	0,00%
Policía Nacional	8	3	37,50%	0	0,00%	5	62,50%
Total	15	9	60,00%	1	6,67%	5	33,33%

Fuente: SIPeIP- GPR corte 30 de septiembre de 2025.

Elaboración: Dirección de Seguimiento a la Planificación y Política Pública – Presidencia de la República.

Principales Logros

Servicio Integrado de Seguridad ECU 911

- 123 segundos de tiempo promedio de atención general a emergencias, permitiendo la coordinación de 810.782 alertas a nivel nacional.
- 4 propuestas de coordinación interinstitucional ejecutadas en el ámbito nacional e internacional, orientadas a fortalecer la operatividad del servicio.

Policía Nacional

- 3.814 denuncias de robo a domicilios registradas en el período de enero a septiembre de 2025, evidenciando un avance conforme a lo esperado, gracias a la implementación de acciones operativas focalizadas, el incremento de puntos de control estratégicos en áreas críticas y ejecución de medidas de prevención situacional y ambiental desarrolladas desde los GAD en el territorio ecuatoriano a nivel nacional.
- 2.501 denuncias de robo a unidades económicas registradas en el período de enero a septiembre de 2025, logrando un resultado satisfactorio al mantenerse por debajo de la meta programada de 3.174 denuncias, a través de acciones operativas de intervención en áreas con problemas crónicos, áreas crimífugas y áreas de predicción delictiva a nivel nacional.
- 4.957 denuncias de robo de bienes accesorios y autopartes de vehículos registradas en el tercer trimestre, presentando un avance esperado, con el aporte de acciones operativas con un enfoque integral, acciones preventivas y comunitarias ejecutadas en coordinación con las autoridades públicas, a nivel nacional.

Instituto Geográfico Militar

- 60.368 beneficiarios asistieron a los servicios del Centro Cultural entre enero y septiembre de 2025, superando la meta del periodo, mediante recorridos guiados, eventos, capacitaciones, funciones astronómicas presenciales y virtuales, y talleres educativos en la provincia de Pichincha.
- 7.609,32 km² de superficie fueron cubiertos con cartografía actualizada a escala 1:25.000 en sectores de las provincias de Guayas, Tungurahua, Pichincha, Imbabura y Loja.
- 15 productos geográficos fueron elaborados: 11 mapas temáticos a escala nacional y 4 revisiones técnicas de bases de datos empresa HERE y bases a 50k de cartografía temática militar Tulumbí.
- 62 pruebas de aplicación de nuevos materiales o desarrollo tecnológico fueron ejecutadas mediante la elaboración de informes de aplicación para la elaboración de especies valoradas y documentos de seguridad.

7.3.3. Avance Físico Proyectos de Inversión


El Objetivo 3 cuenta con 34 proyectos de inversión ejecutados por 11 entidades. El monto codificado total asciende a USD 427,09 millones, con un devengado de USD 150,91 millones, lo que representa una ejecución presupuestaria del 35,33%. Considerando anticipos, la ejecución asciende al 37,51%, con un monto devengado más anticipo de USD 160,21 millones frente al codificado con fuente.

Las entidades que concentran el 95,82% del presupuesto codificado son el Ministerio de Defensa Nacional (USD 265,82 millones en 13 proyectos), el Servicio Nacional de Atención Integral a Personas Adultas Privadas de la Libertad y a Adolescentes Infractores (USD 73,47 millones en 3 proyectos) y el Ministerio del Interior (USD 69,97 millones en 5 proyectos).

En cuanto al avance físico, este objetivo registra un Avance Físico promedio en el año del 36,21% respecto de las metas anuales programadas, con un nivel promedio de cumplimiento del 60,60% al tercer trimestre, lo que indica un *“avance menor al esperado”*.

Destacan las entidades como el Instituto Geográfico Militar y la Fiscalía General del Estado quienes registran la totalidad de sus proyectos que alcanzaron el 100,00% de cumplimiento de sus metas físicas programadas al tercer trimestre. Así mismo, el Ministerio de Defensa Nacional, registra 2 proyectos de 13 que alcanzaron el 100,00% de cumplimiento de sus metas físicas programadas, mientras que el Ministerio del Interior alcanzó el 100% en 1 de sus 5 proyectos.

Ilustración 29. Gasto No Permanente, avance físico promedio y avance presupuestario- Objetivo 3

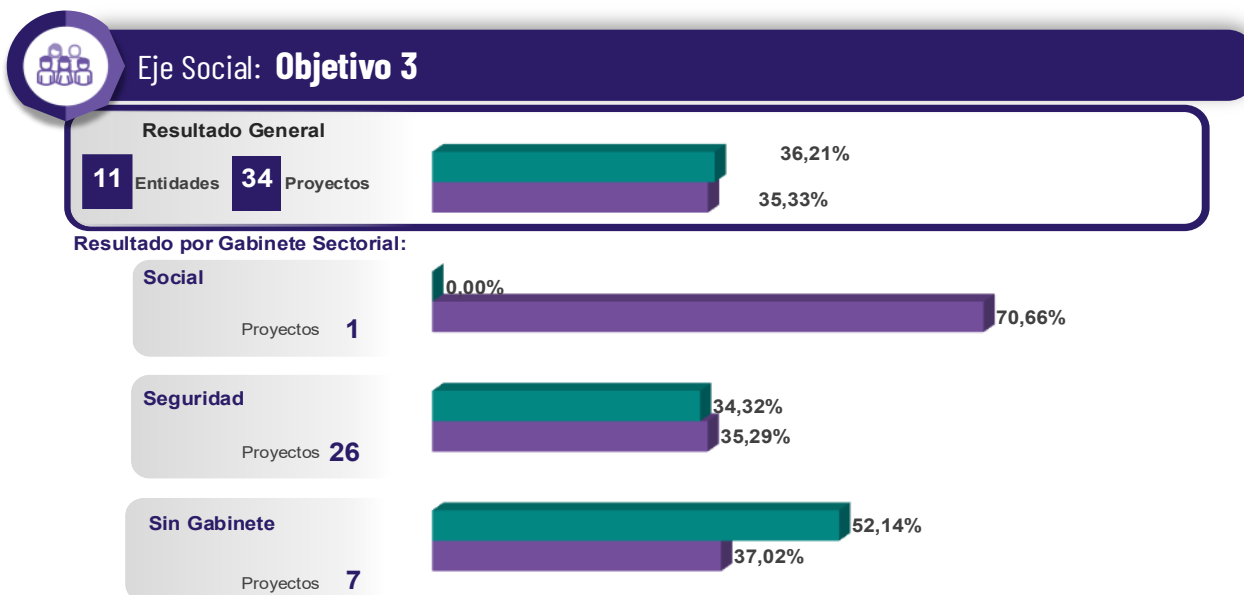

Fuente: SIPeIP, Presidencia de la República. e-SIGEF, MEF- Ejecución Presupuestaria. Corte 30 de septiembre 2025.

Elaboración: Dirección de Seguimiento a la Inversión – Presidencia de la República.

A continuación, se detalla el cumplimiento físico de los proyectos de inversión por gabinetes sectoriales relacionados con el Objetivo 3, lo que permite identificar los niveles de ejecución alcanzados por cada sector en relación con las metas físicas programadas.

Tabla 28. Cumplimiento físico por gabinete – Objetivo 3

Gabinete Sectorial	Número de Entidades	Número de Proyectos	Número de proyectos por nivel de cumplimiento			
Seguridad	7	26	● 6	● 0	● 14	● 6
Social	1	1	● 0	● 0	● 0	● 1
Sin Gabinete	3	7	● 2	● 0	● 2	● 3
Total	11	34	8	0	16	16

Nota: ● Avance esperado $\geq 100\%$ y $\leq 95\%$ / ● Avance cercano al esperado $> 95\%$ y $\leq 85\%$ / ● Avance menor al esperado $< 85\%$ / ● Proyecto sin programación de metas.

Fuente: SIPeIP – Presidencia de la República. e-SIGEF - MEF- Ejecución Presupuestaria. Corte 30 de septiembre de 2025.

Elaboración: Dirección de Seguimiento a la Inversión – Presidencia de la República.

Para conocer más información acerca de las entidades, por favor revisar el Anexo 2, que contiene la matriz resumen con información de avance presupuestario y físico.

A continuación, se presenta la información de ejecución de los principales proyectos de inversión que contribuyen a este objetivo:

Causas y Logros

Ministerio de Defensa Nacional

El Ministerio de Defensa Nacional contó, dentro del Objetivo 3, con un monto codificado de inversión de USD 265,82 millones y un monto devengado de USD 118,27 millones, lo que representa una ejecución presupuestaria del 44,49%. Cabe indicar que todo el presupuesto codificado cuenta con

fuelle de financiamiento y no se cuenta con anticipos.

En relación con el cumplimiento físico, la entidad reportó 13 proyectos alineados al Objetivo 3, de los cuales 10 cuentan con programación de metas físicas al tercer trimestre de 2025. Entre estos, 2 alcanzaron el 100,00% de cumplimiento, mientras que 4 no presenta avance físico.

Adicionalmente, se identificó 2 proyectos alineados al mismo objetivo que, si bien no cuentan con programación ni ejecución de metas físicas al tercer trimestre de 2025, registran ejecución presupuestaria (USD 0,56 millones) durante el período analizado.

Tabla 29. Avance Físico de Proyectos de Inversión al Tercer Trimestre Ministerio de Defensa Nacional – Objetivo 3

Nombre del proyecto	Programación metas físicas (a)	Ejecución metas físicas (b)	Cumplimiento metas físicas c(b/a)	Codificado (MM USD) (d)	Devengado (MM USD) (e)	Ejecución presupuestaria 2025 f (d/e)	Devengado + anticipos /codificado con fuente (g)
Recuperación y fortalecimiento de las capacidades oceánicas de la Armada	5,83%	7,43%	● 100,00%	30,07	-	0,00%	-
Liberación de tierras polucionadas por las minas terrestres o artefactos explosivos en estado de riesgo conocidos hasta el momento en la frontera común entre Ecuador y Perú	5,40%	5,40%	● 100,00%	1,24	0,27	21,72%	21,72%
Recuperación de la capacidad operativa de la Fuerza Terrestre para el control efectivo del Territorio Nacional y Zonas de Seguridad del Estado	31,72%	21,90%	● 69,04%	105,12	93,39	88,84%	89,92%
Adquisición de material y equipo para el control de disturbios y motines	25,00%	17,00%	● 68,00%	6,35	0,98	15,37%	15,37%
Implementación de la Brigada de Caballería Mecanizada No 3 "Manabí"	8,78%	4,15%	● 47,27%	20,18	16,56	82,10%	82,10%
Incrementar la capacidad operativa del Sistema de Vigilancia, Alarma y Control del Espacio Aéreo Nacional	24,00%	10,69%	● 44,54%	15,27	1,38	9,01%	9,01%
Renovación de la infraestructura de seguridad de los espacios marítimos	5,00%	0,00%	● 0,00%	33,59	-	0,00%	-

Nombre del proyecto	Programación metas físicas (a)	Ejecución metas físicas (b)	Cumplimiento metas físicas c(b/a)	Codificado (MM USD) (d)	Devengado (MM USD) (e)	Ejecución presupuestaria 2025 f (d/e)	Devengado o + anticipos /codificado con fuente (g)
Incrementar la capacidad de ciberdefensa en FFAA	56,43%	0,00%	● 0,00%	5,22	2,32	44,50%	44,50%
Recuperación de la capacidad operativa de la aviación de la Fuerza Aérea Ecuatoriana	0,29%	0,00%	● 0,00%	36,98	2,80	7,58%	7,58%
Proyecto de fortalecimiento, implementación y optimización del Subsistema de Inteligencia Militar	1,14%	0,00%	● 0,00%	-	-	-	-
Fortalecimiento de las capacidades del sistema de vigilancia, alarma y control del espacio aéreo nacional (Radares)	0,00%	0,00%	● -	1,18	0,01	1,07%	1,07%
Adquisición de aeronaves de entrenamiento básico para el curso unificado de pilotos militares de las Fuerzas Armadas en la Escuela Superior Militar de Aviación Cosme Renella Barbatto	0,00%	0,00%	● -	5,62	0,55	9,82%	9,82%
Adquisición de unidades de guardacostas	0,00%	0,00%	● -	5,00	-	0,00%	-
44,92%							

Nota: ● Avance esperado $\geq 100\%$ y $\leq 95\%$ / ● Avance cercano al esperado $> 95\%$ y $\leq 85\%$ / ● Avance menor al esperado $< 85\%$ / ● Proyecto sin programación de metas.

Fuente: SiPeIP – Presidencia de la República. e-SIGEF - MEF- Ejecución Presupuestaria. Corte 30 de septiembre de 2025.

Elaboración: Dirección de Seguimiento a la Inversión – Presidencia de la República.

El Ministerio de Defensa Nacional reporta las siguientes acciones:

Incrementar la capacidad de ciberdefensa en FFAA

La entidad informó que, el 11 de septiembre de 2025, se asignó presupuesto para dos nuevas actividades del proyecto, correspondientes a la adquisición de equipos de conectividad para el Datacenter del Comando de Ciberdefensa y a la adquisición de software y herramientas de ciberdefensa destinadas a la implementación de un Centro de Operaciones de Seguridad (SOC) en dicho comando.

Proyecto Recuperación de la Capacidad Operativa de la Fuerza Terrestre para el Control Efectivo del Territorio Nacional y Zonas de Seguridad del Estado

La entidad informó que, para el cuarto trimestre, se encuentra pendiente la recepción de tres helicópteros y de las prendas de intendencia correspondientes.



*Eje Económico, Productivo y
Empleo*



Eje Económico, productivo y empleo

Objetivo 4

7.4. OBJETIVO 4: Impulsar el desarrollo económico que genere empleo de calidad y finanzas públicas, sostenibles, inclusivas y equitativas.

Este Objetivo tiene el potencial de impulsar políticas económicas equitativas, políticas fiscales fundamentadas en los principios de solidaridad y proporcionalidad; políticas tributarias que promueva la redistribución y fomenten el empleo; así como políticas para generar recursos necesarios para una distribución del ingreso. Asimismo, busca fortalecer la equidad, la justicia social y la no discriminación, en torno al empleo digno, la estabilidad fiscal, el bienestar social y la igualdad de oportunidades para todas las personas.

Con base en la gestión desarrollada por el Estado a través de la implementación de sus planes institucionales, estudios, programas y proyectos durante el tercer trimestre del 2025, a continuación, se detallan los resultados alineados a este Objetivo:

7.4.1. Gestión Presupuestaria


Para el cumplimiento de las metas del Objetivo 4, se devengó un total de USD 59,11 millones en el tercer trimestre del 2025, de los cuales, el 88,20% corresponde a **Gasto Permanente** con un monto devengado de USD 52,14 millones; y, la diferencia corresponde al **Gasto No Permanente** vinculado a estudios, programas y proyectos de inversión, de diferentes entidades, con un monto devengado de USD 6.98 millones. (No incluye el Programa de Preservación de Capital)

Es importante señalar que, el “*Programa de preservación de capital periodo 2025*”, con grupos de gasto 73, 96 y 99, se encuentra alineado al Objetivo 4, alcanzando un monto codificado de USD 6.140,09 millones, y un devengado de USD 4.206,75 millones, lo cual representa una ejecución del 68,51%.

En la siguiente ilustración, se detalla el presupuesto de **Gasto No Permanente** excluyendo al “*Programa de preservación de capital periodo 2025*”, obteniendo un monto codificado de USD 24,75 millones y una ejecución de USD 6,98 millones, lo cual corresponde al 28,18% de ejecución.

Por su parte, la ejecución presupuestaria del **Gasto No Permanente** destinado al Objetivo 4, considerando el monto devengado más anticipos entregados en el periodo (USD 9,19 millones), frente al monto codificado con fuente de financiamiento (USD 24,75 millones), alcanza un nivel de ejecución del 37,15%

Ilustración 30. Gasto Permanente y No Permanente en 2025 – Objetivo 4
(millones de dólares)

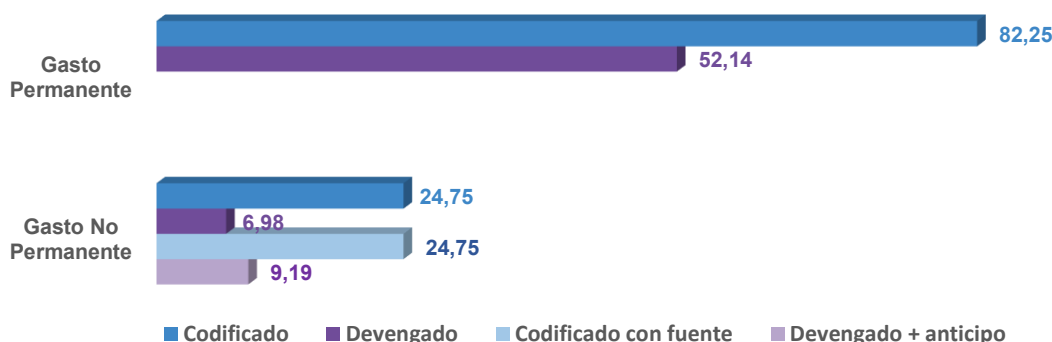

Nota: Para una mejor visualización, se excluye la información del “Programa de preservación de capital periodo 2025”, que se encuentra alineado al Objetivo 4.


Fuente: SIPeIP, Presidencia de la República. e-SIGEF, MEF- Ejecución Presupuestaria. Corte 30 de septiembre de 2025.

Elaboración: Dirección de Seguimiento a la Planificación y Política Pública y Dirección de Seguimiento a la Inversión – Presidencia de la República.

A continuación, se detallan los montos correspondientes al **Gasto Permanente** y **Gasto No Permanente** que fueron ejecutados al Objetivo 4, en función de los gabinetes sectoriales establecidos para la gestión institucional.

En **Gasto Permanente**, las entidades de la categoría Sin Gabinete son las que más recursos ejecutaron en este Objetivo con un monto devengado de USD 41,23 millones, conforme la siguiente ilustración:

Ilustración 31. Gasto Permanente por Gabinete Sectorial en 2025 – Objetivo 4
(millones de dólares)



Fuente: Base de datos e-SIGEF, Ejecución Presupuestaria Consolidada – MEF corte al 30 de septiembre de 2025.

Elaboración: Dirección de Seguimiento a la Planificación y Política Pública – Presidencia de la República.

En relación al **Gasto Permanente** alineado al Objetivo 4, se identifica que se encuentran 10 entidades, con un presupuesto codificado de USD 82,25 millones y un monto devengado de USD 52,14 millones lo que representa una ejecución presupuestaria del 63,39%. A continuación, se detalla la ejecución presupuestaria correspondiente al tercer trimestre por institución:

Tabla 30. Ejecución presupuestaria de las entidades alineadas al Objetivo 4

Gabinete Sectorial	Entidad	Codificado (MM USD)	Devengado (MM USD)	Ejecución (%)
Gabinete Sectorial Institucional	Servicio Ecuatoriano de Capacitación Profesional	0,41	0,32	77,54%
	Ministerio del Trabajo	0,96	0,65	67,22%
	Ministerio de Economía y Finanzas	16,61	9,93	59,81%
Sin Gabinete	Corporación del Seguro de Depósitos	0,02	0,02	91,72%

Gabinete Sectorial	Entidad	Codificado (MM USD)	Devengado (MM USD)	Ejecución (%)
	Junta Nacional de Defensa del Artesano	0,48	0,34	70,10%
	Superintendencia de Bancos	9,40	6,19	65,89%
	Escuela Superior Politécnica del Litoral	47,87	30,69	64,12%
	Junta de Política y Regulación Financiera	1,07	0,68	63,77%
	Universidad laica Eloy Alfaro de Manabí	5,30	3,27	61,69%
	Universidad Politécnica Estatal del Carchi	0,13	0,05	34,95%
Total		82,25	52,14	63,39%

Fuente: Base de datos e-SIGEF, Ejecución Presupuestaria Consolidada – MEF corte al 30 de septiembre de 2025. Estado de validación de planes institucionales tercer trimestre 2025, corte 30 de septiembre de 2025.

Elaboración: Dirección de Seguimiento a la Planificación y Política Pública – Presidencia de la República.


El objetivo 4 relacionado con impulsar el desarrollo económico que genere empleo de calidad, incluye a las instituciones Ministerio de Economía y Finanzas y a la Escuela Superior Politécnica del Litoral que concentran el 78,4% del codificado del objetivo, cuyos niveles de ejecución presupuestaria son 59,81% y 64,12% respectivamente.

Para el análisis del **Gasto No Permanente** se excluye el “Programa de Preservación de Capital – período 2025”, identificado con el CUP 81300000.0000.390031, cuya entidad responsable es el MEF. Al 30 de septiembre de 2025, este programa registra un presupuesto codificado de USD 6.140,09 millones y un devengado de USD 4.206,75 millones.

En este contexto, dentro del conjunto de entidades que ejecutan estudios, programas y proyectos de inversión alineados al Objetivo 4, se observa que las entidades pertenecientes al Gabinete Sectorial Institucional registraron una ejecución de USD 2,98 millones. Les siguen las entidades sin Gabinete sectorial, con un monto ejecutado de USD 2,66 millones y finalmente las entidades del Gabinete Sectorial de Desarrollo Productivo, con un devengado de USD 1,33 millones, alineados al Objetivo 4.

A continuación, se presenta la ejecución correspondiente al Objetivo 4, considerando el monto devengado más los anticipos en relación con el presupuesto codificado con fuente, desagregado por Gabinete Sectorial.

Ilustración 32. Gasto No Permanente por Gabinete Sectorial en 2025 (tercer trimestre) – Objetivo 4
(millones de dólares)

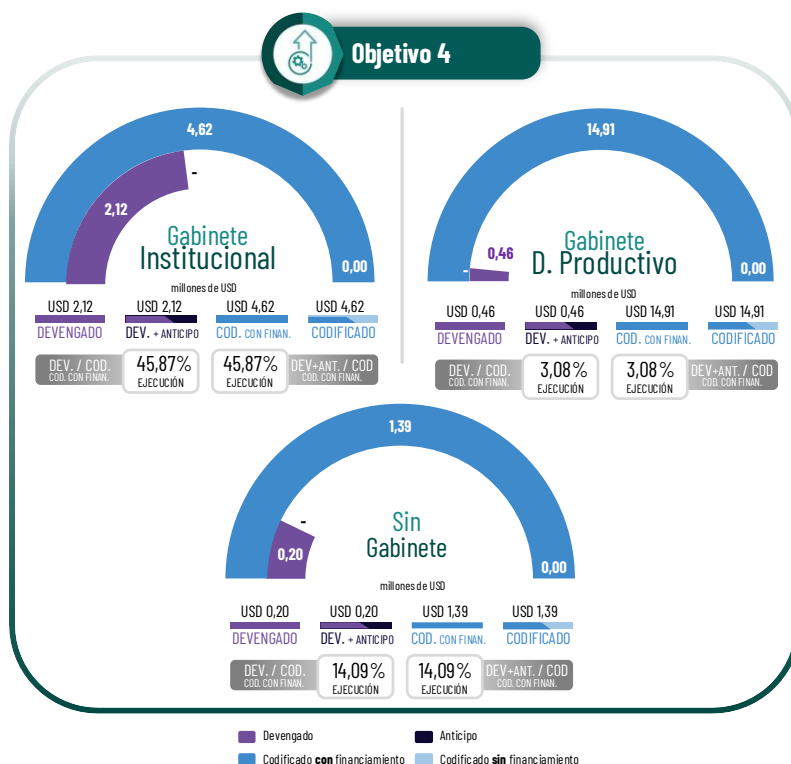

Nota: Para una mejor visualización, se excluye la información del “Programa de preservación de capital periodo 2025”, que se encuentra alineado al Objetivo 4.

Fuente: SiPeIP, Presidencia de la República. e-SIGEF, MEF- Ejecución Presupuestaria. Corte 30 de septiembre de 2025.

Elaboración: Dirección de Seguimiento a la Inversión – Presidencia de la República.

Considerando el monto devengado más anticipos y el monto codificado con fuente entregados en el periodo, se observa que en el Objetivo 4, las entidades que conforman el Gabinete Sectorial Institucional presentan una ejecución presupuestaria de 49,76%, correspondiente a 5 proyectos de inversión, mientras que la entidad sin Gabinete Sectorial alcanza una ejecución presupuestaria del 27,05%, correspondiente a 1 proyecto de inversión. Finalmente, las entidades del Gabinete Sectorial de Desarrollo Productivo con una ejecución presupuestaria del 14,94%, correspondientes a 3 proyectos de inversión.

Tabla 31. Cumplimiento presupuestario por gabinete sectorial en 2025 – Objetivo 4

Gabinete Sectorial	Número de Entidades	Número de Proyectos	% Ejecución presupuestaria	
			Devengado / Codificado	Devengado más anticipos / Codificado con fuente
Institucional	2	5	49,76%	49,76%
Sin Gabinete	1	1	27,05%	49,64%
Desarrollo Productivo	2	3	14,94%	14,94%
Total	5	9		

Nota: Se excluye la información del “Programa de preservación de capital periodo 2025”, que se encuentra alineado al Objetivo 4 y forma parte del Gabinete Sectorial Institucional.

Fuente: SiPeIP – Presidencia de la República. e-SIGEF – MEF- Ejecución Presupuestaria. Corte 30 de septiembre de 2025.



Elaboración: Dirección de Seguimiento a la Inversión – Presidencia de la República.

Para obtener información detallada sobre las entidades, se recomienda revisar el Anexo 2, que contiene la matriz resumen con datos sobre el avance presupuestario y físico.

7.4.2. Avance Físico de la Planificación Institucional

Las 5 entidades que cumplieron con el proceso de registro y la sistematización de su planificación institucional cuentan con indicadores alineados al Objetivo 4, el cual comprende un total de 10 objetivos institucionales y 29 indicadores estratégicos sujetos a seguimiento. De acuerdo con los resultados obtenidos, se identifica que el 82,76% de los indicadores presentan un avance esperado; el 3,45 %, un avance cercano al esperado; y el 13,79%, un avance menor al esperado, conforme al detalle que se presenta a continuación:

Tabla 32. Avance de Indicadores Institucionales – Objetivo 4

Entidad	Número Indicadores	Avance esperado 		Avance cercano al esperado 		Avance menor a lo esperado 	
		Indicadores	%	Indicadores	%	Indicadores	%
Corporación del Seguro de Depósitos, Fondo de Liquidez y Fondo de Seguros Privados	8	8	100,00%	0	0,00%	0	0,00%
Ministerio de Economía y Finanzas	4	4	100,00%	0	0,00%	0	0,00%
Ministerio de Trabajo	5	5	100,00%	0	0,00%	0	0,00%
Servicio Ecuatoriano de Capacitación Profesional	6	2	33,33%	0	0,00%	4	66,67%
Servicio de Rentas Internas	6	5	83,33%	1	16,67%	0	0,00%
Total	29	24	82,76%	1	3,45%	4	13,79%

Fuente: SIPeIP- GPR corte 30 de septiembre de 2025.

Elaboración: Dirección de Seguimiento a la Planificación y Política Pública – Presidencia de la República.

Principales Logros

Ministerio de Economía y Finanzas

- 97,82% de los pagos autorizados fueron efectuados por la Subsecretaría del Tesoro Nacional, alcanzando la meta programada.
- Boletín estadístico de deuda pública y otras obligaciones fue publicado en la página web del Ministerio de Economía y Finanzas de Ecuador (MEF), cumpliendo el 100% de lo planificado.
- Se alcanzó el 100% de cumplimiento de la implementación de desarrollos informáticos de complejidad alta o media frente al total de los solicitados. Correspondientes a: Subsistema Presupuestario de Remuneraciones y Nómina (SRPYN); Sistema de Bienes y Existencias (ESBYE), Sistema Integrado de Gestión Financiera (ESIGEF), entre otros.

Ministerio de Trabajo

- 3.856 mujeres y 5.348 jóvenes fueron colocados a través de la plataforma del Servicio Público de Empleo "Encuentra Empleo", destacando las provincias de Sucumbíos, Orellana, Zamora Chinchipe, Morona Santiago y Pichincha como las de mayor dinamismo laboral. Estas colocaciones fueron impulsadas por estrategias como la Ruta de la Empleabilidad, la Feria "Nuevo Empleo Guayaquil 2025" y la aplicación del Acuerdo Ministerial de Empleo Preferente en la Región Amazónica.
- 15.572 jóvenes a través de la plataforma del Servicio Público de Empleo "Encuentra Empleo" a nivel nacional, al 30 de septiembre 2025.
- 450 personas pertenecientes a grupos de atención prioritaria accedieron a través de la plataforma del Servicio Público de Empleo "Encuentra Empleo" a nivel nacional en el período

julio a septiembre. Así también se apoyó a que las empresas cumplan con la normativa legal vigente de vinculación laboral del 4% de personas con discapacidad. Al 30 de septiembre de 2025, se colocaron 1.350 personas a nivel nacional.

- 4.752 inspecciones de trabajo integrales, focalizadas, aleatorias y de verificación electrónica realizadas en el período julio a septiembre, con la finalidad de brindar a la ciudadanía servicios oportunos y de calidad; y, principalmente verificar las condiciones de trabajo.
- 376 inspecciones se ejecutaron a nivel nacional (362 especializadas y 14 por denuncia), totalizando 1.094 inspecciones a septiembre de 2025, en cumplimiento de la normativa sobre seguridad y salud en el trabajo.
- 39 instituciones públicas fueron monitoreadas por presentar servidores con algún tipo de impedimento para ejercer cargo público en el período julio a septiembre. En total se monitorearon a 116 instituciones públicas, al 30 de septiembre de 2025.
- 5 entidades públicas nuevas a nivel nacional en el período julio a septiembre, recibieron asesorías y capacitaciones en buenas prácticas de calidad, aplicando modelos de excelencia, mejora continua, innovación de procesos y atención ciudadana. En total 15 entidades públicas fueron asesoradas hasta septiembre 2025.

Servicio de Rentas Internas

- 3,9% de crecimiento de enero a septiembre 2025, en la recaudación tributaria respecto al mismo periodo de 2024, (USD 597 millones adicionales) producto del incremento de las tarifas de IVA e incremento en ventas.
- 284.898 correos persuasivos remitidos en el periodo enero a septiembre 2025, respecto a la declaración de IVA en atención al programa de Control Dígito caído que coadyuvaron al cumplimiento de la meta de la brecha de presentación a nivel nacional.
- USD 72,03 millones gestionados como monto adicional de cartera con corte a septiembre 2025, 1,92% más que la meta prevista, producto de las acciones persuasivas, depuración y seguimiento de la cartera, gestiones para el otorgamiento de facilidades de pago, y ejecución coactiva a nivel nacional.
- 2.423 ciudadanos incrementaron sus conocimientos tributarios con corte a septiembre 2025, por los cursos de autoestudios ofrecidos a través del campus virtual del SRI a nivel nacional.

Corporación del Seguro de Depósitos, Fondo de Liquidez y Fondo de Seguros Privados

- 30.388 beneficiarios recibieron el pago del Seguro de Depósitos por un monto de USD 145.869.874,13, a través de agentes pagadores y de la COSEDE, mediante sus canales presencial, por oficio y web, a nivel nacional.
- 3 fideicomisos del Seguro de Depósitos registraron un rendimiento del 4,50%, reflejando una rentabilidad positiva de las inversiones, como resultado de la adecuada ejecución de la política de inversión y del comportamiento favorable de las tasas internacionales, impulsadas por la política expansiva de la Reserva Federal y otros bancos, tanto a nivel nacional como internacional.

7.4.3. Avance Físico Proyectos de Inversión

El Objetivo 4 cuenta con 10 proyectos de inversión ejecutados por 5 entidades. El monto codificado total asciende a USD 6.164,84 millones, con un devengado de USD 4.213,72 millones, lo que representa una ejecución del 68,35%. Considerando anticipos, la ejecución asciende al 93,63%, con un monto devengado más anticipo de USD 4.215,94 millones frente al codificado con fuente.

Estos valores consideran al “Programa de preservación de capital periodo 2025”, con grupos de gasto 73, 96 y 99, que se encuentra alineado al Objetivo 4, alcanzando un monto codificado de USD 6.140,09 millones, y un devengado de y un devengado de USD 4.206,75 millones, lo que representa una ejecución del 68,51%.


Sin considerar el programa antes mencionado, el monto total codificado del resto de proyectos alineados al Objetivo 4 asciende a USD 24,75 millones, mientras que el monto devengado alcanza los USD 6,98 millones, lo que representa una ejecución presupuestaria del 28,18%. Considerando anticipos, la ejecución asciende al 37,15%, con un monto devengado más anticipo de USD 9,19 millones frente al codificado con fuente.

Excluyendo al “Programa de Preservación de Capital – período 2025”, se identifica que las entidades que concentran el 91,65% del presupuesto codificado son la Escuela Superior Politécnica del Litoral (USD 9,83 millones en 1 proyecto), el Servicio de Rentas Internas (USD 7,42 millones en 2 proyectos) y el Ministerio de Economía y Finanzas (USD 5,44 millones en 4 proyectos).

En cuanto al avance físico, este objetivo registra un Avance Físico promedio en el año del 32,13% respecto de las metas anuales programadas, con un nivel promedio de cumplimiento del 72,97% al tercer trimestre, lo que indica un “avance menor al esperado”.

Cabe destacar que el Servicio de Rentas Internas y el Servicio Nacional de Aduana del Ecuador alcanzaron el 100,00% de cumplimiento de sus metas físicas programadas al tercer trimestre, de todos sus proyectos en este objetivo. Así mismo, el Ministerio de Economía y Finanzas, registra 1 proyecto de 4 que alcanzó el 100,00% de cumplimiento de sus metas físicas programadas.

Ilustración 33. Gasto No Permanente, avance físico promedio y avance presupuestario- Objetivo 4

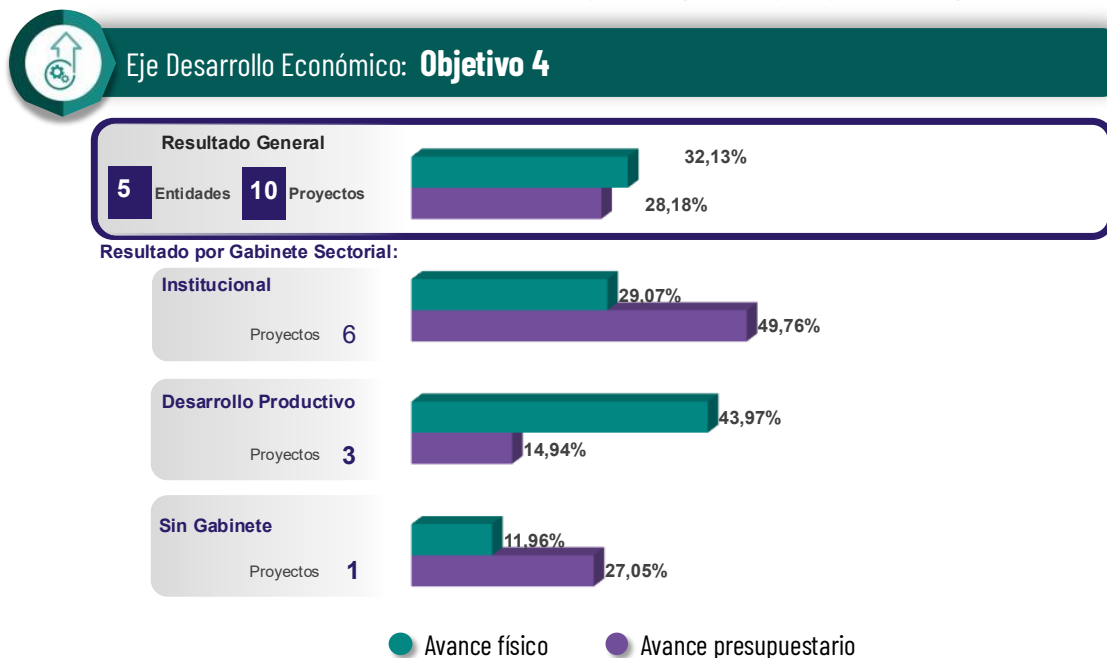

Nota: Se excluye la información presupuestaria del “Programa de preservación de capital periodo 2025”, que se encuentra alineado al Objetivo 4.

Fuente: SIPEIP, Presidencia de la República. e-SIGEF, MEF– Ejecución Presupuestaria. Corte 30 de septiembre 2025.

Elaboración: Dirección de Seguimiento a la Inversión – Presidencia de la República.

A continuación, se detalla el cumplimiento físico de los proyectos de inversión por gabinetes sectoriales relacionados con el Objetivo 4, lo que permite identificar los niveles de ejecución alcanzados por cada sector en relación con las metas físicas programadas.

Tabla 33. Cumplimiento físico por gabinete – Objetivo 4

Gabinete Sectorial	Número de Entidades	Número de Proyectos	Número de proyectos por nivel de cumplimiento			
Desarrollo Productivo	2	3	● 3	● 0	● 0	● 0
Institucional	2	5	● 2	● 0	● 4	● 0
Sin Gabinete	1	1	● 0	● 0	● 0	● 1
Total	5	10*	5	0	4	1

Nota: ● Avance esperado $\geq 100\%$ y $\leq 95\%$ / ● Avance cercano al esperado $> 95\%$ y $\leq 85\%$ / ● Avance menor al esperado $< 85\%$ / ● Proyecto sin programación de metas.

Nota (*): Se incluye el "Programa de preservación de capital periodo 2025", cuya entidad responsable es el Ministerio de Economía y Finanzas.

Fuente: SIPEIP, Presidencia de la República. e-SIGEF, MEF- Ejecución Presupuestaria. Corte 30 de septiembre de 2025.

Elaboración: Dirección de Seguimiento a la Inversión – Presidencia de la República.

Para conocer más información acerca de las entidades, por favor revisar el Anexo 2, que contiene la matriz resumen con información de avance presupuestario y físico.

A continuación, se presenta la información de ejecución de los principales proyectos de inversión que contribuyen a este objetivo:

Causas y Logros

Ministerio de Economía y Finanzas

El Ministerio de Economía y Finanzas registró un monto codificado de inversión de USD 6.145,54 millones y un devengado de USD 4.209,69 millones, lo que representa una ejecución presupuestaria del 68,50%. Al considerar el devengado más anticipos en relación con el codificado con fuente, la ejecución alcanza el 93,89%.

En relación con el cumplimiento físico, la entidad reportó 5 proyectos alineados al Objetivo 5, de los cuales todos cuentan con programación de metas físicas al tercer trimestre de 2025. Entre estos, 2 alcanzaron el 100,00% de cumplimiento.

Tabla 34. Avance Físico de Proyectos de Inversión al Tercer Trimestre Ministerio de Economía y Finanzas – Objetivo 4

Nombre del proyecto	Programación metas físicas (a)	Ejecución metas físicas (b)	Cumplimiento metas físicas c(b/a)	Codificado (MM USD) (d)	Devengado (MM USD) (e)	Ejecución presupuestaria 2025 f (d/e)	Devengado + anticipos /codificado con fuente (g)
Programa de preservación de capital periodo 2025	72,83%	72,86%	● 100,00%	6.140,09	4.206,75	68,51%	93,94%
Actualización tecnológica para el Fortalecimiento de las Finanzas Públicas	59,00%	59,00%	● 100,00%	2,94	2,74	93,28%	93,28%
Programa de apoyo a la reforma de Empresas Públicas MEF	2,90%	2,20%	● 75,86%	1,36	0,01	0,62%	0,62%

Nombre del proyecto	Programación metas físicas (a)	Ejecución metas físicas (b)	Cumplimiento metas físicas c(b/a)	Codificado (MM USD) (d)	Devengado (MM USD) (e)	Ejecución presupuestaria 2025 f (d/e)	Devengado + anticipos /codificado con fuente (g)
Programa de mejora de la capacidad fiscal para la inversión pública (EC-L1230)	2,78%	1,67%	● 60,07%	0,19	0,07	36,10%	36,10%
Programa de modernización de la administración financiera - MEF (EC-L1249)	10,18%	4,87%	● 47,84%	0,96	0,13	13,28%	13,28%
							93,89%

Nota: ● Avance esperado $\geq 100\%$ y $\leq 95\%$ / ● Avance cercano al esperado $> 95\%$ y $\leq 85\%$ / ● Avance menor al esperado $< 85\%$ / ● Proyecto sin programación de metas.

Fuente: SIPeIP – Presidencia de la República. e-SIGEF - MEF- Ejecución Presupuestaria. Corte 30 de septiembre de 2025.

Elaboración: Dirección de Seguimiento a la Inversión – Presidencia de la República.

Al excluir el “Programa de Preservación de Capital – período 2025”, el monto codificado de inversión para los proyectos restantes asciende a USD 5,44 millones, con un devengado de USD 2,94 millones, lo que corresponde a una ejecución presupuestaria del 54,05%. No se registran anticipos.

El Ministerio de Economía y Finanzas reporta las siguientes acciones:

Proyecto Programa de preservación de capital período 2025

La entidad informó que el componente principal corresponde al pago de la amortización de la deuda pública, el cual representa el 94% de las metas físicas del proyecto. Este componente registra una ejecución presupuestaria acumulada del 70,86%. Por su parte, el pago de costos de obligaciones firmes presenta una ejecución acumulada del 15%, mientras que el pago de costos y gastos asociados a procedimientos arbitrales o judiciales alcanza una ejecución del 60%.

Se identificó como nudo crítico la posible actualización del Programa de Preservación de Capital (PPC) 2025.



Eje Económico, productivo y empleo

Objetivo 5

7.5. OBJETIVO 5: Fortalecer la producción nacional y la inversión extranjera en los sectores clave de la economía con innovación tecnológica y prácticas sostenibles.

Este Objetivo se fundamenta en la normativa legal vigente y posibilita la producción, inversión e innovación en los sectores clave de la economía con prácticas sostenibles.


Con base en la gestión desarrollada por el Estado a través de la implementación de sus planes institucionales, estudios, programas y proyectos durante el tercer trimestre del 2025, a continuación, se detallan los resultados alineados a este Objetivo:

7.5.1. Gestión Presupuestaria

Para el cumplimiento de las metas del Objetivo 5, se devengó un total de USD 134,78 millones en el tercer trimestre del 2025, de los cuales, el 27,40% corresponde a **Gasto Permanente** con un monto devengado de USD 36,93 millones; y, la diferencia corresponde al **Gasto No Permanente** vinculado a estudios, programas y proyectos de inversión, de diferentes entidades, con un monto devengado de USD 97,85 millones.

Por su parte, la ejecución presupuestaria del **Gasto No Permanente** destinado al Objetivo 5, considerando el monto devengado más anticipos entregados en el periodo (USD 98,48 millones), frente al monto codificado con fuente de financiamiento (USD 172,59 millones), alcanza un nivel de ejecución del 57,06%.

Ilustración 34. Gasto Permanente y No Permanente en 2025 – Objetivo 5
(millones de dólares)

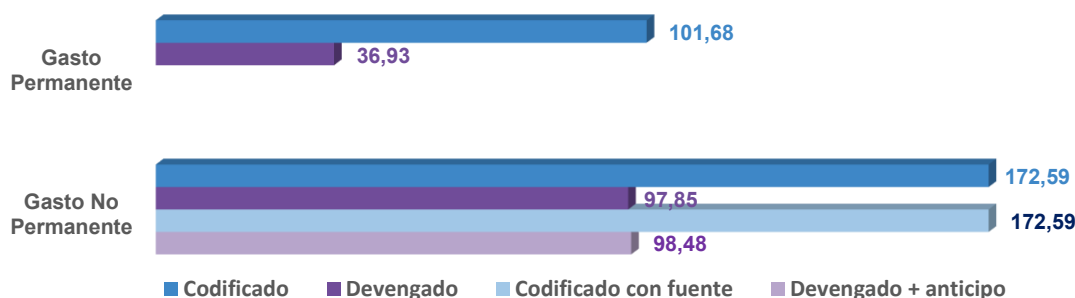

Fuente: SIPeIP, Presidencia de la República. e-SIGEF, MEF- Ejecución Presupuestaria. Corte 30 de septiembre de 2025.


Elaboración: Dirección de Seguimiento a la Planificación y Política Pública y Dirección de Seguimiento a la Inversión – Presidencia de la República.

A continuación, se detallan los montos correspondientes al **Gasto Permanente** y **No Permanente** que fueron ejecutados, alineados al Objetivo 5, en función de los gabinetes sectoriales establecidos para la gestión institucional.

En **Gasto Permanente**, las entidades Sin Gabinete, son las que más recursos ejecutaron en este

Objetivo con un monto devengado de USD 18,74 millones, conforme la siguiente ilustración:

Ilustración 35. Gasto Permanente por Gabinete Sectorial en 2025 – Objetivo 5
(millones de dólares)

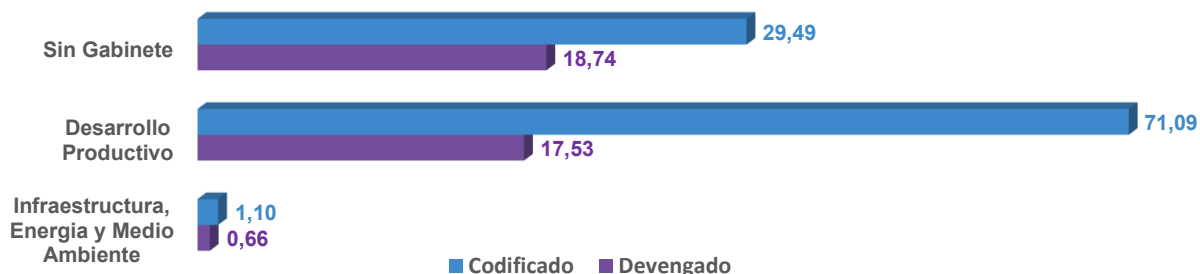

Fuente: Base de datos e-SIGEF, Ejecución Presupuestaria Consolidada – MEF corte al 30 de septiembre de 2025.

Elaboración: Dirección de Seguimiento a la Planificación y Política Pública – Presidencia de la República.

En relación al **Gasto Permanente** alineado al Objetivo 5, se identifica que se encuentran alineadas 11 entidades, con un presupuesto codificado de USD 101,68 millones y un monto devengado de USD 36,93 millones, lo que representa una ejecución presupuestaria del 36,32%. A continuación, se detalla la ejecución presupuestaria correspondiente al tercer trimestre por institución:

Tabla 35. Ejecución presupuestaria de las entidades alineadas al Objetivo 5

Gabinete Sectorial	Entidad	Codificado (MM USD)	Devengado (MM USD)	Ejecución (%)
Gabinete Sectorial de Desarrollo Productivo	Servicio Ecuatoriano de Normalización	1,70	1,22	71,59%
	Servicio de Acreditación Ecuatoriano	1,10	0,79	71,28%
	Servicio Nacional de Contratación Pública	3,37	2,37	70,24%
	Instituto Publico de Investigación de Acuicultura y Pesca	0,80	0,55	69,59%
	Ministerio de Producción Comercio Exterior e Inversiones	47,22	11,96	25,32%
	Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca	16,90	0,65	3,85%
Gabinete Sectorial de Infraestructura, Energía y Medio Ambiente	Agencia de Regulación y Control Fito y Zoonosanitario	1,10	0,66	59,58%
Sin Gabinete	Superintendencia de Compañías Valores y Seguros	9,66	6,94	71,82%
	Superintendencia de Economía Popular y Solidaria	8,96	6,31	70,38%
	Conferencia Plurinacional e Intercultural de Soberanía Alimentaria	0,58	0,40	69,09%
	Consejo de Gobierno del Régimen Especial de Galápagos	10,28	5,09	49,50%
Total		101,68	36,93	36,32%

Fuente: Base de datos e-SIGEF, Ejecución Presupuestaria Consolidada – MEF corte al 30 de septiembre de 2025. Estado de validación de planes institucionales tercer trimestre 2025, corte 30 de septiembre de 2025.


Elaboración: Dirección de Seguimiento a la Planificación y Política Pública – Presidencia de la República.

El objetivo 5 relacionado con Fortalecer la producción nacional y la inversión extranjera, incluye a las instituciones, Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca y Ministerio de Producción Comercio

Exterior e Inversiones que concentran el 63,1% del codificado del objetivo, con niveles de ejecución presupuestaria de 3,85% y 25,32% respectivamente.

Por su parte, en lo que respecta al **Gasto No Permanente**, las entidades que conforman el Gabinete Sectorial de Desarrollo Productivo ejecutaron USD 95,52 millones, mientras que las entidades del Gabinete Social ejecutaron USD 1,35 millones y finalmente las entidades sin Gabinete ejecutaron USD 0,97 millones, alineados al Objetivo 5.

Ilustración 36. Gasto No Permanente por Gabinete Sectorial en 2025 (tercer trimestre) – Objetivo 5
(millones de dólares)

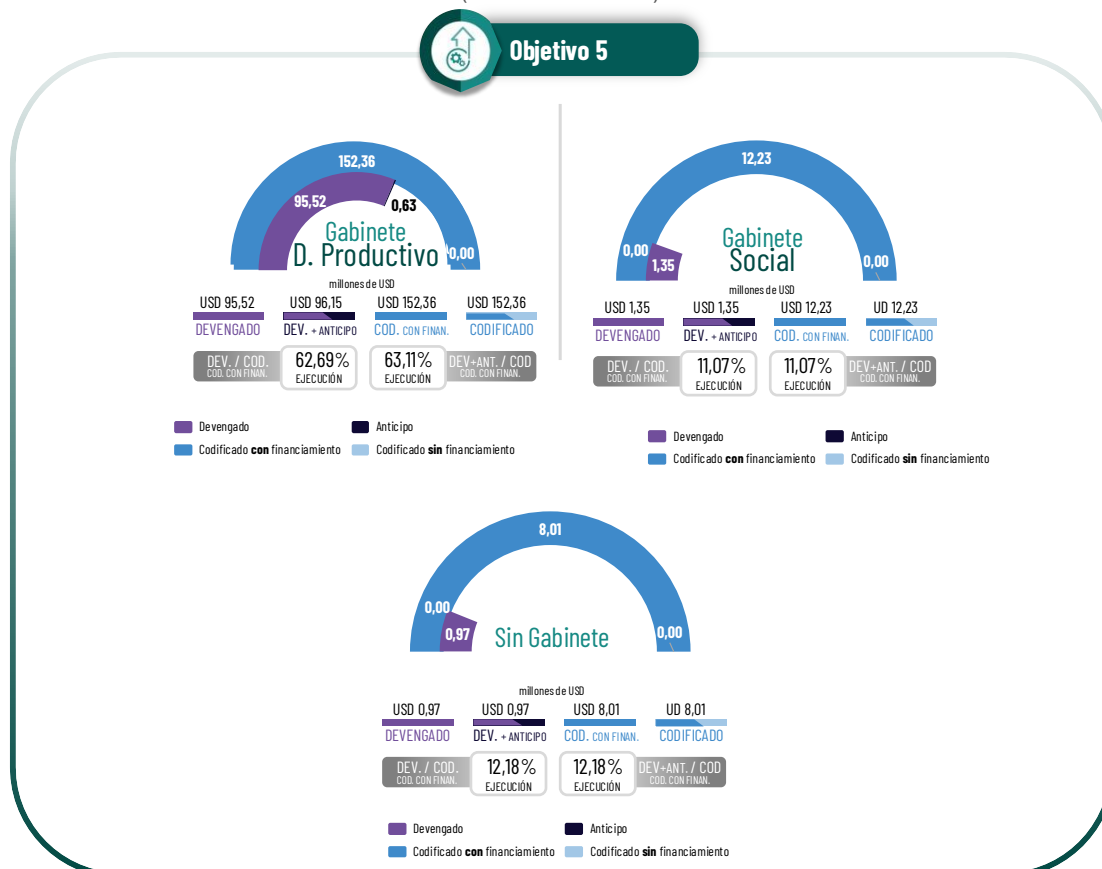

Fuente: SIPeIP, Presidencia de la República. e-SIGEF, MEF- Ejecución Presupuestaria. Corte 30 de septiembre de 2025.

Elaboración: Dirección de Seguimiento a la Inversión – Presidencia de la República.

Considerando el monto devengado más anticipos y el monto codificado con fuente entregados en el periodo, se observa que en el Objetivo 5, las entidades que conforman el Gabinete Sectorial de Desarrollo Productivo presentan una ejecución presupuestaria de 63,11%, correspondiente a 33 proyectos de inversión, mientras que las entidades sin Gabinete alcanzan una ejecución presupuestaria del 12,18%, correspondiente a 2 proyectos de inversión. Finalmente, la entidad del Gabinete Sectorial de lo Social con una ejecución presupuestaria del 11,07%, correspondientes a 2 proyectos de inversión.

Tabla 36. Cumplimiento presupuestario por gabinete sectorial en 2025 – Objetivo 5

Gabinete Sectorial	Número de Entidades	Número de Proyectos	% Ejecución presupuestaria	
			Devengado / Codificado	Devengado más anticipos / Codificado con fuente
Desarrollo Productivo	5	33	62,69%	63,11%
Sin Gabinete	2	2	12,18%	12,18%
Social	1	2	11,07%	11,07%
Total	8	37		

Fuente: SIPeIP – Presidencia de la República. e-SIGEF – MEF– Ejecución Presupuestaria. Corte 30 de septiembre de 2025.

Elaboración: Dirección de Seguimiento a la Inversión – Presidencia de la República.

Para obtener información detallada sobre las entidades, se recomienda revisar el Anexo 2, que contiene la matriz resumen con datos sobre el avance presupuestario y físico.

7.5.2. Avance Físico de la Planificación Institucional

Las 9 entidades que cumplieron con el proceso de registro y la sistematización de su planificación institucional cuentan con indicadores alineados al Objetivo 5, el cual comprende un total de 19 objetivos institucionales y 54 indicadores estratégicos sujetos a seguimiento. De acuerdo con los resultados obtenidos, se identifica que el 72,22% de los indicadores presentan un avance esperado; el 7,41 %, un avance cercano al esperado; y el 20,37%, un avance menor al esperado, conforme al detalle que se presenta a continuación:

Tabla 37. Avance de Indicadores Institucionales – Objetivo 5

Entidad	Número Indicadores	Avance esperado		Avance cercano al esperado		Avance menor a lo esperado	
		Indicadores	%	Indicadores	%	Indicadores	%
Agencia de Regulación y Control Fito y Zoonosanitario	3	3	100,00%	0	0,00%	0	0,00%
Instituto Nacional de Economía Popular y Solidaria	4	3	75,00%	1	25,00%	0	0,00%
Servicio Ecuatoriano de Normalización	9	9	100,00%	0	0,00%	0	0,00%
Instituto Nacional de Investigaciones Agropecuarias	8	6	75,00%	0	0,00%	2	25,00%
Ministerio de Agricultura y Ganadería	15	7	46,67%	2	13,33%	6	40,00%
Ministerio de Producción, Comercio Exterior, Inversiones y Pesca.	10	7	70,00%	0	0,00%	3	30,00%
Servicio de Acreditación Ecuatoriano	2	2	100,00%	0	0,00%	0	0,00%
Servicio Nacional de Contratación Pública	1	1	100,00%	0	0,00%	0	0,00%
Superintendencia de Economía Popular y Solidaria	2	1	50,00%	1	50,00%	0	0,00%
Total	54	39	72,22	4	7,41%	11	20,37%

Fuente: Presidencia de la República, SIPeIP corte 30 de septiembre de 2025, GPR corte 30 de septiembre de 2025.

Elaboración: Dirección de Seguimiento a la Planificación y Política Pública –Presidencia de la República.

Principales Logros

Ministerio de Agricultura y Ganadería

- 39.147 productores agropecuarios con servicios “ATER” atendidos en el periodo de julio a septiembre de 2025 de una meta planificada de 22.448, el incremento de resultados responde

a un aumento de la necesidad de capacitación y asistencia técnica para acceder a beneficios que otorga el Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca.

- Una canasta de aproximadamente 79 productos agrícolas en 22 mercados mayoristas se monitoreó hasta septiembre de 2025, a través de reportes de precios, cumpliendo así el 100% de lo planificado.
- 13.911 paquetes de insumos agropecuarios fueron entregados a septiembre de 2025, en función de la demanda desde territorio, causadas por afectaciones de la época invernal durante el 2024-2025, a nivel nacional.
- 100% de solicitudes atendidas de aprovechamiento forestal, que representó 1.051 atenciones en el periodo de julio a septiembre de 2025, con una superficie de 8.246,70756 hectáreas y un volumen de 1.476.340,53 m³, a nivel nacional.
- 74.905 predios de pequeños y medianos productores regularizados hasta el mes de septiembre del 2025, lo que refleja un avance acumulado del 93,60%, de una meta planificada de 80.027 títulos de propiedad dando cumplimiento a la obligación de que toda adjudicación se protocolizará y perfeccionará conforme dispone el artículo 70 de la Ley Orgánica de Tierras Rurales y Territorios Ancestrales, a nivel nacional.
- 25 organizaciones del sector agropecuario atendidas en el periodo de julio a septiembre de 2025, reportándose un total de 1.975 organizaciones que están implementando metodologías y herramientas socio-organizativas, brindadas en los procesos de formación y apoyo en trámites de legalización y regularización.
- 1.017 productores de la Agricultura Familiar Campesina fueron vinculados a Circuitos Alternativos de Comercialización, de los cuales el 68,2% son mujeres rurales.
- 6.213 nuevos productores de la Agricultura Familiar Campesina incorporados durante el tercer trimestre del 2025 en el registro del sello agricultura familiar campesina, dentro del Registro SIRUS a nivel nacional.
- 398 Circuitos Alternativos de Comercialización activos implementados en el período de julio a septiembre de 2025 por medio de los equipos técnicos y en articulación con actores públicos y privados en el marco de construcción de un sistema agroalimentario sostenible a nivel nacional.

Ministerio de Producción Comercio Exterior Inversiones y Pesca

- 3 solicitudes para la suscripción de contratos de inversión, alcanzando un monto acumulado de USD 7.802,79 millones, lo que supera la meta planificada. Este resultado refleja los efectos positivos de las políticas impulsadas por el actual Gobierno, orientadas a fortalecer la estabilidad económica, la seguridad y la confianza social dentro del territorio nacional.
- 3.558 emprendedores, artesanos y MiPymes participaron en actividades de vinculación con el mercado, alcanzando un total acumulado de 20.578 participantes. Este avance se debe a la efectividad de las acciones implementadas para fomentar la articulación comercial, generar nuevas oportunidades de negocio y fortalecer el posicionamiento de los emprendedores dentro del ecosistema económico nacional.
- 2 nuevos Organismos Evaluadores de la Conformidad, correspondientes a un Laboratorio (LAMITEX S.A.) y un Organismo de Inspección (BUREAU VERITAS ECUADOR S.A.), contribuyendo al fortalecimiento de la infraestructura de la calidad en el país. Estos organismos se encuentran ubicados en las provincias de Azuay y Pichincha, respectivamente

Superintendencia de Economía Popular y Solidaria

- 2.974 estándares normativos fueron evaluados entre julio y septiembre de 2025, representando el 90% del total de estándares a escala nacional.

Agencia de Regulación y Control Fito y Zoosanitario

- 10 metodologías, 1 validación y 5 capacitaciones implementadas mediante la Coordinación General de Laboratorios en el período de julio a septiembre de 2025, el índice de la capacidad analítica de los laboratorios fue de 93,46, mediante la implementación de la oferta de análisis para el diagnóstico oportuno de enfermedades animales de control oficial, plagas, contaminantes en alimentos y productos agropecuarios en fase primaria de producción.
- 30 muestras pecuarias y 93 muestras agrícolas se analizaron en total en el período julio a septiembre de 2025. Dando como resultado, 21 muestras pecuarias y 57 muestras agrícolas que cumplen con la normativa legal vigente. Dando como resultado total acumulado de 111 muestras que cumplen con la normativa legal vigente de 156 muestras analizadas.

Instituto Nacional Autónomo de Investigaciones Agropecuarias

- 30.883 accesiones fueron conservadas durante el periodo comprendido entre julio y septiembre de 2025. Este resultado refleja el número de accesiones que se mantienen en conservación dentro del Banco de Germoplasma del INIAP, en el marco de las acciones estratégicas orientadas al uso sostenible de los recursos fitogenéticos para la agricultura y la alimentación del país. La conservación de este material genético constituye un pilar fundamental para la seguridad alimentaria nacional, al tiempo que impulsa la investigación científica y el desarrollo de variedades adaptadas a las diversas condiciones agroecológicas del Ecuador.
- 358 publicaciones científicas fueron desarrolladas en el tercer trimestre, resultado del dinamismo en la generación de conocimiento técnico-científico, impulsado por la alta demanda de investigación en los distintos rubros productivos que actualmente gestiona el Instituto a nivel nacional
- 17.998 análisis de laboratorio, alcanzando un resultado acumulado de 190.476 análisis, superando la meta planificada de 189.635. Los análisis fueron ejecutados por los diferentes laboratorios del INIAP a nivel nacional, en atención a clientes internos y externos, demostrando la capacidad operativa y técnica del Instituto para responder a la demanda analítica, apoyar los procesos de investigación, desarrollo e innovación, y contribuir al control de calidad en el ámbito agrícola.
- 3.494 agricultores fueron beneficiados a través de procesos de transferencia y difusión de tecnologías, alcanzando un resultado acumulado de 24.207 beneficiarios, que supera la meta planificada de 20.027 hasta el tercer trimestre.

Servicio Nacional de Contratación Pública

- 99,99% de disponibilidad del Sistema Oficial de Contratación del Estado se alcanzó durante el periodo julio a septiembre de 2025. Este resultado gracias fue posible gracias al trabajo técnico colaborativo y a la implementación de mecanismos de monitoreo preventivo y correctivo de servidores y redes, ejecutados por la Coordinación de TICs en Quito – Nivel Central, garantizando la continuidad operativa, su estabilidad y rendimiento sostenido y la confianza en los procesos de contratación pública.
- 100% de avance con el cumplimiento de una Resolución Externa: R.E-SERCOP-2025-0153 -DISPOSICIONES TRANSITORIAS NECESARIAS PARA EL CORRECTO FUNCIONAMIENTO DE LOS PROCEDIMIENTOS DE CONTRATACIÓN PÚBLICA, emitida el 8 de agosto de 2025, esto en cumplimiento de la Disposición Transitoria Cuarta de la Ley Orgánica de Integridad Pública, que en su parte pertinente manifiesta: "(...) el SERCOP emitirá las directrices transitorias que fueren necesarias para la normal continuidad de las contrataciones públicas (...)".

7.5.3. Avance Físico Proyectos de Inversión


El Objetivo 5 cuenta con 37 proyectos de inversión ejecutados por 8 entidades. El monto codificado total asciende a USD 172,59 millones, con un devengado de USD 97,85 millones, lo que representa una ejecución presupuestaria del 56,69%. Considerando anticipos, la ejecución asciende al 57,06%, con un monto devengado más anticipo de USD 98,48 millones frente al codificado con fuente.

Las entidades que concentran el 82,55% del presupuesto codificado son el Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca (USD 124,77 millones en 19 proyectos) y el Ministerio de Producción Comercio Exterior e Inversiones (USD 17,72 millones en 6 proyectos).

En cuanto al avance físico, este objetivo registra un Avance Físico promedio en el año del 36,80% respecto de las metas anuales programadas, con un nivel promedio de cumplimiento del 79,12% al tercer trimestre, lo que indica un “*avance menor al esperado*”.

Cabe destacar que la Escuela Superior Politécnica del Litoral alcanzó el 100,00% de cumplimiento de sus metas físicas programadas al tercer trimestre, en este objetivo. El Ministerio de Producción, Comercio Exterior e Inversiones registra 3 de 6 proyectos que alcanzaron el 100% de cumplimiento de sus metas físicas programadas. Por su parte, el Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca reporta 1 de 19 proyectos con dicho nivel de cumplimiento, mientras que el Instituto Nacional Autónomo de Investigaciones Agropecuarias alcanzó el 100% en 1 de sus 2 proyectos.

Ilustración 37. Gasto No Permanente, avance físico promedio y avance presupuestario-Objetivo 5

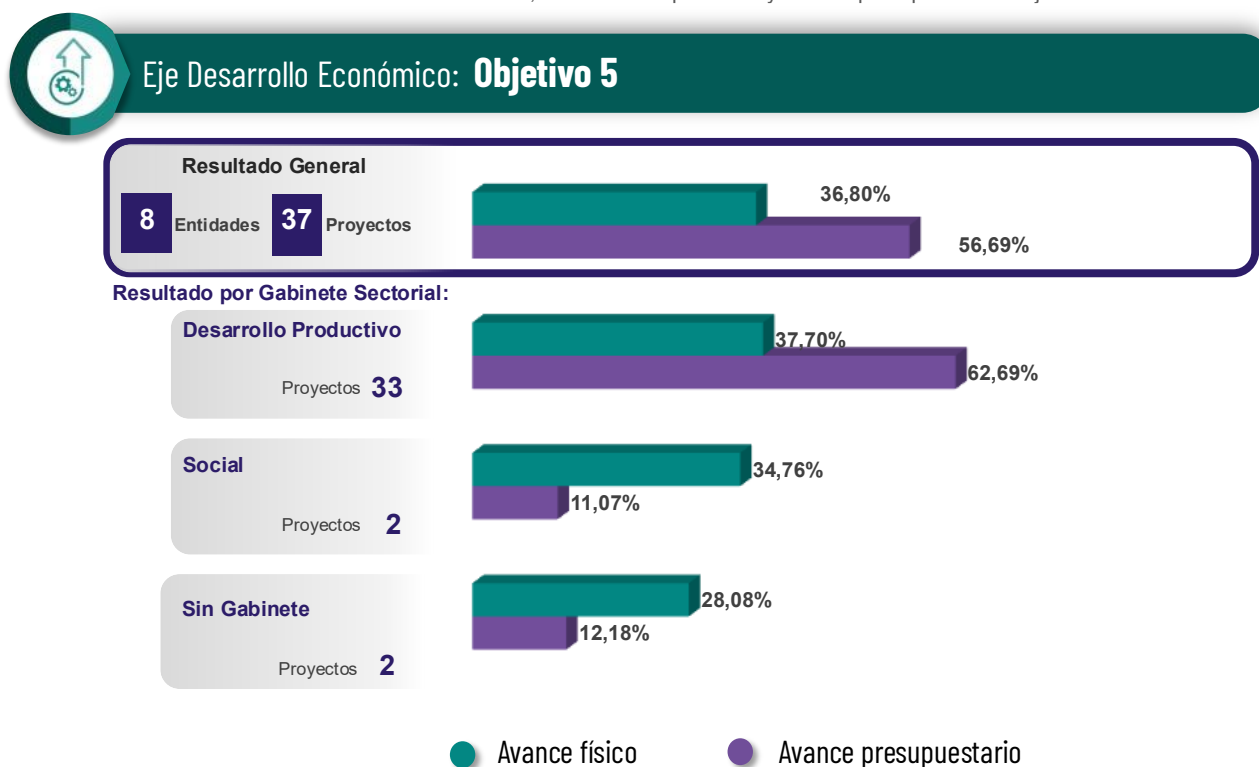

Fuente: SIPeIP, Presidencia de la República. e-SIGEF, MEF– Ejecución Presupuestaria. Corte 30 de septiembre 2025.

Elaboración: Dirección de Seguimiento a la Inversión – Presidencia de la República.

A continuación, se detalla el cumplimiento físico de los proyectos de inversión por gabinetes sectoriales relacionados con el Objetivo 5, lo que permite identificar los niveles de ejecución alcanzados por cada sector en relación con las metas físicas programadas.

Tabla 38. Cumplimiento físico por gabinete – Objetivo 5

Gabinete Sectorial	Número de Entidades	Número de Proyectos	Número de proyectos por nivel de cumplimiento			
Desarrollo Productivo	5	33	● 11	● 2	● 10	● 10
Social	1	2	● 1	● 0	● 1	● 0
Sin Gabinete	2	2	● 1	● 0	● 0	● 1
Total	8	37	13	2	11	11

Nota: ● Avance esperado $\geq 100\%$ y $\leq 95\%$ / ● Avance cercano al esperado $> 95\%$ y $\leq 85\%$ / ● Avance menor al esperado $< 85\%$ / ● Proyecto sin programación de metas.

Fuente: SIPeIP – Presidencia de la República. e-SIGEF - MEF- Ejecución Presupuestaria. Corte 30 de septiembre de 2025.

Elaboración: Dirección de Seguimiento a la Inversión – Presidencia de la República.

Para conocer más información acerca de las entidades, por favor revisar el Anexo 2, que contiene la matriz resumen con información de avance presupuestario y físico.

A continuación, se presenta la información de ejecución de los principales proyectos de inversión que contribuyen a este objetivo:

Causas y Logros

Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca

El Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca registró un monto codificado de inversión de USD 124,77 millones y un devengado de USD 74,25 millones, lo que representa una ejecución del 59,51%. Al considerar el devengado más anticipos en relación con el codificado con fuente, la ejecución alcanza el 60,01%.

En relación con el cumplimiento físico, la entidad reportó 19 proyectos alineados al Objetivo 5, de los cuales 9 cuentan con programación de metas físicas al tercer trimestre de 2025. Entre estos, 3 alcanzaron el 100,00% de cumplimiento, mientras que 1 no presenta avance físico.

Adicionalmente, se identificó 7 proyectos alineados al mismo objetivo que, si bien no cuentan con programación ni ejecución de metas físicas al tercer trimestre de 2025, registran ejecución presupuestaria (USD 17,75 millones) durante el período analizado.

Tabla 39. Avance Físico de Proyectos de Inversión al Tercer Trimestre Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca – Objetivo 5

Nombre del proyecto	Programación metas físicas (a)	Ejecución metas físicas (b)	Cumplimiento metas físicas c (b/a)	Codificado (MM USD) (d)	Devengado (MM USD) (e)	Ejecución presupuestaria 2025 f(e/d)	Devengado + anticipos /codificado con fuente (g)
Proyecto Desarrollo Sostenible y Aprovechamiento en Territorios Rurales -DESATAR	0,90%	12,53%	● 100,00%	5,21	3,53	67,72%	67,72%
Proyecto Nacional de Reconversión y Sostenibilidad Ganadera	8,70%	9,11%	● 100,00%	4,13	2,71	65,66%	70,69%
Fortalecimiento integral y sostenible del sector acuícola y pesquero	18,07%	20,61%	● 100,00%	13,20	9,02	68,33%	68,33%
Proyecto Integral de Diversificación Agroproductiva y Reconversión Agrícola	10,60%	10,45%	● 98,58%	60,41	32,39	53,62%	53,62%

Nombre del proyecto	Programación metas físicas (a)	Ejecución metas físicas (b)	Cumplimiento metas físicas c (b/a)	Codificado (MM USD) (d)	Devengado (MM USD) (e)	Ejecución presupuestaria 2025 f(e/d)	Devengado + anticipos /codificado con fuente (g)
Regularización de tierras rurales y territorios ancestrales	12,71%	10,86%	● 85,44%	5,46	3,76	68,90%	68,90%
Dinamización del sector forestal productivo sostenible	12,74%	10,68%	● 83,83%	1,22	0,58	47,87%	47,87%
Proyecto de Riego Integral Tecnificado Parcelario - PRITEP	2,65%	2,03%	● 76,60%	3,52	1,58	44,90%	55,93%
Proyecto para la ejecución del Sistema de Aseguramiento Agropecuario Subvencionado, con énfasis en pequeños y medianos productores vulnerables a los efectos del cambio climático	9,24%	5,90%	● 63,85%	0,98	0,67	68,15%	68,15%
Gestión de la información y conocimiento para el desarrollo económico, social y ambiental del sector agropecuario	13,20%	0,00%	● 0,00%	11,00	2,24	20,37%	20,68%
Fomento a la producción agrícola a través de la implementación de sistemas de uso y aprovechamiento del recurso hídrico para el Desarrollo Rural y la Soberanía Alimentaria	0,00%	0,00%	● -	0,11	0,07	64,77%	64,77%
Proyecto de Innovación de Asistencia Técnica y Extensión Rural - PIATER	0,00%	0,00%	● -	0,07	0,04	50,09%	50,09%
Proyecto de Fomento a la Inversión Agropecuaria	0,00%	0,00%	● -	18,02	17,17	95,31%	95,31%
Proyecto Nacional de Incentivos Productivos para el Sector Agrícola	0,00%	0,00%	● -	0,02	0,01	21,22%	21,22%
Fortalecer las capacidades productivas sostenibles y de comercialización de los productores de la agricultura familiar campesina	0,00%	0,00%	● -	0,00	-	0,00%	-
Proyecto financiamiento productivo agropecuario "MAKIPURANA"	0,00%	0,00%	● -	0,00	0,00	100,00%	100,00%
Implantación del proceso Reforma Institucional MAGAP	0,00%	0,00%	● -	0,02	0,02	100,00%	100,00%
Proyecto Agroseguro Para Pequeños Y Medianos Productores Y Pescadores Artesanales Del Ecuador	0,00%	0,00%	● -	0,21	-	0,00%	-
Rehabilitación de la infraestructura de los sistemas de riego a nivel nacional	0,00%	0,00%	● -	0,89	0,45	50,44%	50,44%
Proyecto de apoyo financiero para el desarrollo agropecuario - Agroimpacto	0,00%	0,00%	● -	0,28	-	0,00%	-
60,01%							

Nota: ● Avance esperado $\geq 100\%$ y $\leq 95\%$ / ● Avance cercano al esperado $> 95\%$ y $\leq 85\%$ / ● Avance menor al esperado $< 85\%$ / ● Proyecto sin programación de metas.

Fuente: SIPeIP – Presidencia de la República. e-SIGEF - MEF- Ejecución Presupuestaria. Corte 30 de septiembre de 2025.

Elaboración: Dirección de Seguimiento a la Inversión – Presidencia de la República.

El Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca reporta las siguientes acciones:

Proyecto de Riego Integral Tecnificado Parcelario – PRITEP

La entidad informó que, durante el tercer trimestre de 2025, el proyecto registró un avance de 0,03 hectáreas beneficiando a 21 personas. Debido a la suspensión de las obras por condiciones climáticas, no fue posible alcanzar la meta establecida para el período.

Proyecto Desarrollo Sostenible y Apropiado en Territorios Rurales -DESATAR

La entidad informó que, durante el tercer trimestre de 2025, el proyecto capacitó a 47 funcionarios en temas de género, seguimiento y evaluación, así como a 1.689 pequeños productores rurales en temas de género. Además, se identificó a 113 mujeres y jóvenes que ocupan cargos directivos en las Organizaciones de Pequeños Productores (OPP) correspondientes al pilotaje que desarrolla el proyecto.

Proyecto para la Ejecución del Sistema de Aseguramiento Agropecuario Subvencionado, con Énfasis en Pequeños y Medianos Productores Vulnerables a los Efectos del Cambio Climático

La entidad informó que, durante el tercer trimestre de 2025, el proyecto capacitó a 10.795 productores sobre el funcionamiento del sistema de aseguramiento agrícola. Asimismo, 2.162 pequeños y medianos productores fueron beneficiados con subvenciones focalizadas, y se aseguraron un total de 2.891,30 hectáreas agrícolas correspondientes a los rubros priorizados.

Proyecto Integral de Diversificación Agroproductiva y Reconversión Agrícola

La entidad informó que, durante el tercer trimestre de 2025, el proyecto entregó 145 kits de herramientas y 861 kits de herramientas manuales y motorizadas en el marco del contrato Nro. SIE-MAG-2024-008, beneficiando a 3.080 productores.

Adicionalmente, se distribuyó equipamiento menor a 41 organizaciones, 46 paquetes sostenibles y 12.461 paquetes tecnológicos, cubriendo un número equivalente de hectáreas, así como 52 Unidades Móviles destinadas a apoyar las actividades del proyecto.

Regularización de tierras rurales y territorios ancestrales

La entidad informó que, durante el tercer trimestre de 2025, el proyecto entregó 3.659 títulos de propiedad perfeccionados por los registradores de la propiedad a nivel nacional.

Adicionalmente, se elaboraron 4.397 providencias de adjudicación correspondientes a predios de pequeños y medianos productores.

Proyecto de Fomento a la Inversión Agropecuaria

La entidad informó que la meta total del proyecto para el 2025 es beneficiar a 67.735 productores, meta que fue cumplida y superada durante los años 2022 y 2023, alcanzando un total de 79.718 beneficiarios.

Mediante reprogramación, se establecieron metas de cero para los años 2024 y 2025.

Actualmente, el proyecto se encuentra ejecutando las transferencias trimestrales de la subvención correspondientes a los intereses de los créditos otorgados a los 79.718 beneficiarios.

Fortalecimiento integral y sostenible del sector acuícola y pesquero

La entidad informó que, durante el tercer trimestre de 2025, el proyecto realizó 356 inspecciones en los sectores acuícola y pesquero.

En relación con la adquisición de 600 motores fuera de borda para el sector pesquero, estos fueron recibidos a conformidad, beneficiando a 600 productores pesqueros.

Ministerio de Producción, Comercio Exterior, Inversiones y Pesca

El Ministerio de Producción, Comercio Exterior, Inversiones y Pesca registró un monto codificado de inversión de USD 17,72 millones y un devengado de USD 15,52 millones, lo que representa una ejecución presupuestaria del 87,57%. Cabe indicar que todo el presupuesto codificado cuenta con fuente de financiamiento y no se cuenta con anticipos.

En relación con el cumplimiento físico, la entidad reportó 6 proyectos alineados al Objetivo 5, de los cuales todos cuentan con programación de metas físicas al tercer trimestre de 2025. Entre estos, 3 alcanzaron el 100,00% de cumplimiento.

Tabla 40. Avance Físico de Proyectos de Inversión al Tercer Trimestre Ministerio de Producción, Comercio Exterior e Inversiones – Objetivo 5

Nombre del proyecto	Programación metas físicas (a)	Ejecución metas físicas (b)	Cumplimiento metas físicas c (b/a)	Codificado (MM USD) (d)	Devengado (MM USD) (e)	Ejecución presupuestaria a 2025 f(e/d)	Devengado + anticipos /codificado con fuente (g)
Sistema Nacional de Atracción y Facilitación de Inversiones	1,02%	1,02%	● 100,00%	0,78	0,25	31,95%	31,95%
Fomento a la inversión productiva de las microempresas	4,00%	4,00%	● 100,00%	5,72	5,69	99,61%	99,61%
Fortalecimiento de las capacidades de las unidades productivas rurales en el territorio focalizado - EMPRENDER	9,84%	13,95%	● 100,00%	0,65	0,14	21,37%	21,37%
Agenda de competitividad para la transformación productiva, fomento de la calidad y el emprendimiento en Ecuador	7,00%	6,86%	● 98,00%	0,75	0,49	64,83%	64,83%
Fomento a la inversión productiva de las microempresas turísticas	15,15%	12,21%	● 80,59%	0,64	0,37	57,64%	57,64%
Promoción para la reactivación turística del Ecuador	15,32%	9,82%	● 64,10%	9,17	8,58	93,46%	93,46%
							87,57%

Nota: ● Avance esperado $\geq 100\%$ y $\leq 95\%$ / ● Avance cercano al esperado $> 95\%$ y $\leq 85\%$ / ● Avance menor al esperado $< 85\%$ / ● Proyecto sin programación de metas.

Fuente: SIPEIP – Presidencia de la República. e-SIGEF - MEF- Ejecución Presupuestaria. Corte 30 de septiembre de 2025.

Elaboración: Dirección de Seguimiento a la Inversión – Presidencia de la República.

El Ministerio de Producción, Comercio Exterior e Inversiones reporta las siguientes acciones:

Agenda de competitividad para la transformación productiva, fomento de la calidad y el emprendimiento en Ecuador

La entidad informó que el proyecto de inversión se encuentra en ejecución y que, durante el tercer trimestre de 2025, se realizaron 7.076 inspecciones a empresas con productos sujetos a reglamentación técnica. Asimismo, se culminó el proceso de cierre de los nueve convenios correspondientes a las iniciativas clúster generadas y mantenidas, los cuales cuentan con sus respectivas actas de finiquito y comunicados de cierre emitidos por la Dirección de Planificación. En el marco de las ferias MiPymes, se ha beneficiado a 242 emprendedores.

Promoción para la reactivación turística del Ecuador

La entidad informó que el proyecto se encuentra en ejecución y que, durante el tercer trimestre de 2025, se participó en ferias de turismo para promover la promoción turística del “Destino Ecuador”, ante segmentos especializados, como el gastronómico y leisure. El objetivo de estas acciones fue incorporar la oferta turística en los portafolios de agencias de viajes y operadores turísticos (TTOO) en los mercados priorizados de Estados Unidos y Reino Unido, contribuyendo al incremento del flujo de turistas hacia el país.



*Eje Ambiente, Agua, Energía y
Conectividad*



Eje Ambiente, agua, energía y conectividad

Objetivo 6

7.6. OBJETIVO 6: Precautelar el uso sostenible de los recursos naturales, la protección del ambiente, así como la optimización y la eficiencia energética.

Este Objetivo se enmarca en la preservación de los recursos naturales mediante una regulación eficaz, el fortalecimiento institucional y la adopción de tecnologías limpias. Esto permitirá, además de garantizar la sostenibilidad ambiental, mejorar la calidad de vida de la población, impulsar la economía local e incrementar la resiliencia frente a los efectos del cambio climático.

Con base en la gestión desarrollada por el Estado a través de la implementación de sus planes institucionales, estudios, programas y proyectos durante el tercer trimestre del 2025, a continuación, se detallan los resultados alineados a este Objetivo:

7.6.1. Gestión Presupuestaria

Para el cumplimiento de las metas del Objetivo 6, se devengó un total de USD 43,63 millones en el tercer trimestre del 2025, de los cuales, el 31,93% corresponde a Gasto Permanente con un monto devengado de USD 13,93 millones; y, la diferencia corresponde al **Gasto No Permanente** vinculado a estudios, programas y proyectos de inversión, de diferentes entidades, con un monto devengado de USD 29,70 millones.

Por su parte, la ejecución presupuestaria del **Gasto No Permanente** destinado al Objetivo 6, considerando el monto devengado más anticipos entregados en el periodo (USD 31,51 millones), frente al monto codificado con fuente de financiamiento (USD 275,01 millones), alcanza un nivel de ejecución del 11,46%.

Ilustración 38. Gasto Permanente y No Permanente en 2025 – Objetivo 6
(millones de dólares)



Fuente: SIPeIP, Presidencia de la República. e-SIGEF, MEF- Ejecución Presupuestaria. Corte 30 de septiembre de 2025.

Elaboración: Dirección de Seguimiento a la Planificación y Política Pública y Dirección de Seguimiento a la Inversión – Presidencia de la República.

A continuación, se detallan los montos correspondientes al **Gasto Permanente** y **Gasto No Permanente** que fueron ejecutados, alineados al Objetivo 6, en función de los gabinetes sectoriales establecidos para la gestión institucional.

En **Gasto Permanente**, el Gabinete Sectorial de Infraestructura, Energía y Medio Ambiente ejecutó en este Objetivo un monto devengado de USD 13,93 millones, conforme la siguiente ilustración:

Ilustración 39. Gasto Permanente por Gabinete Sectorial en 2025 – Objetivo 6
(millones de dólares)



Fuente: Base de datos e-SIGEF, Ejecución Presupuestaria Consolidada – MEF corte al 30 de septiembre de 2025.

Elaboración: Dirección de Seguimiento a la Planificación y Política Pública – Presidencia de la República.

En relación al **Gasto Permanente** alineado al Objetivo 6, se identifica que se encuentran alineadas 8 entidades, con un presupuesto codificado de USD 27,63 millones y un monto devengado de USD 13,93 millones, lo que representa una ejecución presupuestaria del 50,42%. A continuación, se detalla la ejecución presupuestaria correspondiente al tercer trimestre por institución:

Tabla 41. Ejecución presupuestaria de las entidades alineadas al Objetivo 6

Gabinete Sectorial	Entidad	Codificado (MM USD)	Devengado (MM USD)	Ejecución (%)
Gabinete Sectorial de Infraestructura, Energía y Medio Ambiente	Agencia de Regulación y Control del Agua	1,20	0,87	72,47%
	Instituto de Investigación Geológico y Energético	1,97	1,39	70,88%
	Parque Nacional Galápagos	2,21	1,37	62,17%
	Agencia de Regulación y Control de la Bioseguridad y Cuarentena para Galápagos	3,73	2,19	58,74%
	Operador Nacional de Electricidad	7,66	3,81	49,68%
	Instituto Nacional de Biodiversidad	0,00	0,00	45,61%
	Ministerio de Energía y Minas	10,46	4,21	40,26%
	Instituto Nacional de Meteorología E Hidrología	0,40	0,09	21,70%
Total		27,63	13,93	50,42%


Fuente: Base de datos e-SIGEF, Ejecución Presupuestaria Consolidada – MEF corte al 30 de septiembre de 2025. Estado de validación de planes institucionales tercer trimestre 2025, corte 30 de septiembre de 2025.

Elaboración: Dirección de Seguimiento a la Planificación y Política Pública – Presidencia de la República.

El objetivo 6 relacionado con precautelar el uso sostenible de los recursos naturales, incluye a las instituciones, Ministerio de Energía y Minas y Operador Nacional de Electricidad que concentran el 65,6% del codificado del objetivo, con niveles de ejecución presupuestaria de 40,26% y 49,68% respectivamente.

Por su parte, en lo que respecta al **Gasto No Permanente**, las entidades que conforman el Gabinete Sectorial Institucional ejecutaron USD 26,44 millones, mientras que las entidades sin Gabinete alineados al Objetivo 6 ejecutaron USD 3,25 millones, alineados al Objetivo 6.

Ilustración 40. Gasto No Permanente por Gabinete Sectorial en 2025 (tercer trimestre) – Objetivo 6
(millones de dólares)

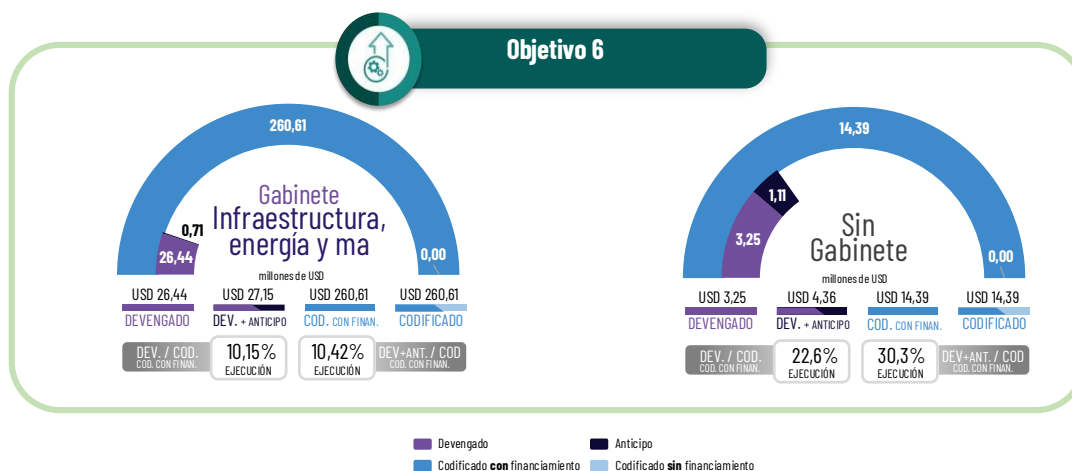

Fuente: SIPeIP, Presidencia de la República. e-SIGEF, MEF- Ejecución Presupuestaria. Corte 30 de septiembre de 2025.
Elaboración: Dirección de Seguimiento a la Inversión – Presidencia de la República.

Considerando el monto devengado más anticipos y el monto codificado con fuente entregados en el periodo, se observa que en el Objetivo 6, la entidad que no forman parte de ningún Gabinete Sectorial presenta una ejecución presupuestaria de 30,30%, correspondiente a 1 proyecto de inversión, mientras que las entidades pertenecientes al Gabinete Sectorial de Infraestructura, Energía y Medio Ambiente alcanzan una ejecución presupuestaria del 10,42%, correspondiente a 32 proyectos de inversión.

Tabla 42. Cumplimiento presupuestario por gabinete sectorial en 2025 – Objetivo 6

Gabinete Sectorial	Número de Entidades	Número de Proyectos	% Ejecución presupuestaria	
			Devengado / Codificado	Devengado más anticipos / Codificado con fuente
Sin Gabinete	1	1	22,60%	30,30%
Gabinete Sectorial de Infraestructura, Energía y Medio Ambiente	4	32	10,15%	10,42%
Total	5	33		

Fuente: SIPeIP – Presidencia de la República. e-SIGEF – MEF– Ejecución Presupuestaria. Corte 30 de septiembre de 2025.
Elaboración: Dirección de Seguimiento a la Inversión – Presidencia de la República.

Para obtener información detallada sobre las entidades, se recomienda revisar el Anexo 2, que contiene la matriz resumen con datos sobre el avance presupuestario y físico.

7.6.2. Avance Físico de la Planificación Institucional

Las 6 entidades que cumplieron con el proceso de registro y la sistematización de su planificación institucional cuentan con indicadores alineados al Objetivo 6, el cual comprende un total de 11 objetivos institucionales y 20 indicadores estratégicos sujetos a seguimiento. De acuerdo con los resultados obtenidos, se identifica que el 90,00% de los indicadores presentan un avance esperado; el 0,00 %, un avance cercano al esperado; y el 10,00%, un avance menor al esperado, conforme al detalle que se presenta a continuación:

Tabla 43. Avance de Indicadores Institucionales – Objetivo 6

Entidad	Número Indicadores	Avance esperado		Avance cercano al esperado		Avance menor a lo esperado	
		Indicadores	%	Indicadores	%	Indicadores	%
Agencia de Regulación y Control de la Bioseguridad y Cuarentena para Galápagos	2	2	100,00%	0	0,00%	0	0,00%
Agencia de Regulación y Control del Agua	3	2	66,67%	0	0,00%	1	33,33%
Operador Nacional de Electricidad	8	8	100,00%	0	0,00%	0	0,00%
Instituto Nacional de Meteorología e Hidrología	4	4	100,00%	0	0,00%	0	0,00%
Instituto Nacional De Biodiversidad	1	1	100,00%	0	0,00%	0	0,00%
Ministerio de Energía y Minas	2	1	50,00%	0	0,00%	1	50,00%
Total	20	18	90,00%	0	0,00%	2	10,00%

Fuente: SIPeIP- GPR corte 30 de septiembre de 2025.

Elaboración: Dirección de Seguimiento a la Planificación y Política Pública – Presidencia de la República.

Principales Logros

Agencia de Regulación y Control de la Bioseguridad y Cuarentena para Galápagos

- 11,69% se alcanzó como índice de ingreso de especies introductorias a las Islas Galápagos; resultado de los esfuerzos implementados en las barreras cuarentenarias. Este índice indica que el riesgo de introducción intencional o accidental de especies exógenas en las Islas Galápagos es bajo y manejable. Se continuará trabajando durante el cuarto trimestre de 2025 para mantener este nivel, beneficiando a la población de las cuatro islas pobladas: San Cristóbal, Santa Cruz, Floreana e Isabela.

Instituto Ecuatoriano de Meteorología e Hidrología

- 7 instituciones públicas, privadas y de educación superior fueron abordadas para la firma de convenios marco y/o específicos, con la finalidad de integrar redes externas al banco nacional de información hidrometeorológica a escala nacional.
- Informe de gestión de calidad sobre pronósticos y advertencias fue elaborado, logrando una mejora en la calidad de los productos y servicios hidrometeorológicos con un nivel de precisión alineado a estándares de la Organización Meteorológica Mundial (OMM).

Operador Nacional de Electricidad

- 17 requerimientos fueron atendidos y se realizó el análisis de eventos oscilatorios en la interconexión Ecuador-Colombia, registrados por el sistema WAMS.
- Pruebas de simulación fueron ejecutadas para verificar la fiabilidad de la base de datos y se optimizó el procedimiento de envío de información al sistema de control de supervisión y adquisición de datos/sistema de gestión de energía (SCADA/EMS).
- 1.175 solicitudes de autorización de mantenimiento fueron atendidas en los elementos del Sistema Nacional Interconectado.
- 5.110,1 megavatios (MW) de demanda máxima fue abastecida, con una generación total de 8.338,4 gigavatio-hora (GWh) y una participación de energía renovable del 87,40% (principalmente hidroeléctrica).

- 92,00% de cumplimiento fue alcanzado en la verificación de información operativa y mediciones comerciales en punto de frontera, con 4 observaciones atribuibles al Operador Nacional de Electricidad CENACE.

7.6.3. Avance Físico Proyectos de Inversión


El Objetivo 6 cuenta con 33 proyectos de inversión ejecutados por 5 entidades. El monto codificado total asciende a USD 275,01 millones, con un devengado de USD 29,70 millones, lo que representa una ejecución presupuestaria del 10,80%. Considerando anticipos, la ejecución asciende al 11,46%, con un monto devengado más anticipo de USD 31,51 millones frente al codificado con fuente.

El Ministerio de Ambiente y Energía concentra el 87,36% del presupuesto codificado (USD 240,24 millones) y ejecuta el 72,73% de los proyectos (24 de 33).

En cuanto al avance físico, este objetivo registra un Avance Físico promedio en el año del 40,18% respecto de las metas anuales programadas, con un nivel promedio de cumplimiento del 80,32% al tercer trimestre, lo que indica un “*avance menor al esperado*”.

Cabe indicar que el Ministerio de Ambiente y Energía registra 1 proyecto que alcanzó el 100,00% de cumplimiento de sus metas físicas programadas al tercer trimestre.

Ilustración 41. Gasto No Permanente, avance físico promedio y avance presupuestario- Objetivo 6

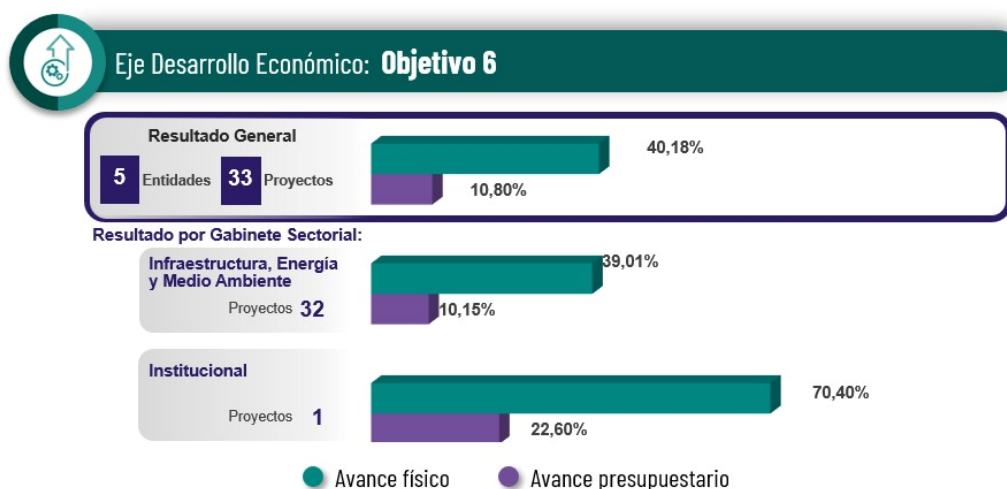

Fuente: SIPeIP, Presidencia de la República. e-SIGEF, MEF- Ejecución Presupuestaria. Corte 30 de septiembre 2025.

Elaboración: Dirección de Seguimiento a la Inversión – Presidencia de la República.

A continuación, se detalla el cumplimiento físico de los proyectos de inversión por gabinetes sectoriales relacionados con el Objetivo 6, lo que permite identificar los niveles de ejecución alcanzados por cada sector en relación con las metas físicas programadas.

Tabla 44. Cumplimiento físico por gabinete – Objetivo 6

Gabinete Sectorial	Número de Entidades	Número de Proyectos	Número de proyectos por nivel de cumplimiento			
Infraestructura, Energía y Medio Ambiente	4	32	● 13	● 1	● 6	● 12
Sin Gabinete	1	1	● 0	● 1	● 0	● 0
Total	5	33	13	2	6	12

Nota: ● Avance esperado $\geq 100\%$ y $\leq 95\%$ / ● Avance cercano al esperado $> 95\%$ y $\leq 85\%$ / ● Avance menor al esperado $< 85\%$ / ● Proyecto sin programación de metas.

Fuente: SIPeIP, Presidencia de la República. e-SIGEF, MEF- Ejecución Presupuestaria. Corte 30 de septiembre de 2025.

Elaboración: Dirección de Seguimiento a la Inversión – Presidencia de la República.

Para conocer más información acerca de las entidades, por favor revisar el Anexo 2, que contiene la matriz resumen con información de avance presupuestario y físico.

A continuación, se presenta la información de ejecución de los principales proyectos de inversión que contribuyen a este objetivo:

Causas y Logros

Ministerio de Ambiente y Energía

El Ministerio de Ambiente y Energía contó, dentro del Objetivo 6, con un monto codificado de inversión de USD 240,24 millones y un monto devengado de USD 23,05 millones, lo que representa una ejecución presupuestaria del 9,59%. Al considerar el devengado más anticipos en relación con el codificado con fuente, la ejecución alcanza el 9,82%.

En relación con el cumplimiento físico, la entidad reportó 24 proyectos alineados al Objetivo 6, de los cuales 15 cuentan con programación de metas físicas al tercer trimestre de 2025. Entre estos, 9 alcanzaron el 100,00% de cumplimiento, mientras que 1 no presenta avance físico.

Adicionalmente, se identificó 3 proyectos alineados al mismo objetivo que, si bien no cuentan con programación ni ejecución de metas físicas al tercer trimestre de 2025, registran ejecución presupuestaria (USD 3,31 millones) durante el período analizado.

Tabla 45. Avance Físico de Proyectos de Inversión al Tercer Trimestre Ministerio de Ambiente y Energía – Objetivo 6

Nombre del proyecto	Programación metas físicas (a)	Ejecución metas físicas (b)	Cumplimiento metas físicas c(b/a)	Codificado (MM USD) (d)	Devengado (MM USD) (e)	Ejecución presupuestaria 2025 f (d/e)	Devengado + anticipos /codificado con fuente (g)
Programa de modernización y renovación del sistema eléctrico ecuatoriano	21,17%	21,58%	● 100,00%	7,22	0,04	0,59%	4,75%
Proyecto para la sustitución de acondicionadores de aire de consumo energético ineficiente en la Provincia de Galápagos	3,34%	3,34%	● 100,00%	0,14	0,05	33,40%	33,40%
Programa de reforzamiento del Sistema Nacional de	0,93%	0,93%	● 100,00%	33,22	1,20	3,60%	3,60%

Nombre del proyecto	Programación metas físicas (a)	Ejecución metas físicas (b)	Cumplimiento metas físicas c(b/a)	Codificado (MM USD) (d)	Devengado (MM USD) (e)	Ejecución presupuestaria 2025 f (d/e)	Devengado + anticipos /codificado con fuente (g)
Transmisión para el sector acuícola							
Programa de transmisión 2012-2022	2,07%	2,07%	● 100,00%	6,65	6,54	98,35%	98,35%
Electrificación rural y urbano marginal, FERUM Integrado	0,05%	0,05%	● 100,00%	1,67	1,14	68,25%	68,25%
Proyecto de educación ambiental para promover la economía circular en los hogares "Mi Barrio Verde"	10,37%	10,37%	● 100,00%	0,36	0,24	65,61%	65,61%
Proyecto nacional de restauración del paisaje	15,00%	15,00%	● 100,00%	0,77	0,45	59,17%	59,17%
Sistema Nacional de Control Forestal y Vida Silvestre	18,72%	19,27%	● 100,00%	1,77	1,17	66,20%	66,20%
Fomento a la Gestión de Agua Potable, Saneamiento, Riego y Drenaje - FOGAPRYD	0,29%	0,40%	● 100,00%	0,91	0,38	42,10%	42,10%
Plan de obras para la prevención y mitigación de inundaciones en el Cantón Chone, Provincia de Manabí	47,17%	46,86%	● 99,34%	0,09	0,05	62,30%	62,30%
Programa de Reparación Ambiental y Social - PRAS	62,05%	60,91%	● 98,16%	1,19	0,76	63,78%	63,78%
Proyecto Socio Bosque II	17,30%	16,15%	● 93,35%	4,54	2,55	56,16%	56,16%
Gestión de residuos sólidos y economía circular inclusiva	5,78%	3,85%	● 66,61%	0,50	0,32	64,00%	64,00%
PROMADEC III	16,87%	8,99%	● 53,29%	0,39	0,26	67,40%	67,40%
Plan de mejoramiento de los sistemas de distribución de energía eléctrica PMD-2011	0,75%	0,00%	● 0,00%	8,84	4,58	51,81%	51,81%
Programa de reposición y ampliación de instalaciones del Sistema Nacional de Transmisión	0,00%	0,00%	● -	2,51	0,00	0,00%	-
Programa de gestión sostenible del sector estratégico de energía y recursos naturales no renovables e infraestructura asociada	0,00%	0,00%	● -	19,92	3,09	15,50%	16,77%
Programa de reforzamiento de redes de distribución	0,00%	0,00%	● -	12,26	0,00	0,00%	-

Nombre del proyecto	Programación metas físicas (a)	Ejecución metas físicas (b)	Cumplimiento metas físicas c(b/a)	Codificado (MM USD) (d)	Devengado (MM USD) (e)	Ejecución presupuestaria 2025 f (d/e)	Devengado + anticipos /codificado con fuente (g)
eléctrica para el sector acuícola							
Proyecto Eficiencia Energetica Para La Groindustria En El Ecuador	0,00%	0,00%	● -	1,19	0,00	0,00%	-
Programa de adquisición implementación y puesta en servicio de generación adicional emergente para el SIN	0,00%	0,00%	● -	0,00	0,00	-	-
Soluciones integrales de agua potable y saneamiento - Programa Canje de Deuda Ecuador España	0,00%	0,00%	● -	0,17	0,00	0,00%	-
Apoyo al sistema nacional de áreas protegidas	0,00%	0,00%	● -	0,31	0,19	63,04%	63,04%
Gestión integral de desechos sólidos	0,00%	0,00%	● -	0,02	0,02	100,00%	100,00%
Programa de generación adicional para aseguramiento de soberanía energética ecuatoriana	0,00%	0,00%	● -	135,60	0,00	0,00%	-
							9,82%

Nota: ● Avance esperado $\geq 100\%$ y $\leq 95\%$ / ● Avance cercano al esperado $> 95\%$ y $\leq 85\%$ / ● Avance menor al esperado $< 85\%$ / ● Proyecto sin programación de metas.

Fuente: SIPeIP – Presidencia de la República. e-SIGEF - MEF- Ejecución Presupuestaria. Corte 30 de septiembre de 2025.

Elaboración: Dirección de Seguimiento a la Inversión – Presidencia de la República.

El Ministerio de Ambiente y Energía reporta las siguientes acciones:

Programa de transmisión 2012-2022

La entidad informó que el Componente 4 del proyecto, que comprende la construcción de las líneas de transmisión para la conexión de las subestaciones Las Orquídeas y La Avanzada, presenta un avance global del 73,57% al corte de agosto de 2025.

Además, CELEC EP, realizó la entrega del segundo transformador de la subestación Posorja; sin embargo, la instalación de los capacitores aún está pendiente, lo que impide la conclusión de la obra.

Electrificación rural y urbano marginal, FERUM Integrado

La entidad informó que, mediante el seguimiento a la ejecución de los proyectos incluidos en el programa FERUM, se logró electrificar un total de 3.166 viviendas durante el 2025.

Como nudo crítico reportado por la entidad, el cambio de autoridades en las Empresas Eléctricas de Distribución y en las Unidades de Negocio de CNEL EP ha provocado retrasos en los procesos de contratación y en la ejecución de los proyectos.

Proyecto para la sustitución de acondicionadores de aire de consumo energético ineficiente en la Provincia de Galápagos

La entidad reportó que, debido a la no aprobación de la extensión del cronograma valorado, en abril de 2025 se sostuvo una reunión con el ente rector de la planificación nacional, en la cual se recomendó analizar la baja del proyecto vigente y postular uno nuevo.

Tras diversas gestiones, el 24 de septiembre de 2025, el Ministerio de Economía y Finanzas, emitió un criterio favorable de disponibilidad presupuestaria para el Proyecto RETEG, el cual fue postulado el 15 de octubre de 2025. Una vez aprobado el dictamen de prioridad, se procederá a la baja del proyecto PAAG.

Programa de Reparación Ambiental y Social – PRAS

La entidad informó que se elaboraron ocho informes técnicos relacionados con la implementación del Plan Nacional de Reparación Integral por Pasivos Ambientales, en este sentido La entidad elaboró el informe Nro. PRAS-ATAPNY-2025-038-T, que detalla las actividades de acompañamiento al desbroce realizadas en el Parque Nacional Yasuní.

Adicionalmente, se llevaron a cabo gestiones para la inscripción de predios expropiados en las localidades de Paute, Gualaceo y Cuenca.

Sistema Nacional de Control Forestal y Vida Silvestre

La entidad informó que, durante el tercer trimestre de 2025, el Proyecto Sistema Nacional de Control Forestal y Vida Silvestre logró avances significativos en el control y conservación de los recursos naturales. Durante este período, se atendieron 164 alertas satelitales, se realizaron 100 rescates con la recuperación de 112 individuos y se revisaron 539.488,65 m³ de madera, superando la meta planificada.

No obstante, se presentaron limitaciones que afectaron el cumplimiento total de los objetivos, destacando la falta de apoyo constante por parte de la UPMA y las Fuerzas Armadas.



Eje Ambiente, agua, energía y conectividad

Objetivo 7

7.7. OBJETIVO 7: Impulsar el desarrollo de infraestructuras sostenibles y resilientes; y de la conectividad física y digital, que brinde condiciones de crecimiento y desarrollo económico.

Este Objetivo busca fortalecer la infraestructura nacional mediante la mitigación de riesgos operativos y la modernización de los sistemas de transporte y conectividad, a través de la incorporación de tecnologías sostenibles, la promoción del transporte multimodal y el impulso de alianzas público-privadas, con el fin de garantizar una infraestructura resiliente, eficiente y alineada con los principios de sostenibilidad, inclusión y competitividad.


Con base en la gestión desarrollada por el Estado a través de la implementación de sus planes institucionales, estudios, programas y proyectos durante el tercer trimestre del 2025, a continuación, se detallan los resultados alineados a este Objetivo:

7.7.1. Gestión Presupuestaria

Para el cumplimiento de las metas del Objetivo 7, se devengó un total de USD 314,07 millones en el tercer trimestre del 2025, de los cuales, el 65,33% corresponde a **Gasto Permanente** con un monto devengado de USD 205,19 millones; y, la diferencia corresponde al **Gasto No Permanente** vinculado a estudios, programas y proyectos de inversión, de diferentes entidades, con un monto devengado de USD 108,88 millones.

Por su parte, la ejecución presupuestaria del **Gasto No Permanente** destinado al Objetivo 7, considerando el monto devengado más anticipos entregados en el periodo (USD 152,52 millones), frente al monto codificado con fuente de financiamiento (USD 304,46 millones), alcanza un nivel de ejecución del 50,10%.

Ilustración 42. Gasto Permanente y No Permanente en 2025 – Objetivo 7
(millones de dólares)

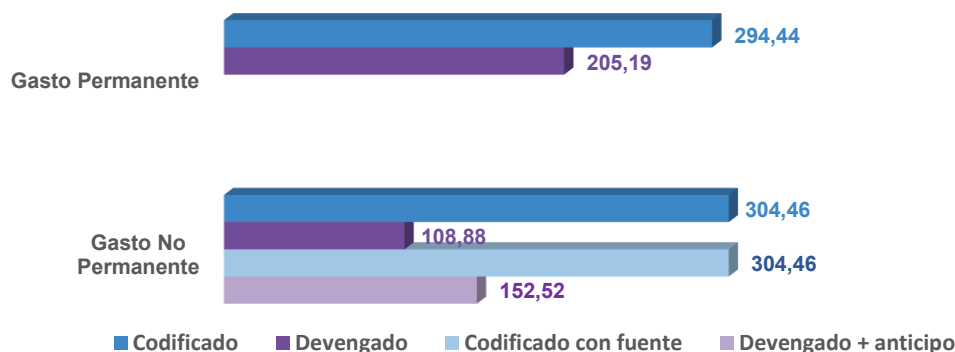


Fuente: Base de datos e-SIGEF, Ejecución Presupuestaria Consolidada – MEF corte al 30 de septiembre de 2025.

Elaboración: Dirección de Seguimiento a la Planificación y Política Pública – Presidencia de la República.

A continuación, se detallan los montos correspondientes al **Gasto Permanente** y **Gasto No Permanente** que fueron ejecutados, alineados al Objetivo 7, en función de los gabinetes sectoriales establecidos para la gestión institucional.

En **Gasto Permanente**, el Gabinete Sectorial de Infraestructura, Energía y Medio Ambiente es el que concentra los recursos en este objetivo con un monto devengado de USD 200,39 millones, conforme la siguiente ilustración:

Ilustración 43. Gasto Permanente por Gabinete Sectorial en 2025 – Objetivo 7
(millones de dólares)



Fuente: Base de datos e-SIGEF, Ejecución Presupuestaria Consolidada – MEF corte al 30 de septiembre de 2025.
Elaboración: Dirección de Seguimiento a la Planificación y Política Pública Presidencia de la República.

A continuación, se detallan los montos correspondientes a **Gasto Permanente** y **Gasto No Permanente** que fueron ejecutados, alineados al Objetivo 7, en función de los gabinetes sectoriales establecidos para la gestión institucional.

En relación al **Gasto Permanente** alineado al Objetivo 7, se identifica que se encuentran alineadas 10 entidades, con un presupuesto codificado de USD 294,44 millones y un monto devengado de USD 205,19 millones, lo que representa una ejecución presupuestaria del 69,69%. A continuación, se detalla la ejecución presupuestaria correspondiente al tercer trimestre por institución:

Tabla 46. Ejecución presupuestaria de las entidades alineadas al Objetivo 7


Gabinete Sectorial	Entidad	Codificado (MM USD)	Devengado (MM USD)	Ejecución (%)
Gabinete Sectorial de Infraestructura, Energía y Medio Ambiente	Servicio Público para Pago de Accidentes de Tránsito	84,49	75,79	89,70%
	Autoridad Portuaria de Manta	1,42	1,26	88,55%
	Ministerio de Infraestructura y Transporte	5,60	3,96	70,74%
	Autoridad Portuaria de Puerto Bolívar	5,83	3,98	68,30%
	Comisión de Transito del Ecuador	141,93	94,60	66,65%
	Dirección General de Aviación Civil	21,42	14,21	66,34%
	Autoridad Portuaria de Esmeraldas	3,09	1,96	63,36%
	Agencia de Regulación y Control de las Telecomunicaciones	23,83	4,63	19,44%
Gabinete Sectorial de lo Social	Parque Nacional Galápagos	0,00	0,00	39,82%
	Operador Nacional de Electricidad	0,00	0,00	28,61%
Total		294,44	205,19	69,69%

Fuente: Base de datos e-SIGEF, Ejecución Presupuestaria Consolidada – MEF corte al 30 de septiembre de 2025. Estado de validación de planes institucionales tercer trimestre 2025, corte 30 de septiembre de 2025.
Elaboración: Dirección de Seguimiento a la Planificación y Política Pública – Presidencia de la República.

El objetivo 7 relacionado con Impulsar el desarrollo de infraestructuras sostenibles y resilientes, incluye a las instituciones, Servicio Público para Pago de Accidentes de Tránsito y Comisión de Tránsito del Ecuador que concentran el 76,9% del codificado del objetivo, con niveles de ejecución presupuestaria de 89,70% y 66,65% respectivamente.

Por su parte, en lo que respecta al **Gasto No Permanente**, las entidades que conforman el Gabinete Sectorial de Infraestructura, Energía y Medio Ambiente ejecutaron USD 101,35 millones, mientras que las entidades pertenecientes al Gabinete Sectorial de lo Social ejecutaron USD 7,53 millones, alineados al Objetivo 7.

Ilustración 44. Gasto No Permanente por Gabinete Sectorial en 2025 (tercer trimestre) – Objetivo 7 (millones de dólares)

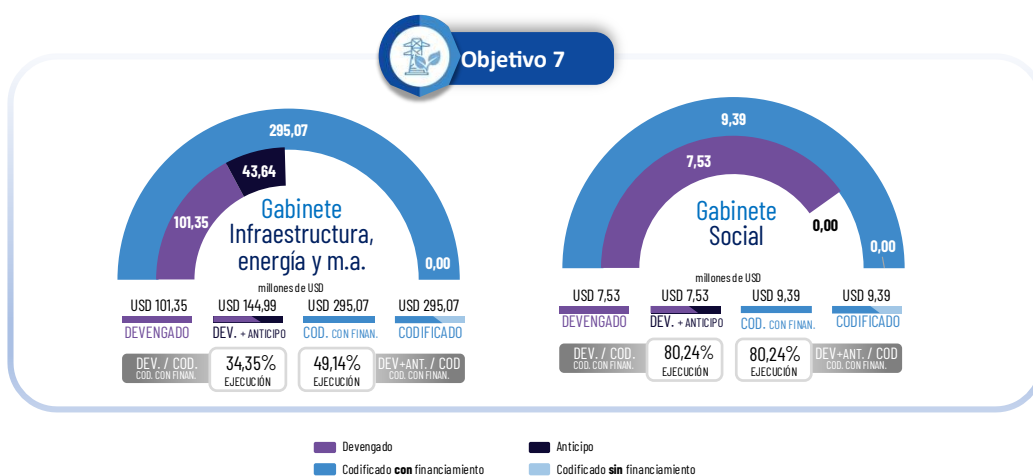

Fuente: SIPeIP, Presidencia de la República. e-SIGEF, MEF- Ejecución Presupuestaria. Corte 30 de septiembre de 2025.
Elaboración: Dirección de Seguimiento a la Inversión – Presidencia de la República.

Considerando el monto devengado más anticipos y el monto codificado con fuente entregados en el periodo del tercer trimestre de 2025, se identifica que en el Objetivo 7, la entidad del Gabinete Sectorial de lo Social alcanza una ejecución presupuestaria del 80,24%, correspondiente a 1 proyecto de inversión. Las entidades que pertenecen al Gabinete Sectorial de Infraestructura, Energía y Medio Ambiente alcanzan una ejecución presupuestaria del 49,14%, correspondiente a 40 proyectos de inversión.

Tabla 47. Cumplimiento presupuestario por gabinete sectorial en 2025 – Objetivo 7

Gabinete Sectorial	Número de Entidades	Número de Proyectos	% Ejecución presupuestaria	
			Devengado / Codificado	Devengado más anticipos / Codificado con fuente
Social	1	1	80,24%	80,24%
Infraestructura, Energía y Medio Ambiente	3	40	34,35%	49,14%
Total	4	41		

Fuente: SIPeIP – Presidencia de la República. e-SIGEF – MEF– Ejecución Presupuestaria. Corte 30 de septiembre de 2025.
Elaboración: Dirección de Seguimiento a la Inversión – Presidencia de la República.

Para obtener información detallada sobre las entidades, se recomienda revisar el Anexo 2, que contiene la matriz resumen con datos sobre el avance presupuestario y físico.

7.7.2. Avance Físico de la Planificación Institucional

Las 9 entidades que cumplieron con el proceso de registro y la sistematización de su planificación institucional cuentan con indicadores alineados al Objetivo 7, el cual comprende un total de 25 objetivos institucionales y 44 indicadores estratégicos sujetos a seguimiento. De acuerdo con los resultados obtenidos, se identifica que el 86,36% de los indicadores presentan un avance esperado; el 4,55%, un avance cercano al esperado; y el 9,09%, un avance menor al esperado, conforme al detalle que se presenta a continuación:

Tabla 48. Avance de Indicadores Institucionales – Objetivo 7

Entidad	Número Indicadores	Avance esperado		Avance cercano al esperado		Avance menor a lo esperado	
		Indicadores	%	Indicadores	%	Indicadores	%
Autoridad Portuaria de Guayaquil	5	3	60,00%	0	0,00%	2	40,00%
Autoridad Portuaria de Manta	1	1	100,00%	0	0,00%	0	0,00%
Autoridad Portuaria de Puerto Bolívar	10	9	90,00%	0	0,00%	1	10,00%
Comisión de Tránsito del Ecuador	7	5	71,43%	2	28,57%	0	0,00%
Dirección General de Aviación Civil	5	5	100,00%	0	0,00%	0	0,00%
Dirección Nacional de Registros Públicos	4	4	100,00%	0	0,00%	0	0,00%
Ministerio de Infraestructura y Transporte	7	7	100,00%	0	0,00%	0	0,00%
Ministerio de Telecomunicaciones y de la Sociedad de la Información	1	1	100,00%	0	0,00%	0	0,00%
Servicio Público para pago de Accidentes de Tránsito	4	3	75,00%	0	0,00%	1	25,00%
Total	44	38	86,36%	2	4,55%	4	9,09%

Nota: La entidad Autoridad Portuaria de Esmeraldas, no registro resultados de sus indicadores al 15 de octubre de 2025, se emitió oficio de incumplimiento Nro. Oficio Nro. PR-SSDS-2025-0031-O, de 22 de octubre de 2025.

Fuente: SiPeIP- GPR corte 30 de septiembre de 2025.

Elaboración: Dirección de Seguimiento a la Planificación y Política Pública – Presidencia de la República.

Principales Logros

Ministerio de Infraestructura y Transporte

- 100% de supervisión fue realizada a los corredores delegados al sector privado: Rumichaca - Riobamba, Río 7 - Huaquillas, Guayas - Santa Elena, Santo Domingo - Buena Fe y Naranjal – Tenguel.
- 10 visitas técnicas fueron realizadas a proyectos a escala nacional en diversas provincias: Carchi, Sucumbíos, Orellana, Napo, Manabí, Guayas, Zamora Chinchipe y Azuay.
- 32 rutas internacionales hacia 18 destinos fueron mantenidas en operación, resultado de la política de Cielos Abiertos y negociaciones aéreas con varios países: Kuwait, Hong Kong, Uruguay, El Salvador, Azerbaiyán, Chile y China.
- 75% de avance fue alcanzado en la actualización de la normativa aérea, cumpliendo el 100% de la meta trimestral, mediante la reforma del artículo 59 y la incorporación de una Disposición General Única al Código Aeronáutico.

- 4 inspecciones fueron ejecutadas a buques de transporte marítimo desde Ecuador continental hacia Galápagos: Vertom Thea, Fusión 3, Isabella y RS Pioneer.
- 2 campañas de concientización sobre seguridad vial fueron ejecutadas mediante eventos institucionales e interinstitucionales, incluyendo "Movilidad Incluyente y Segura" y la "Semana de Movilidad Sostenible".
- 2 actas de obra pública fueron suscritas, para la transferencia del Parque Las Vegas en Manabí y la Unidad Educativa del Milenio Mayor (UEM Mayor), Samanes en Guayas.

Autoridad Portuaria de Puerto Bolívar

- La productividad promedio de carga alcanzó 30 contenedores por hora por grúa, superando en un 42,86 % la meta establecida, debido a la adecuada coordinación del personal, la disponibilidad continua de grúas y equipos, y la planificación anticipada de las operaciones por parte del Gestor Privado, coordinando operaciones simultáneas en muelle y patio, en el terminal marítimo de Puerto Bolívar (implícito en la gestión de Yilportecu S. A.).

Agencia Nacional de Regulación y Control del Transporte Terrestre Tránsito y Seguridad Vial

- 33,24% de reducción en el tiempo promedio de atención de los trámites en el período de julio a septiembre 2025, como resultado de las acciones implementadas por las nuevas autoridades mediante la aplicación de nuevas directrices en la distribución y gestión de trámites en la Dirección de Títulos Habilitantes de la ANT a nivel nacional

Autoridad Portuaria de Guayaquil

- No se han reportado retrasos en relación a las maniobras, en el periodo de enero a septiembre de 2025, puesto que el traslado de capitanes prácticos se ha dado con normalidad, dentro de la jurisdicción de Autoridad Portuaria de Guayaquil.
- Se mejoró la infraestructura tecnológica para la labor de los radioperadores en el periodo de enero a septiembre de 2025, mediante las Pruebas de Aceptación del Sitio (SAT) del VTS que están destinadas a demostrar que el equipo y el software cumplen con las especificaciones del proyecto, en cumplimiento del CONVENIO INTERINSTITUCIONAL PARA CUMPLIMIENTO DE LA ENTREGA, INSTALACIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DEL EQUIPO Y SISTEMA PARA EL CONTROL Y GESTIÓN DEL TRÁFICO MARÍTIMO (VTS)", en las instalaciones de Data y Guayaquil de Autoridad Portuaria de Guayaquil.
- 100% atendido todos los incidentes reportados en el área no concesionada durante el tercer trimestre de 2025, para aquello se inició un nuevo proceso de contratación para la prestación del Servicio de Seguridad, que deberá iniciar el 14 de octubre de 2025 con el objeto de precautelar los bienes de la entidad y siniestros que se presenten en las áreas de Autoridad Portuaria de Guayaquil.

Autoridad Portuaria de Manta

- 96% se alcanzó en acciones de gestión ambiental de julio a septiembre de 2025, que incluye monitoreo y seguimiento en manejo de desechos no peligrosos y mitigación de impactos ambientales negativos en el Terminal Pesquero y Cabotaje.

Dirección General de Aviación Civil

- 15 solicitudes de permisos de operación fueron emitidas en cumplimiento del Reglamento de Permisos de Operación para Servicios de Trabajos Aéreos, Actividades Conexas y Servicios Aéreos Privados, a nivel nacional.
- 3.363 certificaciones para el personal de aviación a nivel nacional, hasta la presente fecha, emitidas de las cuales, en el trimestre se emitieron 298.
- 29 cursos de capacitación aeronáutica especializada para el sector aeronáutico realizado a nivel nacional, efectuado por la Escuela de Aviación Civil. Cumpliendo con la meta establecida, las acciones efectuadas fueron: Gestión asignación de presupuesto, contratación de Instructores Técnicos y difusión de los cursos.
- 99,99% de operación normal promedio en los aeropuertos nacionales durante el periodo de julio-septiembre de 2025, a pesar de que existieron cierres de pistas por mantenimiento en varios aeropuertos del país.

Dirección Nacional de Registros Públicos

- 100% de cumplimiento en relación al tiempo que se dispone para realizar la atención de los requerimientos referentes a integración de instituciones al Sistema Nacional de Registro de Datos Públicos (SINARP) y actividad registral.
- 100% de cumplimiento en el servicio Virtual Data Center (VDC), evidenciando la no existencia de intermitencias, que brinda el proveedor de cloud (nube virtual), para lo cual se evalúa el tiempo en que dicha infraestructura se encuentra operando dentro de los parámetros ofrecidos en el contrato para el servicio.

7.7.3. Avance Físico Proyectos de Inversión


El Objetivo 7 cuenta con 41 proyectos de inversión ejecutados por 4 entidades. El monto codificado total asciende a USD 304,46 millones, con un devengado de USD 108,88 millones, lo que representa una ejecución presupuestaria del 35,76%. Considerando anticipos, la ejecución asciende al 50,10%, con un monto devengado más anticipo de USD 152,52 millones frente al codificado con fuente.

El Ministerio de Infraestructura y Transporte concentra el 93,72% del presupuesto codificado (USD 285,34 millones) y ejecuta el 92,68% de los proyectos (38 de 41).

En cuanto al avance físico, este objetivo registra un Avance Físico promedio en el año del 24,38% respecto de las metas anuales programadas, con un nivel promedio de cumplimiento del 47,82% al tercer trimestre, lo que indica un *“avance menor al esperado”*.

Cabe destacar que el Ministerio de Telecomunicaciones y de la Sociedad de la Información alcanzó el 100,00% de cumplimiento de sus metas físicas programadas al tercer trimestre, en este objetivo. Así mismo, el Ministerio de Infraestructura y Transporte, registra 8 proyectos que alcanzaron el 100,00% de cumplimiento de sus metas físicas programadas.

Ilustración 45. Gasto No Permanente, avance físico promedio y avance presupuestario - Objetivo 7

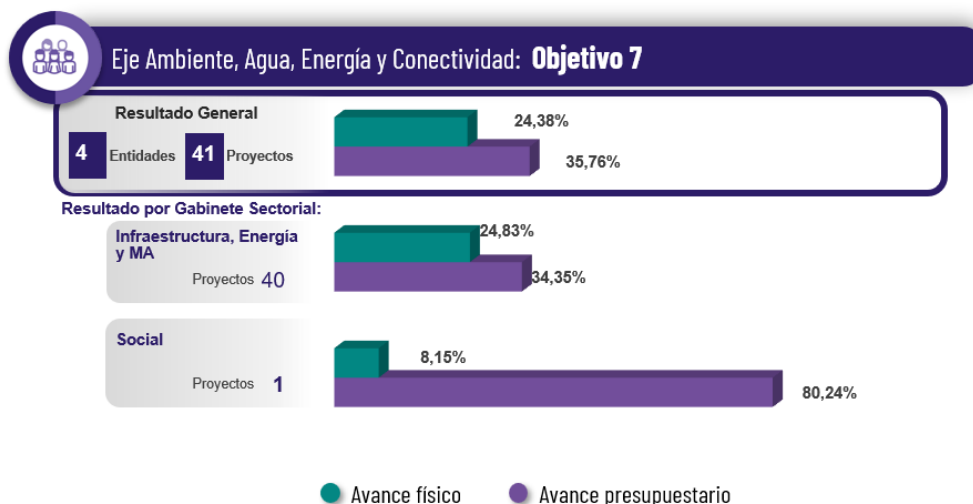

Fuente: SIPeIP, Presidencia de la República. e-SIGEF, MEF- Ejecución Presupuestaria. Corte 30 de septiembre de 2025.

Elaboración: Dirección de Seguimiento a la Inversión – Presidencia de la República.

A continuación, se detalla el cumplimiento físico de los proyectos de inversión por gabinetes sectoriales relacionados con el Objetivo 7, lo que permite identificar los niveles de ejecución alcanzados por cada sector en relación con las metas físicas programadas.

Tabla 49. Cumplimiento físico por gabinete – Objetivo 7

Gabinete Sectorial	Número de Entidades	Número de Proyectos	Número de proyectos por nivel de cumplimiento							
Infraestructura, Energía y Medio Ambiente	3	40	●	8	●	1	●	8	●	23
Social	1	1	●	1	●	0	●	0	●	0
Total	4	41		9		1		8		23

Nota: ● Avance esperado $\geq 100\%$ y $\leq 95\%$ / ● Avance cercano al esperado $> 95\%$ y $\leq 85\%$ / ● Avance menor al esperado $< 85\%$ / ● Proyecto sin programación de metas.

Fuente: SIPeIP, Presidencia de la República. e-SIGEF, MEF- Ejecución Presupuestaria. Corte 30 de septiembre de 2025.

Elaboración: Dirección de Seguimiento a la Inversión – Presidencia de la República.

Para conocer más información acerca de las entidades, por favor revisar el Anexo 2, que contiene la matriz resumen con información de avance presupuestario y físico.

A continuación, se presenta la información de ejecución de los principales proyectos de inversión que contribuyen a este objetivo:

Causas y Logros

Ministerio de Infraestructura y Transporte

El Ministerio de Infraestructura y Transporte registró un monto codificado de inversión de USD 285,34 millones y un devengado de USD 101,35 millones, lo que representa una ejecución presupuestaria del 35,52%. Al considerar el devengado más anticipos en relación con el codificado con fuente, la ejecución alcanza el 50,81%.

En relación con el cumplimiento físico, la entidad reportó 38 proyectos alineados al Objetivo 7, de los cuales 24 cuentan con programación de metas físicas al tercer trimestre de 2025. Entre estos, 8 alcanzaron el 100,00% de cumplimiento, mientras que 7 no presentan avances.

Adicionalmente, se identificó 4 proyectos alineados al mismo objetivo que, si bien no cuentan con programación ni ejecución física, presentan ejecución presupuestaria.

Tabla 50. Avance Físico de Proyectos de Inversión al Tercer Trimestre Ministerio de Infraestructura y Transporte – Objetivo 7

Nombre del proyecto	Programación metas físicas (a)	Ejecución metas físicas (b)	Cumplimiento metas físicas c(b/a)	Codificado (MM USD) (d)	Devengado (MM USD) (e)	Ejecución presupuestaria 2025 f (d/e)	Devengado + anticipos /codificado con fuente (g)
Programa de conservación por niveles de servicio	30,88%	30,88%	● 100,00%	41,37	11,69	28,25%	57,60%
Programa Nacional de Conservación de la Red Vial Estatal	18,25%	18,25%	● 100,00%	29,22	16,30	55,79%	68,99%
Reconstrucción de la carretera Chontaduro - Chumunde de 17.0 Km de longitud ubicada en el cantón Rioverde Provi	17,59%	23,46%	● 100,00%	5,77	0,87	15,07%	76,49%
Rehabilitación del Sistema Hidrosanitario de la Ciudad de Chone Fase 2 - Reconstrucción de colector Magaly Mass	100,00%	100,00%	● 100,00%	1,40	1,40	100,00%	100,00%
Rehabilitación de la Vía RVE E187, Tramo: Bolívar - El Ángel - Mira - Mascarilla ubicada en la Provincia del Carchi, Fase I	3,96%	3,96%	● 100,00%	0,08	0,07	87,68%	87,68%
Construcción de obras de conectividad Vial sobre el Río Upano ubicado en la Carretera Troncal Amazónica E45, tramo Macas a Puyo Provincia de Morona Santiago de 1023,83 m de longitud, incluye la construcción de tres puentes y sus accesos	6,25%	6,25%	● 100,00%	0,21	0,21	100,00%	100,00%
Rehabilitación del corredor arterial E 15. tramo la entrada Manta	23,72%	23,72%	● 100,00%	5,66	4,05	71,59%	71,59%
Rehabilitación funcional del corredor E25 Buena Fe - Jujan construcción de carriles de rebasamiento en el tramo	3,97%	30,05%	● 100,00%	10,79	4,96	45,96%	49,44%
Construcción del puente Lodana en la E-462 B, de la Vía Portoviejo-Santa Ana-Honorato Vásquez, Provincia de Manabí	52,89%	48,08%	● 90,91%	7,47	1,48	19,83%	31,40%

Nombre del proyecto	Programación metas físicas (a)	Ejecución metas físicas (b)	Cumplimiento metas físicas c(b/a)	Codificado (MM USD) (d)	Devengado (MM USD) (e)	Ejecución presupuestari a 2025 f (d/e)	Devengado + anticipos /codificado con fuente (g)
Construcción Del Puente Quimis, Ubicado En El Sector Quimis, De La Carretera Montecristi-Jipijapa, Provincia De Manabí.	72,83%	60,69%	● 83,33%	6,39	0,97	15,21%	27,00%
Construcción de puentes en la Red Vial Estatal de la Vía Coca-Dayuma Provincia de Orellana: Florida, Condor, Indillama, Jandiyacu, Salado Alto, Salado Bajo (Obra y Fiscalización)	55,00%	27,70%	● 50,36%	9,17	0,77	8,44%	38,07%
Mejoramiento del Sistema de agua potable de la ciudad de Muisne	20,00%	10,00%	● 50,00%	5,31	5,31	100,00%	100,00%
Construcción y fiscalización del paso lateral de Guaranda y Ambato	36,66%	15,00%	● 40,92%	9,59	3,09	32,25%	32,25%
Reconstrucción de la infraestructura afectada y desaparecida por el deslave en el sector Tambán, incluyendo la rehabilitación del tramo de la vía chimbo cristal en la abscisa 1+800 y la estabilidad de los taludes	25,00%	3,56%	● 14,24%	2,11	-	0,00%	39,95%
Mejoramiento de 5 carreteras pertenecientes a la Red Vial Provincial del Carchi (Gruta De Fatima - Casa Grande)	50,00%	3,55%	● 7,10%	3,86	3,86	100,00%	100,00%
Construcción de Mercado Municipal de Calceta Cantón Bolívar de la Provincia de Manabí	37,00%	2,00%	● 5,41%	3,64	-	0,00%	37,67%
Proyecto de atención resiliente ante emergencias viales	14,43%	0,16%	● 1,11%	15,09	0,31	2,07%	2,07%
Rectificación y apertura de la vía E29 tramo Las Golondrinas - Saguangal de 62 Km de longitud ubicada en la Provincia de Imbabura incluye la construcción de 10 Puentes	3,32%	0,00%	● 0,00%	8,50	-	0,00%	-
Rehabilitación y mejoramiento de la carretera Vilcabamba	100,00%	0,00%	● 0,00%	0,00	-	0,00%	-

Nombre del proyecto	Programación metas físicas (a)	Ejecución metas físicas (b)	Cumplimiento metas físicas c(b/a)	Codificado (MM USD) (d)	Devengado (MM USD) (e)	Ejecución presupuestari a 2025 f (d/e)	Devengado + anticipos /codificado con fuente (g)
Yagana Palanda Bellavista Zumba La Balsa Tramo Bellavista Zumba La Balsa							
Adecuación logística y montaje del puente prefabricado sobre el Río Blanco	6,61%	0,00%	● 0,00%	0,60	0,60	100,00%	100,00%
MANTENIMIENTO Y REHABILITACION DE LA E15 BOLIVAR DE 4.487 KM UBICADA EN LA PARROQUIA BOLIVAR DEL CANTON MUISNE	22,27%	0,00%	● 0,00%	2,72	2,72	100,00%	100,00%
Rehabilitación de la Vía RVE E-484 Palestina-Macul-Vinces, ubicada en los cantones Palestina y Vinces, Provincia del Guayas y Los Ríos	26,81%	0,00%	● 0,00%	8,80	-	0,00%	41,83%
La rehabilitación de la vía RVE E 485 Baba - Tres Marías, que incluye el paso lateral de Baba y el acceso occidental, está ubicada en el cantón Baba, provincia de Los Ríos.	25,00%	0,00%	● 0,00%	3,29	-	0,00%	-
Construcción del paso lateral Babahoyo - Jujan, hasta el límite provincial con Guayas, que incluye puente de 70 m sobre el río Los Amarillos	25,00%	0,00%	● 0,00%	6,90	6,90	100,00%	100,00%
Proyecto de reconstrucción de obras por el terremoto 2016	0,00%	0,00%	● -	2,48	2,48	100,00%	100,00%
Construcción del nuevo puente Cornelio Davalos Salsipuedes Ubicado en la Carretera Balbanera - Pallatanga - Cumandá	0,00%	0,00%	● -	-	-	-	-
Construcción del distribuidor de tráfico 12 de Octubre en la Autopista Cuenca - Azogues - Biblín, ubicado en la Provincia del Azuay	0,00%	0,00%	● -	11,60	-	0,00%	0,15%
Construcción del distribuidor de tráfico Monay-IESS en la autopista Cuenca-Azogues-Biblín,	0,00%	1,91%	● -	14,73	0,37	2,52%	79,35%

Nombre del proyecto	Programación metas físicas (a)	Ejecución metas físicas (b)	Cumplimiento metas físicas c(b/a)	Codificado (MM USD) (d)	Devengado (MM USD) (e)	Ejecución presupuestari a 2025 f (d/e)	Devengado + anticipos /codificado con fuente (g)
ubicado en la Provincia del Azuay							
Construcción del distribuidor de tráfico Gapal en la autopista Cuenca-Azogues-Biblián, ubicado en la Provincia del Azuay	0,00%	0,00%	● -	8,32	-	0,00%	'-
Rehabilitación en la Vía E15 de los tres sitios críticos denominados Las Piñas ¿ La Resbalosa e ingreso a Santa Rosa, Ubicado en el Cantón Manta Provincia de Manabí.	0,00%	0,00%	● -	0,01	0,01	100,00%	100,00%
Construcción de la Plaza Memorial San Gregorio del Cantón Portoviejo Provincia de Manabí	0,00%	0,00%	● -	8,75	8,75	100,00%	100,00%
Rehabilitación del sistema hidrosanitario de la ciudad de Chone, provincia de Manabí – Fase III, componente agua potable: construcción de la línea de aducción, repotenciación de la planta de tratamiento de agua potable, reconstrucción y ampliación de la red de distribución	0,00%	0,00%	● -	24,16	24,16	100,00%	100,00%
Rehabilitación de los sitios críticos de la Red Vial Estatal E20, Tramo Esmeraldas - Quinindé de la Provincia de Esmeraldas	0,00%	0,00%	● -	3,69	-	0,00%	58,67%
Construcción de Vías de Acceso hacia El Viaducto Sur Provincia del Guayas	0,00%	24,17%	● -	3,47	-	0,00%	-
Gestión y operación de corredores de la red vial estatal a través de delegación	0,00%	0,00%	● -	15,15	-	0,00%	-
Construcción de cuatro puentes: quebrada Honda, Palanda, Agua Dulce y Palanumá y construcción de obras viales en el Tramo Vilcabamba - Bellavista en la Provincia de Zamora Chinchipe	0,00%	0,00%	● -	1,07	-	0,00%	-
Obras viales en la Provincia de Santa	0,00%	0,00%	● -	2,66	-	0,00%	-

Nombre del proyecto	Programación metas físicas (a)	Ejecución metas físicas (b)	Cumplimiento metas físicas c(b/a)	Codificado (MM USD) (d)	Devengado (MM USD) (e)	Ejecución presupuestaria a 2025 f (d/e)	Devengado + anticipos /codificado con fuente (g)
Elena, en el corredor Delegado Chongón - Santa Elena							
Repotenciación de las estaciones de bombeo del sistema sanitario de las parroquias de Atacames y Tonsupa, cantón Atacames, provincia de Esmeraldas	0,00%	0,00%	● -	1,31	-	0,00%	-
							50,81%

Nota: ● Avance esperado $\geq 100\%$ y $\leq 95\%$ / ● Avance cercano al esperado $> 95\%$ y $\leq 85\%$ / ● Avance menor al esperado $< 85\%$ / ● Proyecto sin programación de metas.

Fuente: SIPeLP – Presidencia de la República. e-SIGEF - MEF- Ejecución Presupuestaria. Corte 30 de septiembre de 2025.

Elaboración: Dirección de Seguimiento a la Inversión – Presidencia de la República.

El Ministerio de Infraestructura y Transporte reporta las siguientes acciones:

Programa Nacional de Conservación de la Red Vial Estatal

La entidad informó que se realizó el mantenimiento de la Red Vial Estatal (RVE) mediante la contratación de 166 microempresas de conservación a nivel nacional.

Asimismo, se asignaron recursos para atender la emergencia declarada en la provincia de Napo con fecha 6 de septiembre de 2025.

Durante los meses de julio y agosto, como nudo crítico, la entidad menciona que el Ministerio de Economía y Finanzas bloqueó las reformas presupuestarias, lo que afectó la asignación de recursos planificada hacia las provincias.

Rehabilitación funcional del corredor E25 Buena Fe - Jujan construcción de carriles de rebasamiento en el tramo

La entidad reportó que: "Se ha realizado trabajos de fresado y colocación de carpeta asfáltica en los carriles izquierdo en el tramo 6, desde Jujan hacia Babahoyo, se tiene programa trabajar en el carril derecho en las primeras semanas del mes de octubre 2025; adicional se ha realizada el fresado de la carpeta asfáltica del tramo 1".

La entidad informó que se han completado los trabajos de fresado y colocación de carpeta asfáltica en los carriles izquierdos del tramo 6, desde Jujan hacia Babahoyo y se prevé intervenir el carril derecho durante las primeras semanas de octubre de 2025.

Asimismo, se ha ejecutado el fresado de la carpeta asfáltica correspondiente al tramo 1.

Construcción de Vías de Acceso hacia El Viaducto Sur Provincia del Guayas

La entidad informó que los trabajos de obra se encuentran en ejecución, registrando un avance del 8,56% en el tramo 4 y del 20,94% en el tramo 5, lo que representa un avance promedio del 14,75%.

Programa de conservación por niveles de servicio

La entidad reporta que se realizó el pago de siete planillas de obra y siete de fiscalización correspondientes a los tramos ejecutados en las provincias de Esmeraldas, Chimborazo, Napo y Cañar.

Como nudo crítico, se registró una demora de tres semanas en la asignación de recursos por parte del Ministerio de Economía y Finanzas, lo que afectó el pago de planillas del tramo ejecutado en la provincia de Napo.



Eje Institucional



Eje Institucional

Objetivo 8

7.8. OBJETIVO 8: Fortalecer la institucionalidad pública de forma eficiente, transparente y participativa.

Este Objetivo busca fortalecer la institucionalidad pública de forma eficiente, transparente y participativa, en cumplimiento del mandato constitucional y como un compromiso con la democracia y la ciudadanía. Se trata de construir un Estado al servicio de las personas, donde la integridad sea la norma, la participación el motor y la eficiencia el resultado.


Con base en la gestión desarrollada por el Estado a través de la implementación de sus planes institucionales, estudios, programas y proyectos durante el tercer trimestre del 2025, a continuación, se detallan los resultados alineados a este Objetivo:

7.8.1. Gestión Presupuestaria

Para el cumplimiento de las metas del Objetivo 8, se devengó un total de USD 1.508,95 millones en el tercer trimestre del 2025, de los cuales, el 88,52% corresponde a **Gasto Permanente** con un monto devengado de USD 1.335,78 millones; y, la diferencia corresponde al **Gasto No Permanente** vinculado a estudios, programas y proyectos de inversión, de diferentes entidades, con un monto devengado de USD 173,17 millones.

Por su parte, la ejecución presupuestaria del **Gasto No Permanente** destinado al Objetivo 8, considerando el monto devengado más anticipos entregados en el periodo (USD 179,38 millones), frente al monto codificado con fuente de financiamiento (USD 279,75 millones), alcanza un nivel de ejecución del 64,12%.

Ilustración 46. Gasto Permanente y No Permanente en 2025 – Objetivo 8
(millones de dólares)

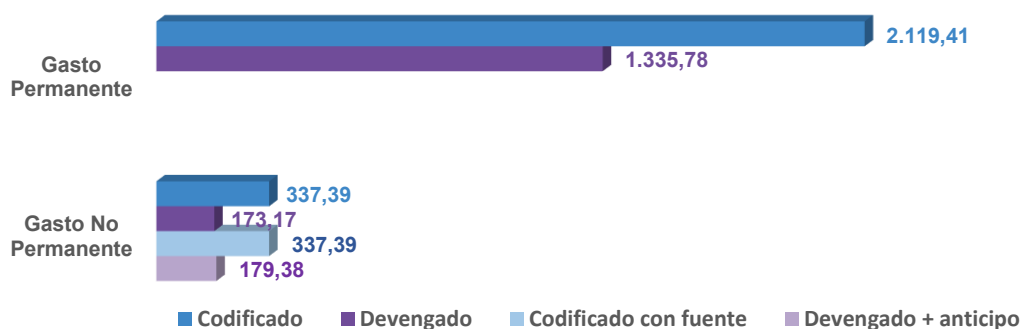

Fuente: SIPeIP, Presidencia de la República. e-SIGEF, MEF- Ejecución Presupuestaria. Corte 30 de septiembre de 2025.


Elaboración: Dirección de Seguimiento a la Planificación y Política Pública y Dirección de Seguimiento a la Inversión – Presidencia de la República.

A continuación, se detallan los montos correspondientes al **Gasto Permanente** y **Gasto No Permanente** que fueron ejecutados, alineados al Objetivo 8, en función de los gabinetes sectoriales

establecidos para la gestión institucional.

En **Gasto Permanente**, las entidades en Sin Gabinete son las que más recursos ejecutaron en este Objetivo con un monto devengado de USD 446,26 millones, conforme la siguiente ilustración:

Ilustración 47. Gasto Permanente por Gabinete Sectorial en 2025 – Objetivo 8
(millones de dólares)

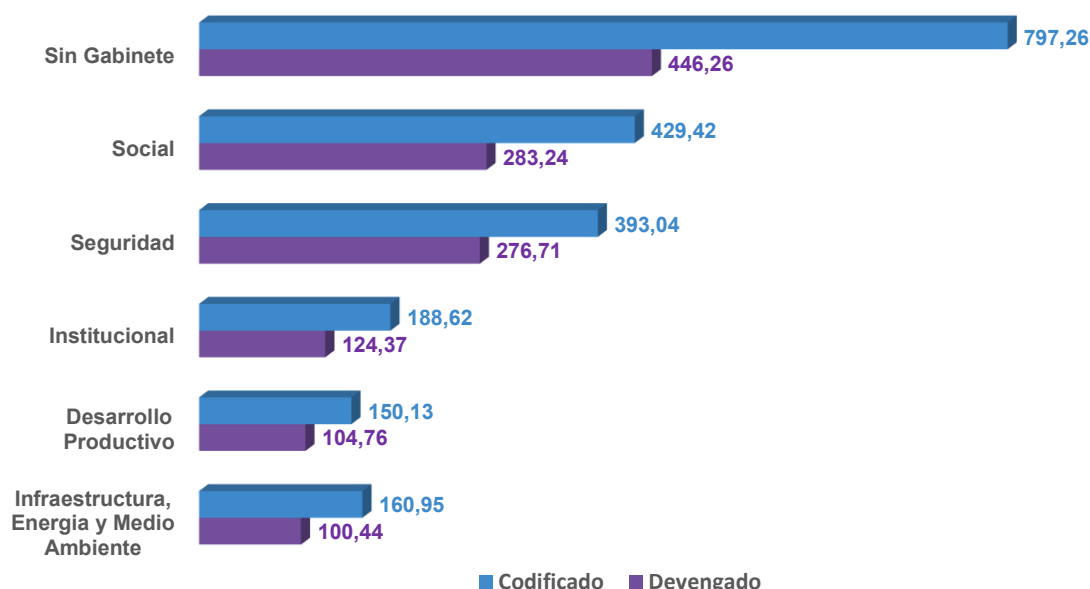

Fuente: Base de datos e-SIGEF, Ejecución Presupuestaria Consolidada – MEF corte al 30 de septiembre de 2025.
Elaboración: Dirección de Seguimiento a la Planificación y Política Pública – Presidencia de la República.

En relación al **Gasto Permanente** alineado al Objetivo 8, se identifica que se encuentran alineadas 131 entidades, con un presupuesto codificado de USD 2.119,41 millones y un monto devengado de USD 1.335,78 millones, lo que representa una ejecución presupuestaria del 63,03%. Cabe señalar que, la alineación a este objetivo responde a la directriz de la homologación del objetivo institucional denominado “*Fortalecer las Capacidades institucionales*”²¹ a la meta 8.2.1 del PND para todas las entidades pertenecientes al PGE. A continuación, se detalla la ejecución presupuestaria correspondiente al tercer trimestre por institución:

Tabla 51. Ejecución presupuestaria de las entidades alineadas al Objetivo 8

Gabinete Sectorial	Entidad	Codificado (MM USD)	Devengado (MM USD)	Ejecución (%)
Gabinete Sectorial de Desarrollo Productivo	Servicio de Rentas Internas	89,19	64,95	72,83%
	Servicio de Acreditación Ecuatoriano	0,52	0,37	71,75%
	Instituto Publico de Investigación de Acuicultura y Pesca	0,73	0,52	71,61%
	Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca	23,40	16,71	71,38%
	Servicio Ecuatoriano de Normalización	2,41	1,71	71,19%
	Instituto Nacional de Investigaciones Agropecuarias	16,08	10,51	65,38%

²¹ Directrices para Planificación Institucional 2025 SIPeIP y GPR, Oficio Nro. SNP-SGP-SPN-2025-0061-OF, Oficio Nro. SNP-SGP-SPN-2025-0062-OF y Oficio Nro. SNP-SGP-SPN-2025-0063-OF, de 3 de febrero de 2025

Gabinete Sectorial	Entidad	Codificado (MM USD)	Devengado (MM USD)	Ejecución (%)
	Ministerio de Producción Comercio Exterior e Inversiones	12,74	7,25	56,85%
	Servicio Nacional de Contratación Pública	5,06	2,73	53,99%
Gabinete Sectorial de Infraestructura, Energía y Medio Ambiente	Autoridad Portuaria de Manta	1,64	1,38	83,80%
	Autoridad Portuaria de Esmeraldas	2,16	1,75	81,14%
	Parque Nacional Galápagos	22,96	17,23	75,02%
	Ministerio de Infraestructura y Transporte	35,50	25,94	73,08%
	Instituto Nacional de Meteorología E Hidrología	2,05	1,49	73,01%
	Comisión de Transito del Ecuador	4,81	3,50	72,67%
	Agencia de Regulación y Control del Agua	1,29	0,92	71,16%
	Agencia de Regulación y Control Fito y Zoonosanitario	13,18	9,37	71,04%
	Instituto de Investigación Geológico y Energético	1,71	1,21	70,81%
	Dirección General de Aviación Civil	7,57	5,30	70,02%
	Agencia de Regulación y Control de las Telecomunicaciones	5,31	3,54	66,66%
	Instituto Nacional de Biodiversidad	1,57	1,02	64,91%
	Agencia de Regulación y Control de la Bioseguridad y Cuarentena para Galápagos	1,86	1,19	64,02%
	Agencia Nacional de Regulación y Control del Transporte Terrestre Tránsito y Seguridad Vial	24,51	14,67	59,88%
	Autoridad Portuaria de Guayaquil	7,39	4,42	59,80%
	Autoridad Portuaria de Puerto Bolívar	1,10	0,63	57,80%
	Secretaría Técnica de la Circunscripción Territorial Especial Amazónica	2,26	1,19	52,77%
	Operador Nacional de Electricidad	3,22	1,54	47,94%
	Servicio Público para Pago de Accidentes de Tránsito	1,47	0,69	46,95%
	Ministerio de Energía y Minas	19,40	3,46	17,84%
Gabinete Sectorial de lo Social	Unidad Nacional Antidopaje del Ecuador	0,39	0,29	74,16%
	Instituto Nacional de Patrimonio Cultural	2,44	1,79	73,32%
	Ministerio de Educación, Deporte y Cultura	232,06	166,89	71,92%
	Dirección Nacional de Registros Públicos	2,97	2,11	71,18%
	Agencia Nacional de Regulación Control y Vigilancia Sanitaria	4,73	3,36	71,02%
	Instituto Nacional de Donación y Trasplantes de Órganos Tejidos y Células	1,43	1,01	70,92%
	Casa de la Cultura Ecuatoriana Benjamín Carrión	8,17	5,78	70,78%
	Agencia de Aseguramiento de la Calidad de Servicios de Salud y Medicina Prepagada ACESS	1,30	0,90	69,25%
	Instituto Nacional de Economía Popular y Solidaria	3,63	2,48	68,38%
	Secretaría de Educación Intercultural Bilingüe y la Etnoeducación	3,91	2,67	68,25%
	Secretaría de Gestión y Desarrollo de Pueblos y Nacionalidades	2,59	1,76	67,85%
	Unidad del Registro Social	1,93	1,31	67,75%
	Servicio Nacional de Derechos Intelectuales	0,55	0,37	67,45%

Gabinete Sectorial	Entidad	Codificado (MM USD)	Devengado (MM USD)	Ejecución (%)
	Instituto Nacional de Investigación En Salud Publica Inspi Dr Leopoldo Izquieta Pérez	6,81	4,57	67,09%
	Instituto Nacional de Evaluación Educativa	1,04	0,70	66,80%
	Ministerio de Telecomunicaciones y de la Sociedad de la Información	6,82	4,22	61,97%
	Ministerio de Desarrollo Humano	49,26	28,38	57,61%
	Ministerio de Salud Pública	29,85	16,81	56,33%
	Dirección General de Registro Civil Identificación y Cedulación	69,57	37,85	54,41%
Gabinete Sectorial de Seguridad	Centro de Inteligencia Estratégica	109,61	105,42	96,17%
	Secretaría Nacional de Gestión de Riesgos	6,48	4,78	73,75%
	Ministerio de Defensa Nacional	114,25	80,19	70,19%
	Servicio Integrado de Seguridad Ecu 911	12,67	8,78	69,29%
	Servicio Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses	6,80	4,53	66,54%
	Ministerio de Gobierno	13,81	8,31	60,16%
	Policía Nacional	75,31	41,72	55,39%
	Instituto Geográfico Militar	8,98	4,74	52,82%
	Servicio Nacional de Atención Integral a Personas Adultas Privadas de la Libertad y a Adolescentes Infractores	11,41	4,76	41,76%
	Ministerio del Interior	33,72	13,49	40,01%
Gabinete Sectorial Institucional	Ministerio del Trabajo	24,97	18,20	72,90%
	Instituto Nacional de Estadísticas y Censos	12,22	8,49	69,47%
	Servicio Ecuatoriano de Capacitación Profesional	6,65	4,61	69,41%
	Ministerio de Relaciones Exteriores y Movilidad Humana	98,80	66,00	66,80%
	Ministerio de Economía y Finanzas	7,76	4,71	60,64%
	Presidencia de la República	38,22	22,36	58,50%
Sin Gabinete	Sección Nacional del Ecuador del Instituto Panamericano de Geografía e Historia	0,35	0,26	76,29%
	Casa Militar Presidencial	4,05	3,09	76,15%
	Universidad laica Eloy Alfaro de Manabí	7,27	5,47	75,25%
	Fiscalía General del Estado	23,11	17,10	74,03%
	Consejo Nacional de Competencias	0,97	0,72	73,74%
	Conferencia Plurinacional e Intercultural de Soberanía Alimentaria	0,19	0,14	73,35%
	Corte Constitucional	8,97	6,48	72,25%
	Misión F.A.O. en el Ecuador	0,03	0,02	72,02%
	Defensoría del Pueblo	10,97	7,86	71,64%
	Superintendencia de Ordenamiento Territorial Uso y Gestión del Suelo	2,75	1,97	71,64%
	Corporación del Seguro de Depósitos	1,51	1,08	71,29%
	Secretaría Técnica del Comité de Coordinación de la Función de Transparencia y Control Social	0,27	0,19	70,64%
	Defensoría Pública	7,01	4,95	70,54%

Gabinete Sectorial	Entidad	Codificado (MM USD)	Devengado (MM USD)	Ejecución (%)
	Superintendencia de Compañías Valores y Seguros	9,87	6,89	69,80%
	Universidad Técnica de Cotopaxi	3,99	2,77	69,48%
	Asamblea Nacional	55,08	38,16	69,29%
	Centro Interamericano de Artesanías y Artes Populares	0,39	0,27	69,03%
	Parlamento Andino (Oficina Nacional)	1,84	1,26	68,82%
	Superintendencia de Competencia Económica	5,27	3,61	68,42%
	Universidad Técnica de Machala	11,06	7,53	68,07%
	Consejo Nacional para la Igualdad de Discapacidades	0,87	0,59	68,03%
	Casa de Montalvo	0,12	0,08	68,02%
	Consejo de la Judicatura	36,41	24,75	67,97%
	Consejo Nacional Para la Igualdad Intergeneracional	0,56	0,38	67,90%
	Consejo de Desarrollo y Promoción de la Información y Comunicación	2,97	2,01	67,50%
	Consejo Nacional para la Igualdad de Pueblos y Nacionalidades	0,52	0,35	67,38%
	Consejo de Participación Ciudadana y Control Social	8,03	5,37	66,89%
	Superintendencia de Economía Popular y Solidaria	6,09	4,03	66,18%
	Superintendencia de Bancos	7,03	4,64	66,05%
	Tribunal Contencioso Electoral	4,37	2,86	65,43%
	Consejo Nacional para la Igualdad de Género	0,45	0,30	65,35%
	Escuela Politécnica Nacional	16,86	10,95	64,92%
	Unidad de Análisis Financiero y Económico	1,32	0,86	64,79%
	Consejo Nacional de Salud	0,33	0,21	64,13%
	Escuela Superior Politécnica Agropecuaria de Manabí Manuel Félix López	5,21	3,33	63,89%
	Junta Nacional de Defensa del Artesano	1,21	0,77	63,17%
	Instituto Superior Tecnológico de Artes del Ecuador	0,40	0,25	62,72%
	Consejo Nacional para la Igualdad de Movilidad Humana	0,64	0,40	62,22%
	Procuraduría General del Estado	25,86	15,88	61,41%
	Secretaría Técnica de Gestión Inmobiliaria del Sector Público	34,97	21,38	61,15%
	Universidad de Guayaquil	47,58	28,56	60,02%
	Universidad Técnica de Babahoyo	9,75	5,84	59,86%
	Junta de Política y Regulación Financiera	0,45	0,27	59,58%
	Consejo de Gobierno del Régimen Especial de Galápagos	6,95	4,11	59,10%
	Consejo de Aseguramiento de la Calidad de la Educación Superior	3,52	2,08	59,10%
	Escuela Superior Politécnica del Litoral	11,14	6,20	55,67%
	Consejo Nacional Electoral	144,06	80,11	55,61%
	Vicepresidencia de la República	2,34	1,28	54,71%
	Universidad de las Fuerzas Armadas	23,01	12,47	54,21%

Gabinete Sectorial	Entidad	Codificado (MM USD)	Devengado (MM USD)	Ejecución (%)
	Universidad Estatal de Milagro	12,50	6,72	53,78%
	Escuela Superior Politécnica del Chimborazo	19,73	10,09	51,15%
	Instituto de Altos Estudios Nacionales	5,13	2,61	50,90%
	Universidad Regional Amazónica Ikiam	4,46	2,27	50,78%
	Consejo de Educación Superior	4,24	2,09	49,42%
	Universidad Técnica del Norte	16,76	8,18	48,77%
	Universidad de las Artes	7,30	3,35	45,86%
	Universidad Estatal Península de Santa Elena	9,11	4,07	44,63%
	Universidad Nacional de Loja	16,59	7,18	43,31%
	Universidad Nacional de Educación	10,02	4,10	40,95%
	Universidad Nacional de Chimborazo	19,20	7,63	39,75%
	Universidad Técnica de Ambato	18,27	7,21	39,45%
	Universidad Técnica de Manabí	17,57	6,88	39,14%
	Universidad Estatal del Sur de Manabí	12,60	4,91	39,02%
	Universidad de Cuenca	32,00	10,73	33,54%
	Universidad Técnica de Quevedo	9,35	2,97	31,71%
	Universidad Estatal Amazónica	7,96	2,25	28,26%
	Universidad Politécnica Estatal del Carchi	9,88	2,62	26,57%
	Universidad Intercultural de las Nacionalidades y Pueblos Indígenas Amawtay Wasi	6,60	0,27	4,04%
Total		2.119,41	1.335,78	63,03%


Fuente: Base de datos e-SIGEF, Ejecución Presupuestaria Consolidada – MEF corte al 30 de septiembre de 2025. Estado de validación de planes institucionales tercer trimestre 2025, corte 30 de septiembre de 2025.

Elaboración: Dirección de Seguimiento a la Planificación y Política Pública – Presidencia de la República.

El objetivo 8 relacionado con fortalecer la institucionalidad pública, incluye a las instituciones, Ministerio de Educación, Deporte y Cultura y el Consejo Nacional Electoral que concentran el 17,7% del codificado del objetivo, con niveles de ejecución presupuestaria de 71,92% y 55,61% respectivamente.

Por su parte, en lo que respecta al **Gasto No Permanente**, las entidades que conforman el Gabinete Sectorial Institucional ejecutaron USD 156,31 millones, mientras que las entidades que no forman parte de ningún Gabinete Sectorial ejecutaron USD 11,88 millones. Así mismo, las entidades del Gabinete Sectorial de lo Social ejecutaron USD 4,26 millones y finalmente, las entidades que conforman el Gabinete Sectorial de Infraestructura, Energía y Medio Ambiente ejecutaron USD 0,72 millones, alineados al Objetivo 8.

Ilustración 48. Gasto No Permanente por Gabinete Sectorial en 2025 (tercer trimestre) – Objetivo 8
(millones de dólares)

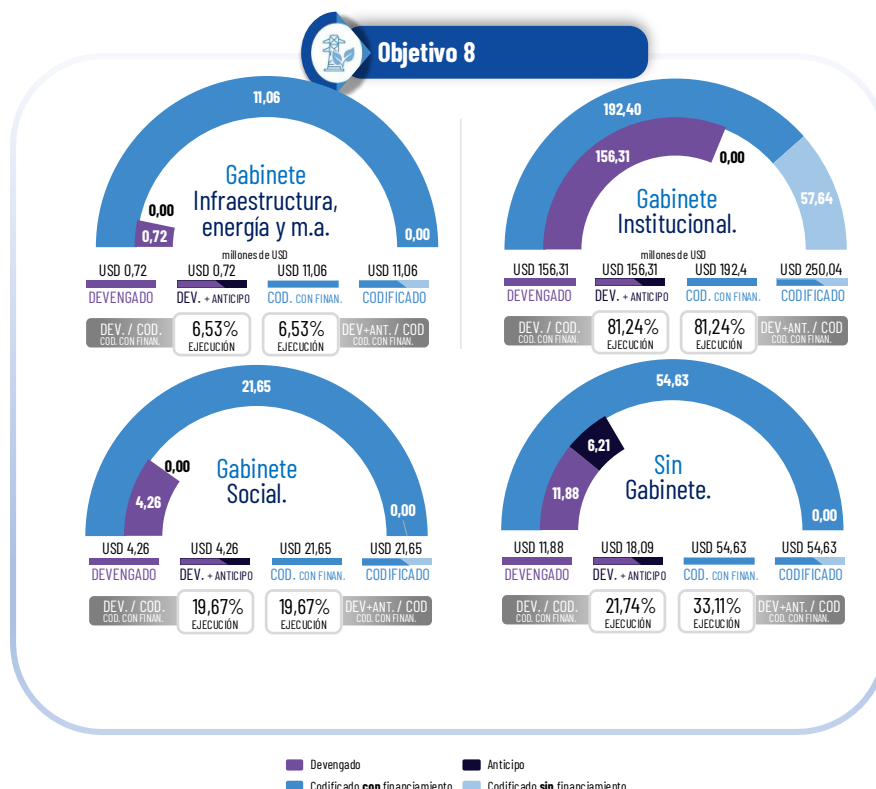

Fuente: SIPeIP, Presidencia de la República. e-SIGEF, MEF- Ejecución Presupuestaria. Corte 30 de septiembre de 2025.

Elaboración: Dirección de Seguimiento a la Inversión – Presidencia de la República.

Considerando el monto devengado más anticipos y el monto codificado con fuente entregados en el periodo, se identifica que en el Objetivo 8, las entidades que conforman el Gabinete Sectorial Institucional presentan una ejecución presupuestaria de 81,24%, correspondiente a 5 proyectos de inversión, mientras que las entidades que no pertenecen a ningún Gabinete Sectorial alcanzan una ejecución presupuestaria del 33,11%, correspondiente a 28 proyectos de inversión. Le siguen, las entidades pertenecientes al Gabinete Sectorial de lo Social con una ejecución presupuestaria de 19,67% correspondiente a 2 proyectos de inversión. Finalmente, las entidades del Gabinete Sectorial de Infraestructura, Energía y Medio Ambiente con una ejecución presupuestaria del 6,53% correspondientes a 4 proyectos de inversión.

Tabla 52. Cumplimiento presupuestario por gabinete sectorial en 2025 – Objetivo 8

Gabinete Sectorial	Número de Entidades	Número de Proyectos	% Ejecución presupuestaria	
			Devengado / Codificado	Devengado más anticipos / Codificado con fuente
Institucional	2	5	62,51%	81,24%
Sin Gabinete	16	28	21,74%	33,11%
Social	2	2	19,67%	19,67%
Infraestructura, Energía y Medio Ambiente	4	4	6,53%	6,53%
Total	24	39		

Fuente: SIPeIP - Presidencia de la República. e-SIGEF, MEF- Ejecución Presupuestaria. Corte 30 de septiembre de 2025.




Elaboración: Dirección de Seguimiento a la Inversión – Presidencia de la República.

Para obtener información detallada sobre las entidades, se recomienda revisar el Anexo 2, que contiene la matriz resumen con datos sobre el avance presupuestario y físico.

7.8.2. Avance Físico de la Planificación Institucional

Las 9 entidades que cumplieron con el proceso de registro y la sistematización de su planificación institucional cuentan con indicadores alineados al Objetivo 8, el cual comprende un total de 21 objetivos institucionales y 38 indicadores estratégicos sujetos a seguimiento. De acuerdo con los resultados obtenidos, se identifica que el 81,58% de los indicadores presentan un avance esperado; el 2,63 %, un avance cercano al esperado; y el 15,79%, un avance menor al esperado, conforme al detalle que se presenta a continuación:

Tabla 53. Avance de Indicadores Institucionales – Objetivo 8

Entidad	Número Indicadores	Avance esperado 		Avance cercano al esperado 		Avance menor a lo esperado 	
		Indicadores	%	Indicadores	%	Indicadores	%
Agencia Nacional de Tránsito	1	0	0,00%	0	0,00%	1	100,00%
Consejo de Desarrollo y Promoción de la Información y Comunicación	1	1	100,00%	0	0,00%	0	0,00%
Dirección General de Registro Civil Identificación y Cedulación	9	6	66,67%	1	11,11%	2	22,22%
Instituto Nacional de Estadística y Censos	4	4	100,00%	0	0,00%	0	0,00%
Ministerio de Relaciones Exteriores y Movilidad Humana	2	2	100,00%	0	0,00%	0	0,00%
Ministerio de Trabajo	5	5	100,00%	0	0,00%	0	0,00%
Policía Nacional	4	3	75,00%	0	0,00%	1	25,00%
Servicio Nacional de Contratación Pública	1	1	100,00%	0	0,00%	0	0,00%
Secretaría Técnica de Gestión Inmobiliaria del Sector Público	11	9	81,82%	0	0,00%	2	18,18%
Total	38	31	81,58%	1	2,63%	6	15,79%

Fuente: SIPeIP- GPR corte 30 de septiembre de 2025.

Elaboración: Dirección de Seguimiento a la Planificación y Política Pública – Presidencia de la República.

Principales Logros

Ministerio de Relaciones Exteriores y Movilidad Humana

- 692 acciones estratégicas orientadas a incrementar las exportaciones ecuatorianas y diversificar la oferta exportable, mediante el impulso a la negociación y suscripción de acuerdos comerciales e instrumentos internacionales, la coordinación con las oficinas comerciales y la participación en ferias internacionales. Estas actividades se desarrollaron en diversas regiones del mundo: América del Norte, Europa, Asia, África, Oceanía, América Latina y el Caribe, a través de las misiones diplomáticas del Ecuador, fortaleciendo la presencia del país en los mercados internacionales.
- 587 acciones estratégicas destinadas a atraer inversiones al Ecuador, las cuales incluyeron reuniones con potenciales inversionistas, así como la participación en eventos, foros y talleres internacionales. Estas iniciativas, ejecutadas también en las regiones de América del Norte, Europa, Asia, África, Oceanía, América Latina y el Caribe, fueron coordinadas a través de las misiones diplomáticas ecuatorianas, contribuyendo al posicionamiento del país como un destino confiable y competitivo para la inversión extranjera.

Secretaría Técnica de Gestión Inmobiliaria del Sector Público

- 98,14% de satisfacción de los usuarios en el período de julio a septiembre de 2025, en edificios, parques e infraestructuras pesqueras, bajo la administración eficiente de los bienes inmuebles permanentes a nivel nacional.
- 100% de pronunciamientos jurídicos, autorizaciones, dictámenes en el período de julio a septiembre de 2025, correspondiente a 551 solicitudes fueron atendidos en cumplimiento a los requerimientos de las entidades públicas a nivel nacional.
- 100% de levantamientos topográficos elaborados en el período de julio a septiembre de 2025, interviniendo un área total de 35,95 Ha de 8 bienes inmuebles de las provincias de Guayas, Cotopaxi y Pichincha.
- 100% de certificados e informes técnicos de avalúo elaborados en el período de julio a septiembre de 2025, correspondiente a 22 certificados de avalúo y 8 informes técnicos de avalúo, en atención a los requerimientos internos y externos, desarrolladas en las provincias de Esmeraldas, Guayas, Imbabura, Pichincha, Tungurahua y Sucumbíos.
- 100% de intervenciones atendidas en el período de julio a septiembre de 2025, representando 491 mantenimientos menores en los bienes inmuebles por parte del personal de la institución, a nivel nacional.
- 100% de las fichas catastrales elaboradas en el período de julio a septiembre de 2025, correspondiente a 38 bienes inmuebles catastrados en el Sistema Ficha Predial –Módulo Catastro asigna un Código GID (Geographic Identificación), en las provincias de Guayas, Manabí y Pichincha.
- 100% de requerimientos de sucesiones intestadas atendidas en el período de julio a septiembre de 2025, representando 6 peticiones de cuota de participación estatal, a nivel nacional.
- 46 bienes a favor de la Secretaría Técnica de Gestión Inmobiliaria del Sector Público registrados en el periodo de julio a septiembre de 2025, no se recibieron requerimientos de transferencia de inmuebles a instituciones públicas en el periodo de julio a septiembre de 2025.

Dirección General de Registro Civil, Identificación y Cedulación

- 397.882 niños y niñas menores a 24 meses de edad inscritos en el Registro Civil al mes de septiembre de 2025, hasta 180 días después de su nacimiento, obteniendo un resultado del 97,21%, lo que permitió sobre cumplir la meta en 3,94 puntos porcentuales.
- 258.949 usuarios fueron cedulados por primera vez en el sistema biométrico, en el periodo de julio a septiembre de 2025. Se abrieron turnos en la agencia virtual para atender la demanda y permitir a la ciudadanía obtener su documento de identidad.
- 442.244 pasaportes ordinarios fueron emitidos de enero a septiembre de 2025, atendiendo la demanda del servicio a escala nacional, para lo cual se apertura de manera periódica la agencia virtual.
- 167.971 inscripciones de nacimientos fueron registradas entre el periodo de enero a septiembre de 2025, lo que representa el 64,77% de los 259.171 proyectados anualmente por el INEC. La institución implementó brigadas móviles, ofreció servicios en 26 agencias del Registro Civil en centros de salud y gestionó alertas de la ex Secretaría Técnica Ecuador Crece Sin Desnutrición Infantil.

Instituto Nacional de Estadística y Censos

- 6,25% de ejecución fue alcanzado mediante la elaboración de matrices que sistematizan la producción de información en los Gobiernos Autónomos Descentralizados de Ecuador (GAD)

de Cuenca, Riobamba y Antonio Ante, matrices de brechas de información e informe de seguimiento al "Programa Nacional de Estadística 2021 – 2025".

- 5% de avance fue logrado con la expedición de la "Norma Técnica para la Producción de Estadística Oficial", la actualización del formato de Diccionario de Variables, la generación de la Guía para la identificación de usuarios y la socialización del proceso de Certificación de calidad estadística.

Consejo de Desarrollo y Promoción de la Información y Comunicación

- 4 reportes de articulación interinstitucional, 1 reporte de monitoreo y respuesta ante agresiones, y 3 reportes de sistematización de estadísticas fueron efectuados para la protección de los trabajadores de la comunicación.

7.8.3. Avance Físico Proyectos de Inversión


El Objetivo 8 cuenta con 39 proyectos de inversión ejecutados por 24 entidades. El monto codificado total asciende a USD 337,39 millones, con un devengado de USD 173,17 millones, lo que representa una ejecución presupuestaria del 51,33%. Considerando anticipos, la ejecución asciende al 64,12%, con un monto devengado más anticipo de USD 179,38 millones frente al codificado con fuente.

Las entidades que concentran el 80,44% del presupuesto codificado son el Ministerio del Trabajo (230,00 millones en 1 proyecto), el Ministerio de Salud Pública (USD 21,34 millones en 1 proyecto) y el Instituto Nacional de Estadística y Censos (USD 20,04 millones en 4 proyectos).

En cuanto al avance físico, este objetivo registra un Avance Físico promedio en el año del 32,20% respecto de las metas anuales programadas, con un nivel promedio de cumplimiento del 62,85% al tercer trimestre, lo que indica un *"avance menor al esperado"*.

Cabe destacar que el Ministerio de Ambiente y Energía, el Ministerio de Educación, Deporte y Cultura, Secretaría Técnica de la Circunscripción Territorial Especial Amazónica – STCA, Escuela Politécnica Nacional, Universidad de las Fuerzas Armadas, Escuela Superior Politécnica del Litoral, Comisión de Tránsito del Ecuador y Universidad Nacional de Educación alcanzaron el 100,00% de cumplimiento de sus metas físicas programadas al tercer trimestre, en este objetivo.

Ilustración 49. Gasto No Permanente, avance físico promedio y avance presupuestario - Objetivo 8

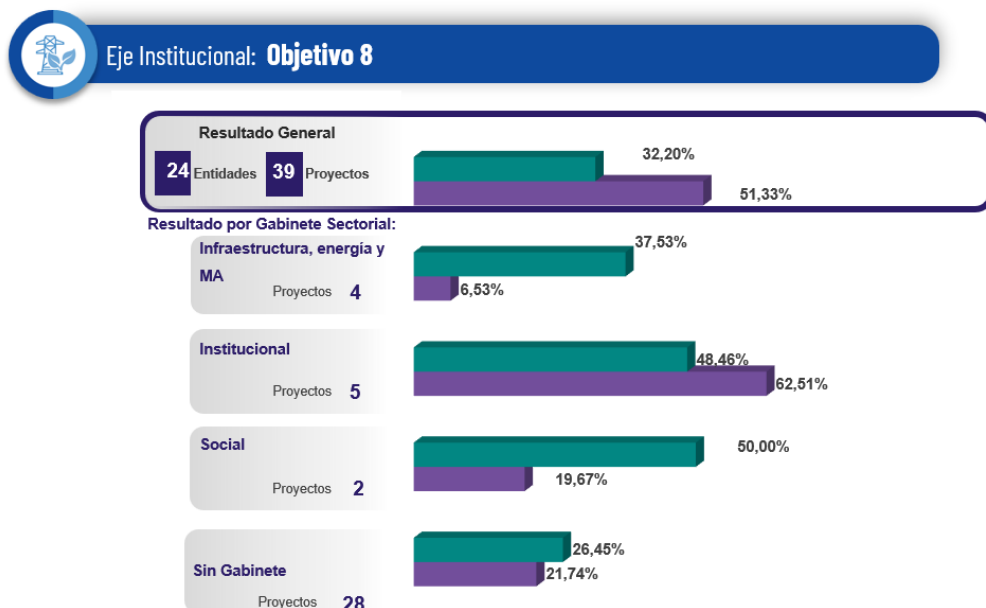

Fuente: SIPeIP, Presidencia de la República. e-SIGEF, MEF- Ejecución Presupuestaria. Corte 30 de septiembre 2025.

Elaboración: Dirección de Seguimiento a la Inversión – Presidencia de la República.

A continuación, se detalla el cumplimiento físico de los proyectos de inversión por gabinetes sectoriales relacionados con el Objetivo 8, lo que permite identificar los niveles de ejecución alcanzados por cada sector en relación con las metas físicas programadas.

Tabla 54. Cumplimiento físico por gabinete – Objetivo 8

Gabinete Sectorial	Número de Entidades	Número de Proyectos	Número de proyectos por nivel de cumplimiento				
Infraestructura, Energía y Medio Ambiente	4	4	● 3	● 0	● 0	● 1	
Institucional	2	5	● 4	● 0	● 1	● 0	
Social	2	2	● 1	● 0	● 0	● 1	
Sin Gabinete	16	28	● 6	● 0	● 13	● 9	
Total	24	39	14	0	14	11	

Nota: ● Avance esperado $\geq 100\%$ y $\leq 95\%$ / ● Avance cercano al esperado $> 95\%$ y $\leq 85\%$ / ● Avance menor al esperado $< 85\%$ / ● Proyecto sin programación de metas.

Fuente: SIPeIP, Presidencia de la República. e-SIGEF, MEF- Ejecución Presupuestaria. Corte 30 de septiembre de 2025.

Elaboración: Dirección de Seguimiento a la Inversión – Presidencia de la República.

Para conocer más información acerca de las entidades, por favor revisar el Anexo 2, que contiene la matriz resumen con información de avance presupuestario y físico.

A continuación, se presenta la información de ejecución de los principales proyectos de inversión que contribuyen a este objetivo:

Causas y Logros

Ministerio del Trabajo

El Ministerio del Trabajo registró un monto codificado de inversión de USD 230,00 millones para el tercer trimestre de 2025, con un monto devengado de USD 143,78 millones, lo que representa una ejecución presupuestaria del 62,51%. Al considerar el devengado más anticipos en relación con el codificado con fuente, la ejecución alcanza el 83,42%.

La entidad presentó 1 proyecto alineado al Objetivo 8, el cual cuenta con programación de metas físicas al tercer trimestre. Este alcanzó el 98,42% de cumplimiento físico.

Tabla 55. Avance Físico de Proyectos de Inversión al Tercer Trimestre Ministerio del Trabajo– Objetivo 8

Nombre del proyecto	Programación metas físicas (a)	Ejecución metas físicas (b)	Cumplimiento metas físicas c(b/a)	Codificado (MM USD) (d)	Devengado (MM USD) (e)	Ejecución presupuestaria 2025 f (d/e)	Devengado + anticipos /codificado con fuente (g)
Proyecto de gestión del subsistema de empleo en el servicio público	8,22%	8,09%	● 98,42%	230,00	143,78	62,51%	83,42%
							83,42%

Nota: ● Avance esperado $\geq 100\%$ y $\leq 95\%$ / ● Avance cercano al esperado $> 95\%$ y $\leq 85\%$ / ● Avance menor al esperado $< 85\%$ / ● Proyecto sin programación de metas.

Fuente: SIPeIP – Presidencia de la República. e-SIGEF - MEF- Ejecución Presupuestaria. Corte 30 de septiembre de 2025.

Elaboración: Dirección de Seguimiento a la Inversión – Presidencia de la República.

El Ministerio del Trabajo reporta las siguientes acciones:

Proyecto de Gestión del Subsistema de Empleo en el Servicio Público

La entidad informó que, durante el tercer trimestre de 2025, se gestionaron 1.161 expedientes de ex servidores públicos para avales de pago a nivel nacional, de los cuales se devengaron 1.160. De este total, 598 se ejecutaron en modalidad de bonos, por un valor de USD 28.544.200,00 para 67 instituciones, y 562 se pagaron en efectivo, por USD 26.890.035,12, beneficiando principalmente al MINEDEC, MSP y 42 instituciones adicionales.

Adicionalmente, se desembolsaron USD 24.344,96 destinados a salarios del equipo operativo del proyecto, conformado por el gerente, abogado senior, analista de planificación y analista de presupuestos.



Eje de Riesgos



Eje de Riesgos

Objetivo 9

7.9. OBJETIVO 9: Fortalecer la capacidad de respuesta y resiliencia de las ciudades y comunidades ante riesgos de origen natural y antrópico.

Este Objetivo busca fortalecer la resiliencia nacional frente a amenazas naturales y antrópicas mediante el desarrollo de políticas y estrategias que refuercen las capacidades institucionales, promuevan la sostenibilidad de la infraestructura pública y garanticen una recuperación post-desastre efectiva. Todo ello con el apoyo de la cooperación internacional y bajo un enfoque de coordinación interinstitucional orientado a proteger a la población y reducir la vulnerabilidad territorial.


Con base en la gestión desarrollada por el Estado a través de la implementación de sus planes institucionales, estudios, programas y proyectos durante el tercer trimestre del 2025, a continuación, se detallan los resultados alineados a este Objetivo:

7.9.1. Gestión Presupuestaria

Para el cumplimiento de las metas del Objetivo 9, se devengó un total de USD 32,47 millones en el tercer trimestre del 2025, de los cuales, el 51,38% corresponde a **Gasto Permanente** con un monto devengado de USD 16,68 millones; y, la diferencia corresponde al **Gasto No Permanente** vinculado a estudios, programas y proyectos de inversión, de diferentes entidades, con un monto devengado de USD 15,79 millones.

Por su parte, la ejecución presupuestaria del **Gasto No Permanente** destinado al Objetivo 9, considerando el monto devengado más anticipos entregados en el periodo (USD 15,79 millones), frente al monto codificado con fuente de financiamiento (USD 17,63 millones), alcanza un nivel de ejecución del 89,54%.

Ilustración 50. Gasto Permanente y No Permanente en 2025 – Objetivo 9
(millones de dólares)

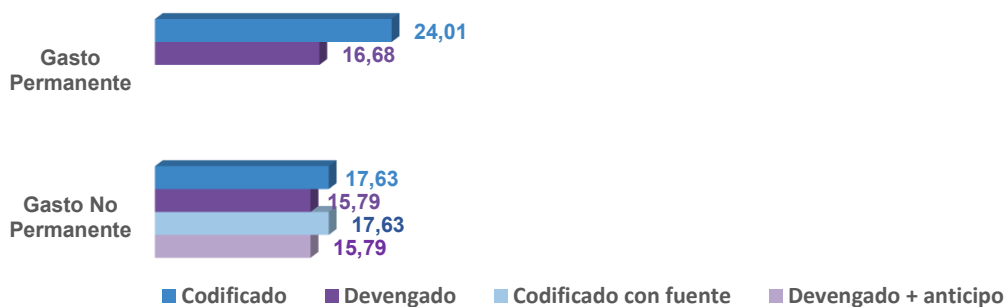

Fuente: SIPeIP, Presidencia de la República. e-SIGEF, MEF- Ejecución Presupuestaria. Corte 30 de septiembre de 2025.

Elaboración: Dirección de Seguimiento a la Planificación y Política Pública y Dirección de Seguimiento a la Inversión – Presidencia de la República.

A continuación, se detallan los montos correspondientes al **Gasto Permanente** y **Gasto No Permanente** que fueron ejecutados, alineados al Objetivo 9, en función de los gabinetes sectoriales establecidos para la gestión institucional.

En **Gasto Permanente**, el Gabinete Sectorial de Seguridad es el que concentra los recursos en este objetivo con un monto devengado de USD 16,68 millones, conforme la siguiente ilustración:

Ilustración 51. Gasto Permanente por Gabinete Sectorial en 2025 – Objetivo 9
(millones de dólares)



Fuente: Base de datos e-SIGEF, Ejecución Presupuestaria Consolidada –MEF corte al 30 de septiembre de 2025. Base de alineación al PND tercer trimestre 2025 –Presidencia de la República, corte 30 de septiembre de 2025.

Elaboración: Dirección de Seguimiento a la Planificación y Política Pública – Presidencia de la República.

En relación al **Gasto Permanente** alineado al Objetivo 9, se identifica que se encuentran alineadas 2 entidades, con un presupuesto codificado de USD 24,01 millones y un monto devengado de USD 16,68 millones, lo que representa una ejecución presupuestaria del 69,48%. A continuación, se detalla la ejecución presupuestaria correspondiente al tercer trimestre por institución:

Tabla 56. Ejecución presupuestaria de las entidades alineadas al Objetivo 9

Gabinete Sectorial	Entidad	Codificado (MM USD)	Devengado (MM USD)	Ejecución (%)
Gabinete Sectorial de Seguridad	Secretaría Nacional de Gestión de Riesgos	5,57	4,03	72,32%
	Servicio Integrado de Seguridad ECU 911	18,44	12,66	68,62%
Total		24,01	16,68	69,48%


Fuente: Base de datos e-SIGEF, Ejecución Presupuestaria Consolidada – MEF corte al 30 de septiembre de 2025. Estado de validación de planes institucionales tercer trimestre 2025, corte 30 de septiembre de 2025.

Elaboración: Dirección de Seguimiento a la Planificación y Política Pública – Presidencia de la República.

El objetivo 9 relacionado con fortalecer la capacidad de respuesta y resiliencia de las ciudades y comunidades, incluye al Servicio Integrado de Seguridad ECU 911 que concentra el 76,80% del codificado del objetivo, con un nivel de ejecución presupuestaria de 69,48%.

Por su parte, en lo que respecta al **Gasto No Permanente**, la única entidad que conforma el Gabinete Sectorial de Seguridad alineado al Objetivo 9, ejecutó USD 15,79 millones.

Ilustración 52. Gasto No Permanente por Gabinete Sectorial en 2025 (tercer trimestre) – Objetivo 9

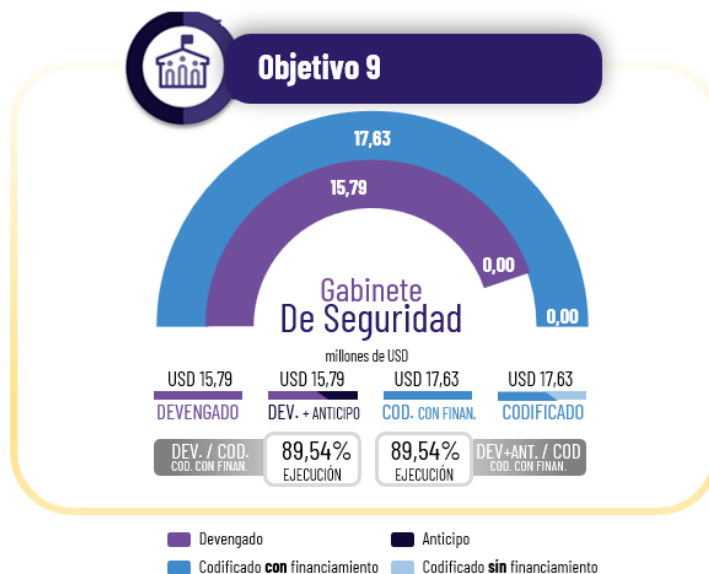

Fuente: SIPeIP, Presidencia de la República. e-SIGEF, MEF- Ejecución Presupuestaria. Corte 30 de septiembre de 2025.

Elaboración: Dirección de Seguimiento a la Inversión – Presidencia de la República.

Considerando el monto devengado más anticipos y el monto codificado con fuente entregados en el periodo, se observa que en el Objetivo 9, la entidad que conforma el Gabinete Sectorial de Seguridad presenta una ejecución presupuestaria de 89,54%, correspondiente a 4 proyectos de inversión.

Tabla 57. Cumplimiento presupuestario por gabinete sectorial en 2025 – Objetivo 9

Gabinete Sectorial	Número de Entidades	Número de Proyectos	% Ejecución presupuestaria	
			Devengado / Codificado	Devengado más anticipos / Codificado con fuente
Seguridad	1	4	89,54%	89,54%
Total	1	4		

Fuente: SIPeIP – Presidencia de la República. e-SIGEF, MEF– Ejecución Presupuestaria. Corte 30 de septiembre de 2025.




Elaboración: Dirección de Seguimiento a la Inversión – Presidencia de la República.

Para obtener información detallada sobre las entidades, se recomienda revisar el Anexo 2, que contiene la matriz resumen con datos sobre el avance presupuestario y físico.

7.9.2. Avance Físico de la Planificación Institucional

Las 2 entidades que cumplieron con el proceso de registro y la sistematización de su planificación institucional cuentan con indicadores alineados al Objetivo 9, el cual comprende un total de 2 objetivos institucionales y 6 indicadores estratégicos sujetos a seguimiento. De acuerdo con los resultados obtenidos, se identifica que el 83,33% de los indicadores presentan un avance esperado y, el 16,67%, un avance cercano al esperado, conforme al detalle que se presenta a continuación

Tabla 58. Avance de Indicadores Institucionales – Objetivo 9

Entidad	Número Indicadores	Avance esperado 		Avance cercano al esperado 		Avance menor a lo esperado 	
		Indicadores	%	indicadores	%	indicadores	%
Servicio Integrado de Seguridad – ECU 911	3	3	100,00%	0	0,00%	0	0,00%
Secretaría Nacional de Gestión de Riesgos	3	2	66,67%	1	33,33%	0	0,00%
Total	6	5	83,33%	1	16,67%	0	0,00%

Fuente: SIPeIP- GPR corte 30 de septiembre de 2025.

Elaboración: Dirección de Seguimiento a la Planificación y Política Pública – Presidencia de la República.

Principales Logros

Secretaría de Gestión de Riesgos

- 747.642 personas sensibilizadas en gestión de riesgos de acuerdo a los procesos metodológicos establecidos que se ejecutan a nivel nacional.
- 266.652 personas que aprueban los cursos virtuales de gestión de riesgos de desastres que se encuentran disponibles en la plataforma de la Secretaría Nacional de Gestión de Riesgos a nivel nacional.

Servicio Integrado de Seguridad – ECU 911

- 96,74 % de disponibilidad operativa de la plataforma tecnológica, incluyendo un 99,80 % en disponibilidad de llamadas, 67,84 % en videovigilancia y 99,51 % en smartphone, permitiendo atender 2'237.126 alertas vía llamadas y 1.571 alertas mediante smartphones a nivel nacional.
- 123 segundos de tiempo promedio de atención a emergencias por violencia intrafamiliar, con coordinación de 17.760 casos a nivel nacional.


7.9.3. Avance Físico Proyectos de Inversión

El Objetivo 9 cuenta con 4 proyectos de inversión ejecutados por 1 entidad. El monto codificado total asciende a USD 17,63 millones, con un devengado de USD 15,79 millones, lo que representa una ejecución presupuestaria del 89,54%. Cabe indicar que todo el presupuesto codificado cuenta con fuente de financiamiento y no se cuenta con anticipos para este objetivo.

En cuanto al avance físico, este objetivo registra un Avance Físico promedio en el año del 31,86% respecto de las metas anuales programadas, con un nivel promedio de cumplimiento del 33,64% al tercer trimestre, lo que indica un *“avance menor al esperado”*.

La Secretaría Nacional de Gestión de Riesgos es la única entidad que conforma este objetivo, concentrando el 100,00% del presupuesto codificado en la ejecución de 4 proyectos, de los cuales en uno se alcanzó el 100,00% de cumplimiento de sus metas físicas programadas al tercer trimestre.

Ilustración 53. Gasto No Permanente, avance físico promedio y avance presupuestario - Objetivo 9

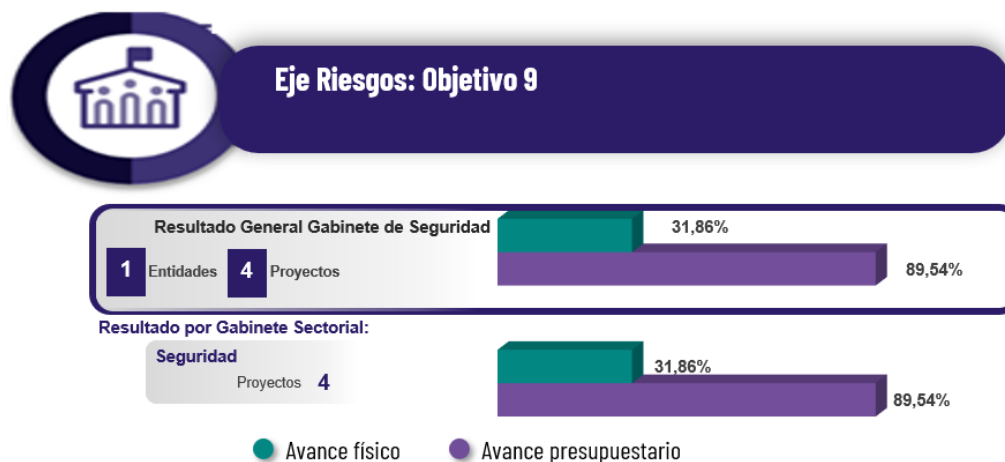

Fuente: SiPeIP, Presidencia de la República. e-SIGEF, MEF- Ejecución Presupuestaria. Corte 30 de septiembre 2025.

Elaboración: Dirección de Seguimiento a la Inversión – Presidencia de la República.

A continuación, se detalla el cumplimiento físico de los proyectos de inversión por gabinetes sectoriales relacionados con el Objetivo 9, lo que permite identificar los niveles de ejecución alcanzados por cada sector en relación con las metas físicas programadas.

Tabla 59. Cumplimiento físico por gabinete – Objetivo 10

Gabinete Sectorial	Número de Entidades	Número de Proyectos	Número de proyectos por nivel de cumplimiento			
Seguridad	1	4	1	0	3	0
Total	1	4	1	0	3	0

Nota: ● Avance esperado $\geq 100\%$ y $\leq 95\%$ / ● Avance cercano al esperado $> 95\%$ y $\leq 85\%$ / ● Avance menor al esperado $< 85\%$ / ● Proyecto sin programación de metas.

Fuente: SiPeIP, Presidencia de la República. e-SIGEF, MEF- Ejecución Presupuestaria. Corte 30 de septiembre de 2025.

Elaboración: Dirección de Seguimiento a la Inversión – Presidencia de la República.

Para conocer más información acerca de las entidades, por favor revisar el Anexo 2, que contiene la matriz resumen con información de avance presupuestario y físico.

A continuación, se presenta la información de ejecución de los principales proyectos de inversión que contribuyen a este objetivo:

Causas y Logros

Secretaría Nacional de Gestión de Riesgos

La Secretaría Nacional de Gestión de Riesgos registró un monto codificado de inversión de USD 17,63 millones y un monto devengado de USD 15,79 millones, lo que representa una ejecución presupuestaria del 89,54%.

Durante el tercer trimestre de 2025, la entidad reportó 4 proyectos alineados al Objetivo 9, que cuenta con programación de metas físicas, las cuales registran un cumplimiento del 33,64%.

Tabla 60. Avance Físico de Proyectos de Inversión al Tercer Trimestre Secretaría Nacional de Gestión de Riesgos – Objetivo 9

Nombre del proyecto	Programación metas físicas (a)	Ejecución metas físicas (b)	Cumplimiento metas físicas c(b/a)	Codificado (MM USD) (d)	Devengado (MM USD) (e)	Ejecución presupuestaria 2025 f (d/e)	Devengado + anticipos /codificado con fuente (g)
Atención a la población afectada por emergencia en época lluviosa	100,00%	100,00%	● 100,00%	11,62	11,62	100,00%	100,00%
Fortalecimiento de capacidades de la población y de los actores del SNDGR para prevenir y reducir los riesgos de desastres y dar respuesta oportuna a las emergencias	45,84%	12,66%	● 27,62%	4,98	4,12	82,74%	82,74%
Fortalecimiento del conocimiento volcánico en el Ecuador para disminuir el Riesgo de desastre en la población	48,58%	2,41%	● 4,96%	0,37	0,027	7,62%	7,62%
Fortalecimiento del Sistema Nacional de Alerta Temprana ante múltiples amenazas	34,16%	0,67%	● 1,96%	0,67	0,018	2,71%	2,71%
							89,54%

Nota: ● Avance esperado $\geq 100\%$ y $\leq 95\%$ / ● Avance cercano al esperado $> 95\%$ y $\leq 85\%$ / ● Avance menor al esperado $< 85\%$ / ● Proyecto sin programación de metas.

Fuente: SIPeIP – Presidencia de la República. e-SIGEF - MEF- Ejecución Presupuestaria. Corte 30 de septiembre de 2025.

Elaboración: Dirección de Seguimiento a la Inversión – Presidencia de la República.

Principales Logros

Fortalecimiento del conocimiento volcánico en el Ecuador para disminuir el Riesgo de desastre en la población

La entidad informó que, durante el tercer trimestre de 2025, se ejecutó el servicio de impresión de material educacional en español, braille, kichwa y otras lenguas nativas, con el fin de difundir la gestión inclusiva del riesgo de desastres.

Adicionalmente, durante el trimestre de análisis, la entidad continúa llevando a cabo sensibilizaciones y capacitaciones de manera virtual a las poblaciones objetivo.

Atención a la población afectada por emergencia en época lluviosa

En el 3er trimestre el proyecto finalizó, con un cumplimiento del 100%. Los bienes adquiridos para la atención a la emergencia se encuentran entregados.

8. Conclusiones

8.1. Gasto Permanente

- Conforme la composición del PGE (Sin Tesoro Nacional), se evidencia que al tercer trimestre 2025, el Gasto Permanente registró un monto codificado de USD 19.298,43 millones y un monto devengado de USD 10.544,44 millones, que representa un porcentaje de ejecución del 54,69%, de avance presupuestario.
- De las 162 entidades que forman parte del Presupuesto General del Estado, 131 entidades cuentan con la alineación de sus planes institucionales hacia los objetivos del PND 2025-2029, al mes de septiembre 2025, evidenciando que 63 entidades se alinearon al Eje Social, el cual presenta el mayor monto codificado (USD 15.902,14 millones); así como, monto devengado (USD 8.417,22 millones). En este Eje el objetivo 1 cuenta con un mayor monto codificado (USD 6.640,08 millones) seguido del objetivo 2 con un monto de (USD 5.588,38 millones) y el objetivo 3 con un monto de (USD 3.673,68 millones).
- Para el seguimiento de avance físico, se consideraron las entidades que, al tercer trimestre de 2025, presentaron el estado “Registrado” de su Plan Institucional, alineación al PND 2025-2029 y realizaron la programación de metas para el periodo fiscal 2025, con periodicidad mensual y trimestral. En total, se consolidó la información de 50 entidades de las 162 que forman parte del Presupuesto General del Estado.
- En cuanto a los indicadores analizados de las 50 entidades sujetas al proceso de seguimiento, se evidencia que el 81,37% presenta un “*avance esperado*”, el 5,70% “*avance cercano a lo esperado*”, y el 12,93% “*avance menor a lo esperado*”.
- El Eje Ambiente, Agua, Energía y Conectividad (16) y el Eje Social (15), son los más representativos en número de entidades, con un total de 64 y 72 indicadores respectivamente, seguido del Eje Económico, Productivo y Empleo, que contempla 14 entidades con un total de 83 indicadores.

8.2. Gasto No Permanente

- El Plan Anual de Inversiones con corte al 30 de septiembre de 2025, consta de 492 estudios, programas y proyectos de inversión, de los cuales 482 proyectos se encuentran en el módulo de seguimiento del SIPeIP porque tuvieron asignación presupuestaria en este año; mientras que 10 proyectos no contaron con monto codificado hasta el 30 de septiembre de 2025 y, por tanto, no son sujetos de seguimiento. Dentro de los 482 proyectos, se contempla el presupuesto de 77 entidades que forman parte del Plan Anual de Inversiones y del Presupuesto General del Estado.
- Conforme la composición del Presupuesto General del Estado (sin tesoro nacional), se evidencia que, al tercer trimestre 2025, el Gasto No Permanente registró un monto codificado de USD 8.373,27 millones y un devengado de USD 5.106,31 millones, lo que representa una ejecución presupuestaria del 60,98%. Cabe indicar que, el monto contempla el “Programa de preservación de capital periodo 2025”, cuya entidad responsable es el Ministerio de Economía y Finanzas, siendo su presupuesto codificado y devengado, al 30 de septiembre de 2025, de USD 6.140,09 millones y USD 4.206,75 millones, respectivamente.
- Sin considerar el “Programa de preservación de capital periodo 2025”, el monto del Plan Anual de Inversiones al tercer trimestre 2025, fue de USD 2.233,18 millones y un monto devengado de USD 899,56 millones, lo que representa una ejecución del 40,28% de los recursos asignados. Esta cifra refleja una baja ejecución presupuestaria dado que el año fiscal está próximo a finalizar en tres meses, lo que podría afectar la viabilidad de alcanzar las metas anuales planteadas.
- Por otra parte, con la finalidad de evidenciar la gestión realizada por las entidades responsables de los estudios, programas y proyectos de inversión, considerando que el monto devengado más anticipos entregados en el periodo, es de USD 977,23 millones, en relación al monto codificado con fuente de financiamiento es de USD 2.175,54 millones, se identifica que representa un porcentaje de ejecución del 44,92% (sin considerar el Programa de preservación de capital periodo 2025).
- El avance físico promedio de los proyectos de inversión que integran el PAI 2025 es del 38,71%, en relación con el 100% de las metas físicas programadas para el año 2025.
- De los estudios, programas y proyectos que conforman el PAI 2025, se evidencia a nivel de avance físico que el 34,03% reporta un **avance esperado de sus metas físicas ejecutadas respecto a las metas programadas**, es decir entre el 95,00% y el 100,00% según su programación al tercer trimestre 2025; seguido por el 2,52% de los proyectos con un avance cercano al esperado de metas físicas; un 32,98% de los proyectos con un avance menor al esperado; y, el 30,46% de los proyectos restantes no registran programación de metas físicas al tercer trimestre.

9. Anexos

Anexo 1: Bases de datos de reporte de seguimiento a la planificación institucional de los sistemas GPR, SIPeIP y E-sigef.

Anexo 2: Base de datos de reporte de seguimiento del tercer trimestre de estudios, programas y proyectos de inversión.

Firmas

Fecha del informe: 12 de noviembre de 2025.

ACCIÓN	NOMBRE / CARGO	FIRMA
Elaborado por:	Jessica Cifuentes Proaño Especialista de Seguimiento a la Planificación y Política Pública	
Elaborado por:	Darwin Céspedes Marcial Analista de Seguimiento a la Planificación y Política Pública	
Elaborado por:	Franklin Chiguano Guaynilla Analista de Seguimiento a la Planificación y Política Pública	
Elaborado por:	Diego Endara Auz Especialista de Seguimiento a la Inversión	
Revisado por:	Joselyn Corrales Vallejo Directora de Seguimiento a la Planificación y Política Pública	
Revisado por:	Eduardo Culquicondor Maza Director de Seguimiento a la Inversión	
Aprobado por:	Joselyn Corrales Vallejo Subsecretaria de Seguimiento, Encargada	
